

工程处罚单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-GCCFD-027

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于现场 12 月份及年前安全文明施工检查事宜

内容：

经业主、监理项目部 2019 年 12 月 31 日现场检查发现由你单位负责施工的“华能共和 5 万千瓦风电项目”升压站施工存在以下问题：

1、水泵房基坑未做安全防护围栏、门口杂物未及时清理；现场未悬挂安全标识及警示牌。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十二项：“施工中缺少必需的安全设施、信号、标志、用品、用具，考核 2000 元/次”。本次给予你单位 2000 元经济考核。

2、一次侧室内垃圾未清理，电缆沟未铺设盖板，带电设备侧板未安装。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第六条第十三项：“风电项目部或监理单位组织的关于安全、质量、进度专题活动及会议（如例会、考试、教育培训、宣传等）等，未按照相关要求安排相应人员配合或不按期落实相关要求的，考核 1000~5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

3、二次侧室内生明火、液化气罐旁未配置灭火器，带电设备防护门未安装。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十二项：“施工中缺少必需的安全设施、信号、标志、用品、用具，考核 2000 元/次”。本次给予你单位 4000 元双倍经济考核。

4、升压站场区内垃圾、木方、模板、余土等未清理；现场施工材料堆放区存在严重的火灾隐患。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第八条第十三项：“现场安全文明施工未做到“工完料尽场地清”的罚款 2000~5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

5、2019 年 12 月 30 日检查发现升压站施工现场 8 人未佩戴安全帽；2019 年 12 月 31 日现场检查发现打井施工 2 人未佩戴安全帽。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第四项“进入施工现场未佩戴或不正确佩戴安全帽等劳动防护用品，未佩戴安全提示卡或佩戴不规范，考核 500

元/人·次”。本次给予你单位 10000 元双倍经济考核。

6、施工人员住宿区用电不规范，电线敷设未穿管保护，插板未固定，电热毯电源未断电，未做到人走断电，卫生杂乱较差，宿舍内多余电线未拆除，且个别插座线未穿管，存在安全隐患。根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第八条第十六项“施工区及生活区用电用水不规范、卫生脏乱差等管理不规范，罚款 1000~5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

7、搅拌机旁水池未做防护围栏，汽油桶与木方等材料集中放置，存在严重的安全隐患，且未配置消防器材。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十二项：“施工中缺少必需的安全设施、信号、标志、用品、用具，考核 2000 元/次”。本次给予你单位 2000 元经济考核。

8、未经建设单位许可，私自使用 20m 的 4×4^2 电缆用于卷扬机电源。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第六条第十三项：“风电项目部或监理单位组织的关于安全、质量、进度专题活动及会议（如例会、考试、教育培训、宣传等）等，未按照相关要求安排相应人员配合或不按期落实相关要求的，考核 1000~5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

9、下发的关于华能安监部检查整改通报通知单，施工单位未限期整改回复。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十项：“不按监理或甲方下发的安全通报（或安全隐患整改通知单）限期整改或拒不整改的，考核 5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

10、青 H62689 吊车年检合格证、吊车司机、起重工资质未报审问题，未限期整改完成。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十项：“不按监理或甲方下发的安全通报（或安全隐患整改通知单）限期整改或拒不整改的，考核 5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

11、施工单位安全费用投入情况未按月向监理、业主上报；其安全管理人员资格证件模糊不清，通报中要求重新提供，仍未提供。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十项：“不按监理或甲方下发的安全通报（或安全隐患整改通知单）限期整改或拒不整改的，考核 5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

12、施工单位未提供应急器材、物资台账。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共

和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定(试行)》第二章第五条第十项:“不按监理或甲方下发的安全通报(或安全隐患整改通知单)限期整改或拒不整改的,考核 5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

13、升压站临时用电问题未整改完成,且未设计二级盘用于临时用电。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核:《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定(试行)》第二章第五条第十项:“不按监理或甲方下发的安全通报(或安全隐患整改通知单)限期整改或拒不整改的,考核 5000 元/次”。本次给予你单位 5000 元经济考核。

现经研究决定给予你单位 63000 元(陆万叁仟元整) 经济考核,以示警告。现针对以上问题要求你单位 3 日内整改完成并回复,若不整改回复或再次发生此类问题将双倍考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2019 年 12 月 31 日

业主项目部意见:

同 刘士发

业主项目部(章)

项目负责人: 张永成

日期: 2019 年 12 月 31 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。


附图:



水泵房基坑未做安全防护围栏



一次侧室带电设备侧板未安装

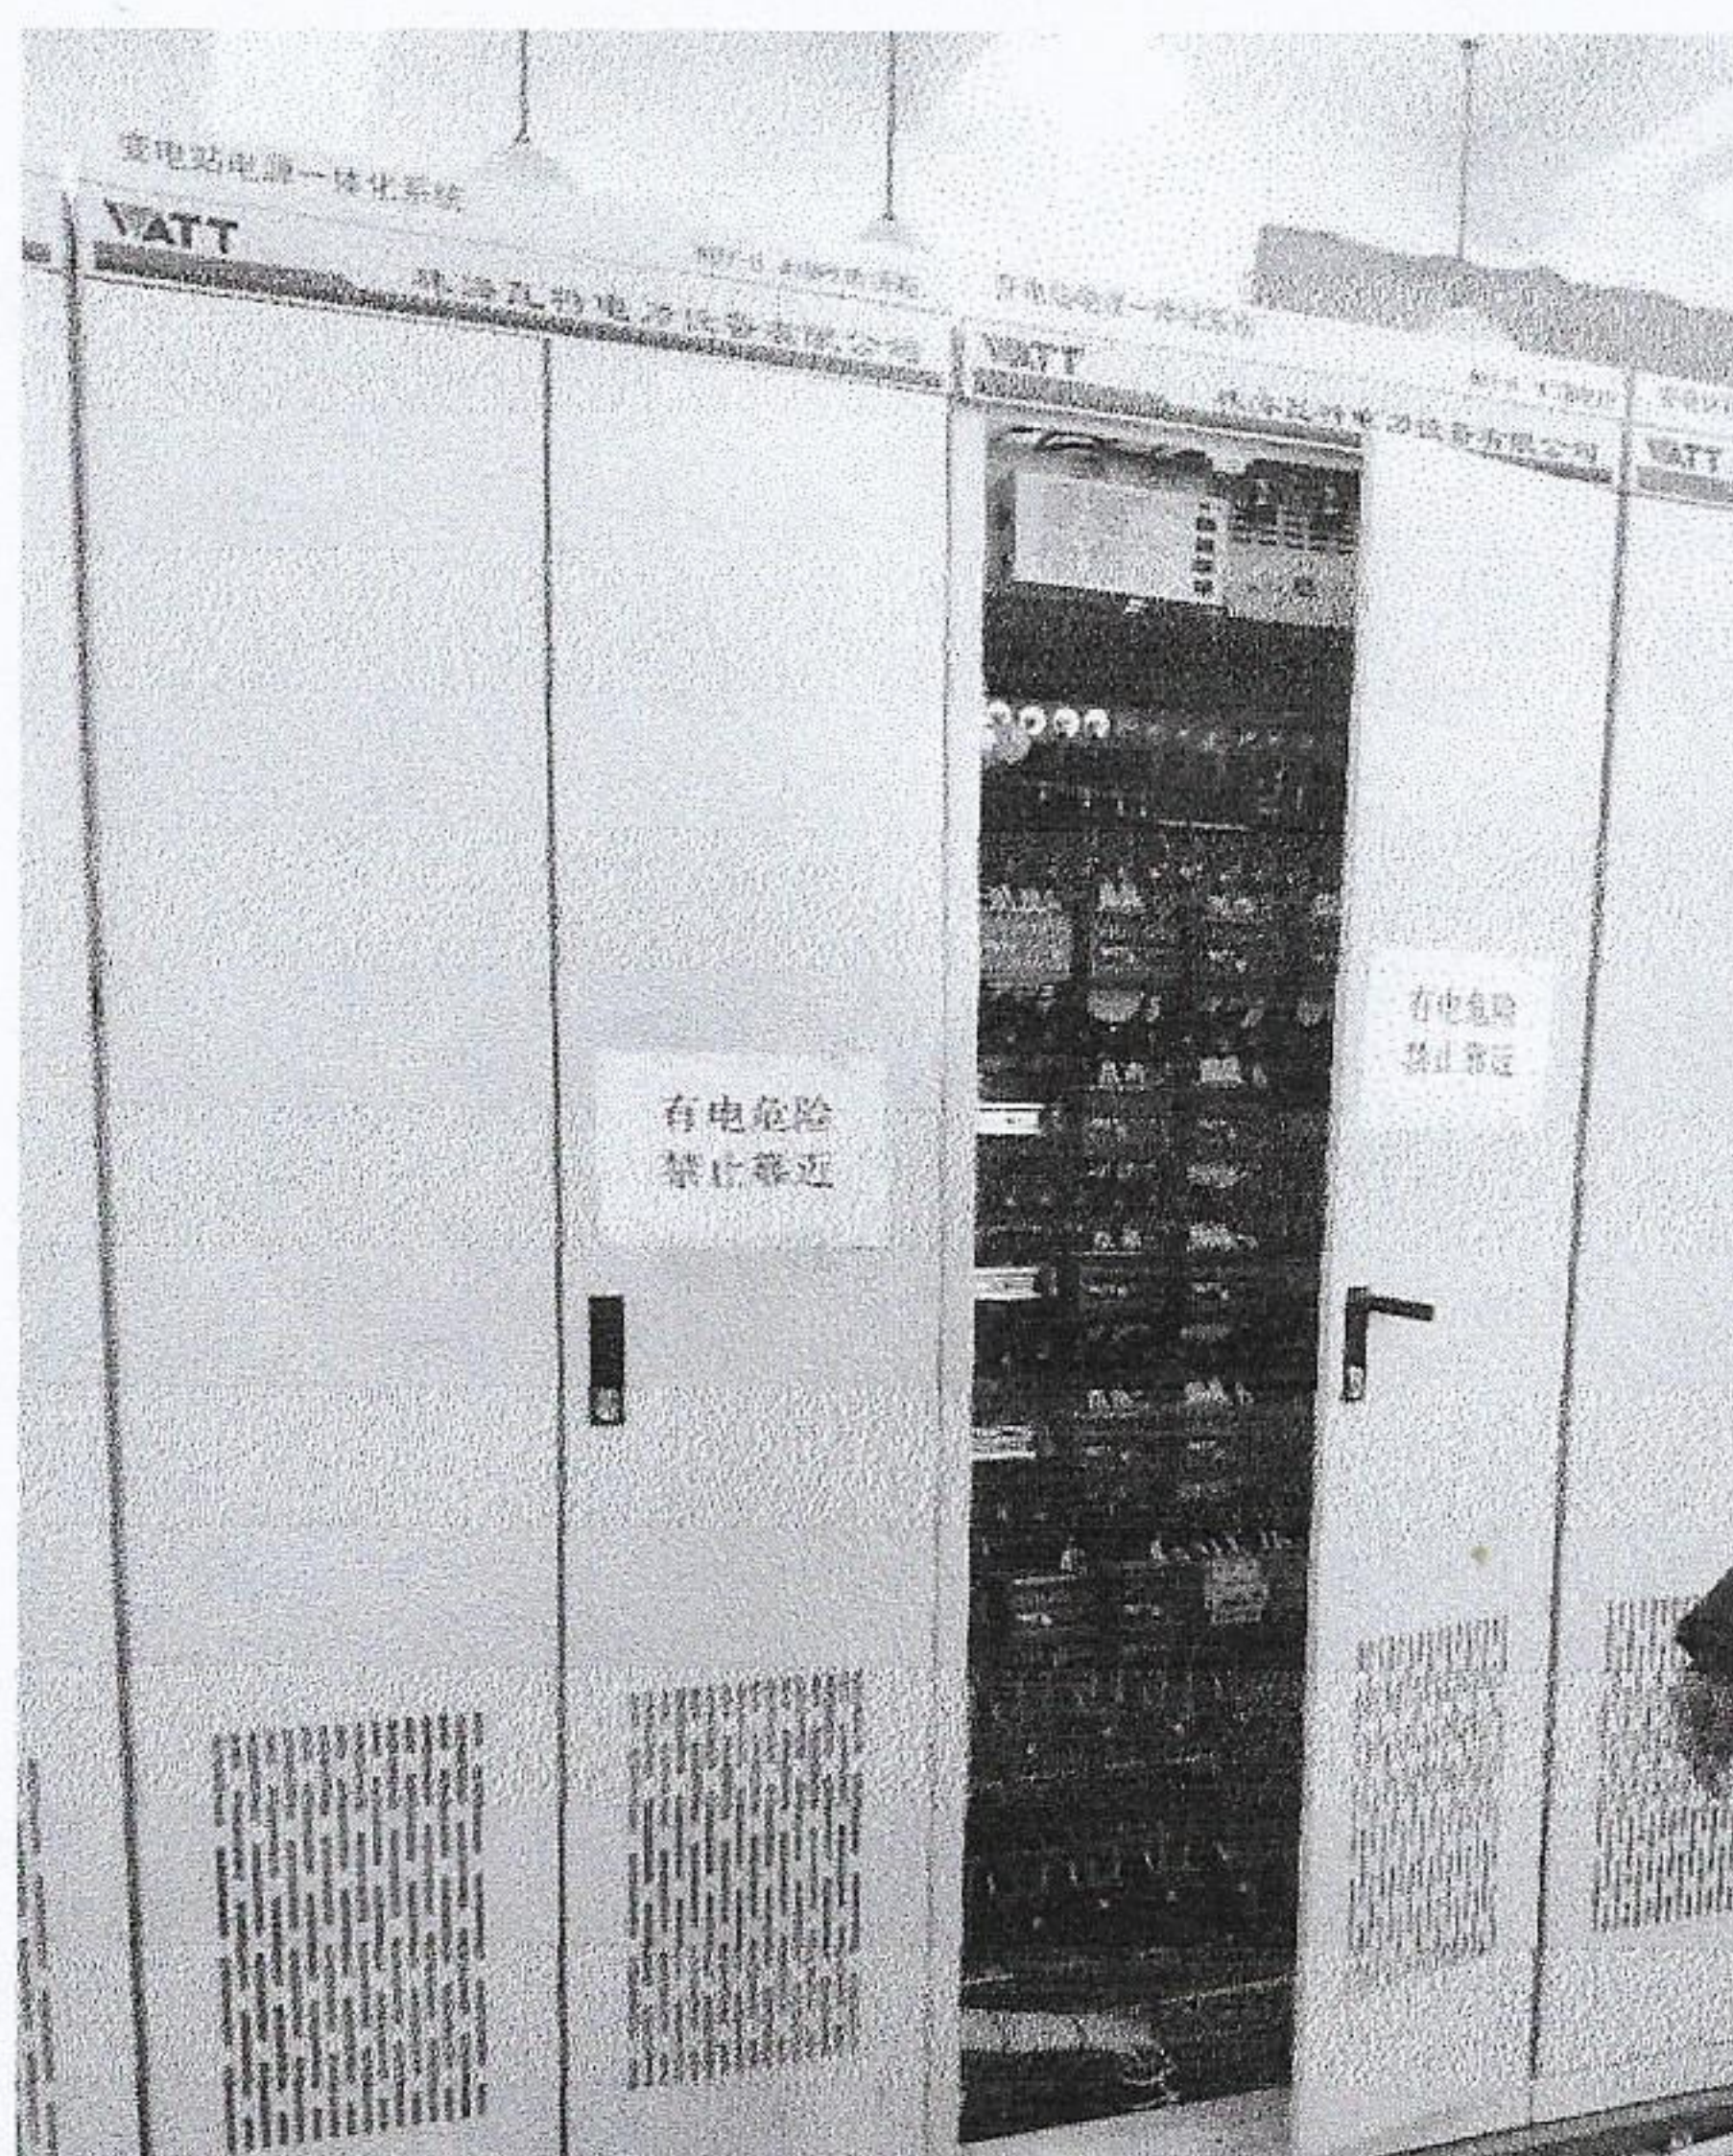

二次侧室内带电设备防护门未安装



施工人员住宿区用电不规范，电热毯电源未断电
