

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

编号: WLHT-LXD-009

致: 北京宸华建筑工程有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

主题: 关于现场组件安装施工事宜

内容:

此前我监理部已多次要求组件安装时必须注意组件保护, 按照要求搬运、安装组件, 防止组件出现隐裂及破损。现我部现场巡视发现组件安装时施工人员在地上拖拽组件, 极易造成组件隐裂。要求各单位加强现场管理, 按照要求搬运组件, 严禁在地上拖拽。如再次发现此类现象, 将对各单位进行经济考核。


场直流电缆、485 通信电缆开挖电缆沟的深度必须按照图纸要求达到 800mm 深, 电缆穿越农田或在车行道下敷设深度不小于 1m。如开挖过程中存在开挖困难, 请及时与项目部联系, 协调解决。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

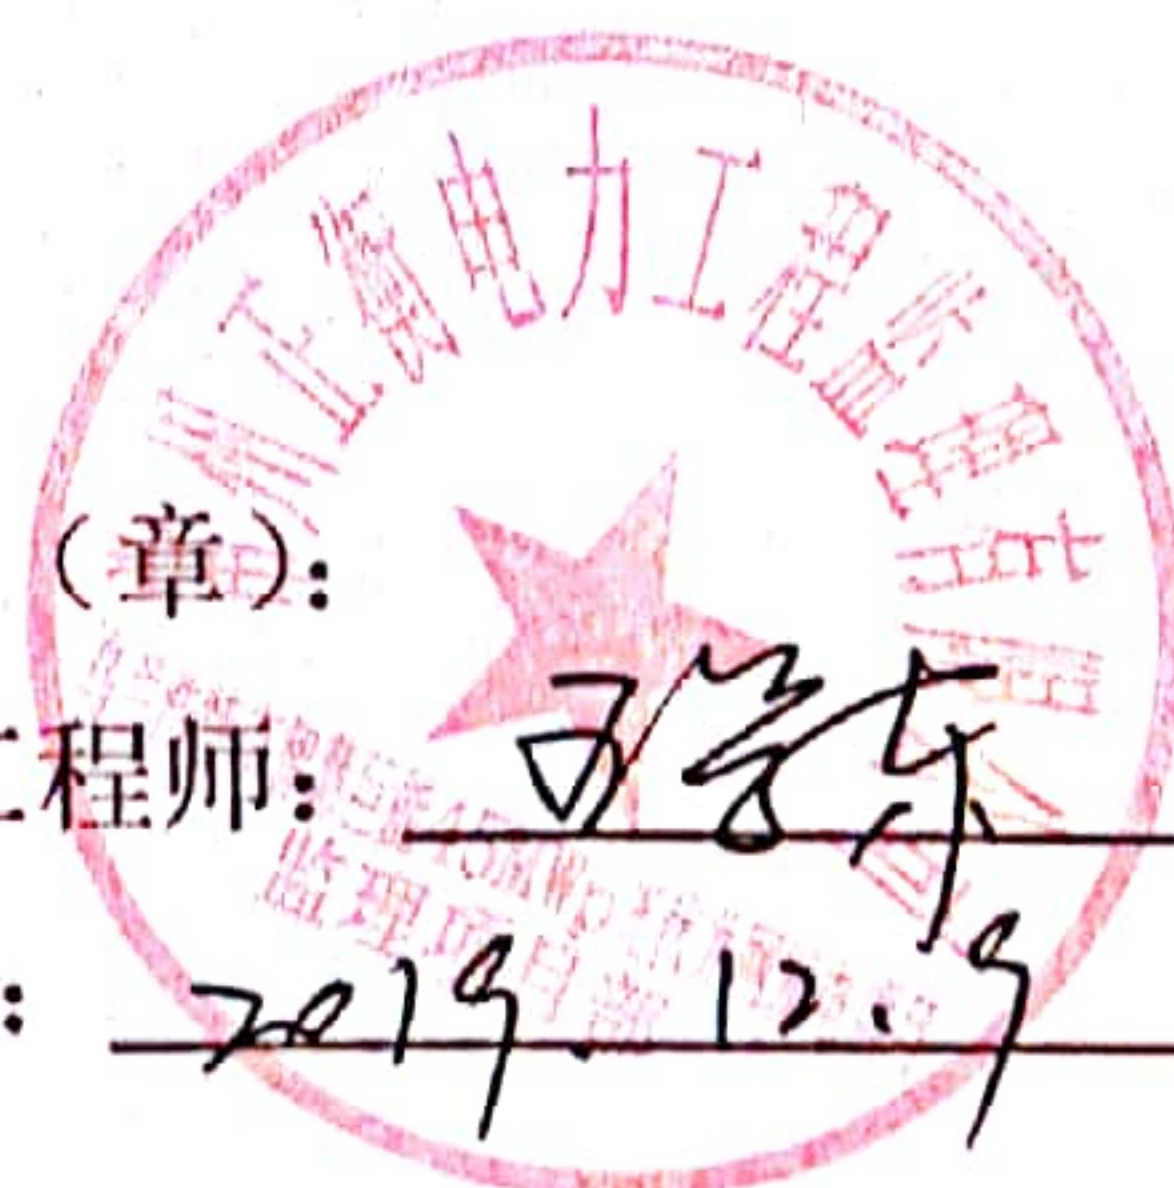

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。
