

监理工作联系单

工程名称:通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: TWGA-ZHJL-LXD-004


致: 安徽元正新能源电力有限公司

抄送: 公安县通威渔光科技有限公司

事由: 关于调整光伏区育苗池桩基施工方案的事宜:

内容: 光伏区育苗池经过 2 次试桩, 由于地质坚硬等原因, 试桩后, 9 米桩顶均离水面 5 米以上 (打入地下 3 米 (含淤泥)、水深 1 米) 不能满足图纸设计要求; 经各部门商定: 再时调整施工方案, 光伏区 1 单元、2 单元改用引孔打桩方案。

为了项目整体施工进度, 暂时调整施工方案, 不能因为打桩受阻而导致施工停滞。望施工单位尽快展开打桩施工进度。

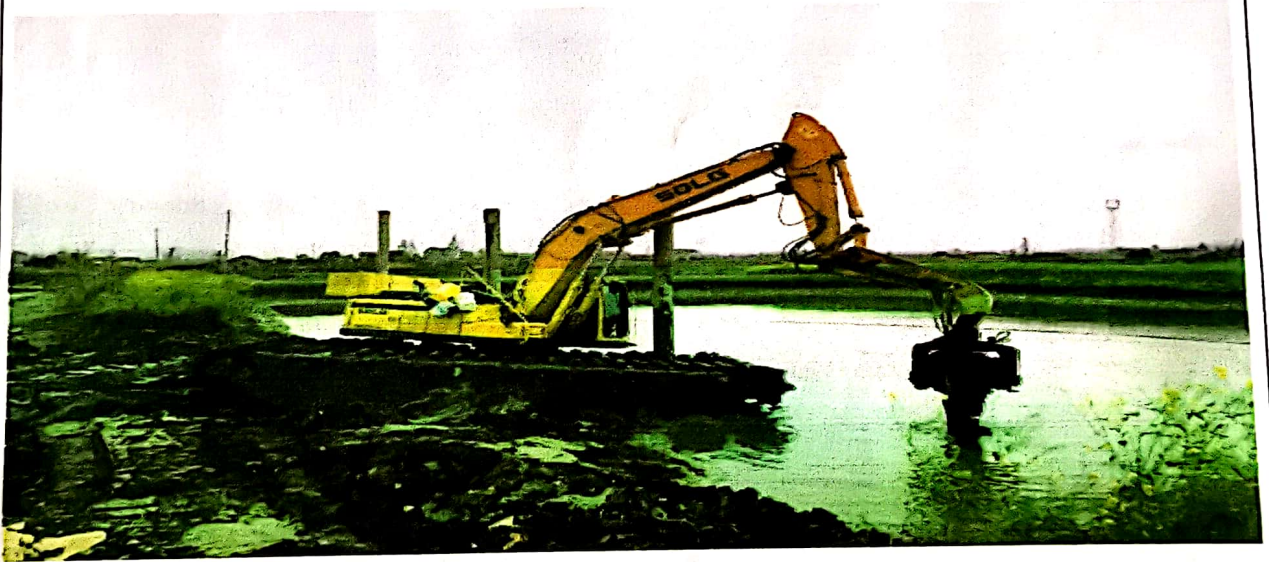

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 刘士友

日

期: 2020年3月31日



本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送 EPC 单位, 抄送建设单位



扫描全能王 创建
