

工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-023

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于 20#风机基础及场内道路事宜



内容：


- 1、2022 年 6 月 15 日在对 20#风机基础浇筑过程中突遇持续性降雨，致使场内检修道路湿滑，混凝土罐车无法行走。现场停止了混凝土浇筑，并在混凝土表面进行了插筋处理。根据上述情况，请总包联系设计单位或不低于原设计单位资质的第三方出具处理方案，并按处理方案实施。（后附图片）
- 2、按照场内道路设计总说明第 5 条要求，道路挖方段路基为岩基的，采用开挖后的天然地基；挖方段路基为土基的及填方段路基采用开挖料填筑路基，填筑 30CM 厚混铺块碎石基层，路面采用 20CM 厚级配碎石，在路面全宽范围内铺设。现要求你方按图纸要求进行场内道路施工，需铺碎石段尽快铺碎石，尽可能保障大雨后场内道路不影响设备运输和施工车辆行驶。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2022 年 6 月 16 日

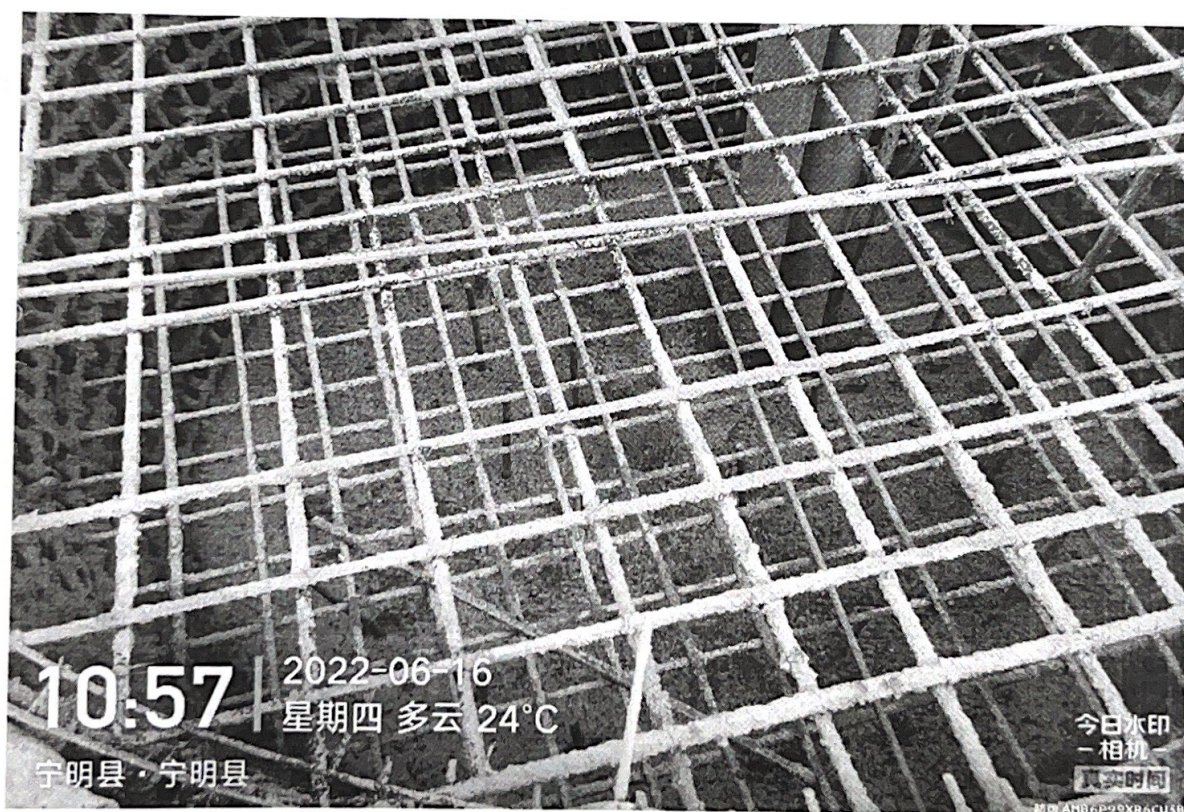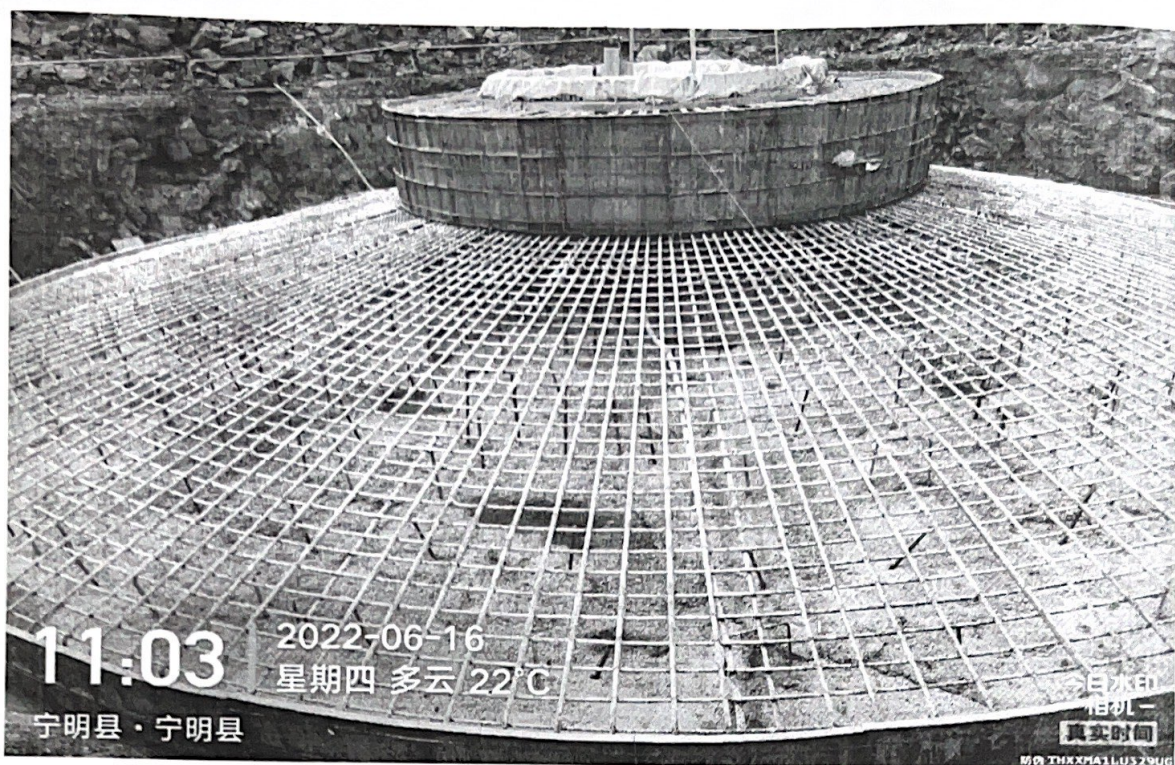

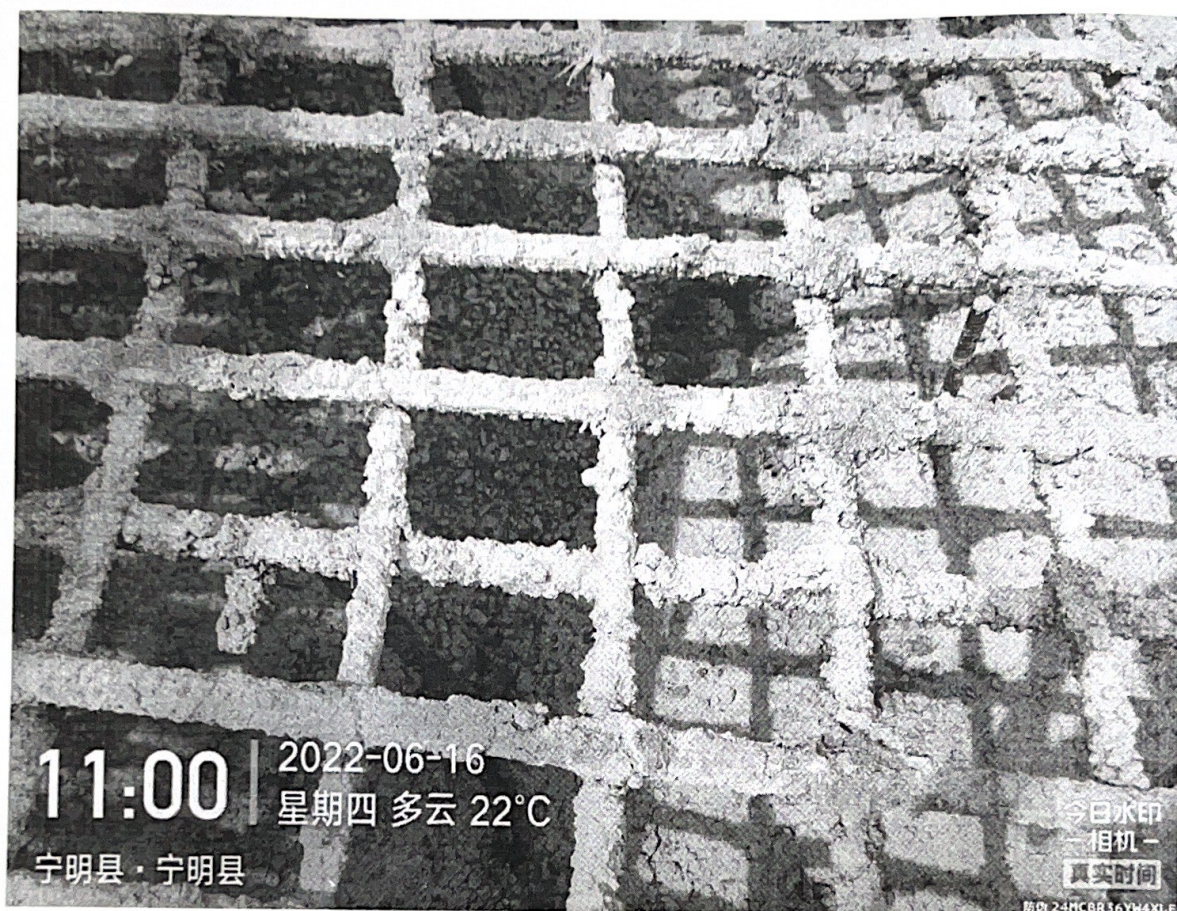

11:00

2022-06-16

星期四 多云 22°C

宁明县·宁明县

今日水印
相机
真实时间

防伪 24MC8R36YW4XLE
