

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-002

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）：


事由：关于组件到场卸货事项

内容：


近日因组件陆续到场，组件的卸货及堆放你方未能按要求进行，现场存在诸多问题，现将组件的卸货及堆放做如下要求，望你方能逐一严格落实到位。

一、吊车卸货：

- 1). 吊车卸货时要注意检查吊具的选择，现场应选用扁平吊带，两条吊带长度应一致，吊带的磨损情况较好。
- 2). 吊车卸货时以一至两箱为宜，避免多箱组件起吊时对组件的挤压，卸货时应稳吊轻放，整个过程避免与其他组件箱体发生碰撞。
- 3). 吊起时注意吊带的受力是否均匀，组件箱是否倾斜，当组件倾斜角度大时应停止起吊，等调整到合适时方可起吊。
- 4). 吊车在刮风，下雨，下雪等情况下禁止卸货。吊车在晚上禁止卸货。
- 5). 卸货时，禁止人员出现在组件或吊机下方。

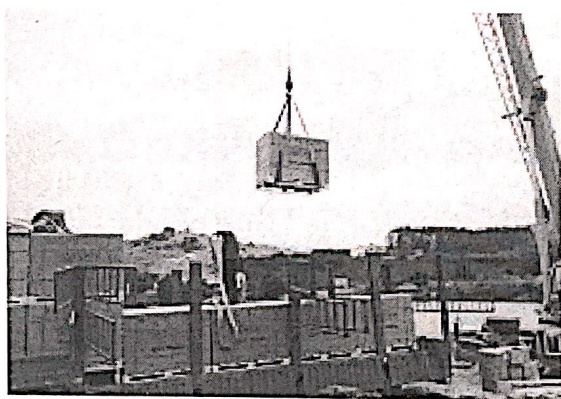

建议吊车单箱卸货

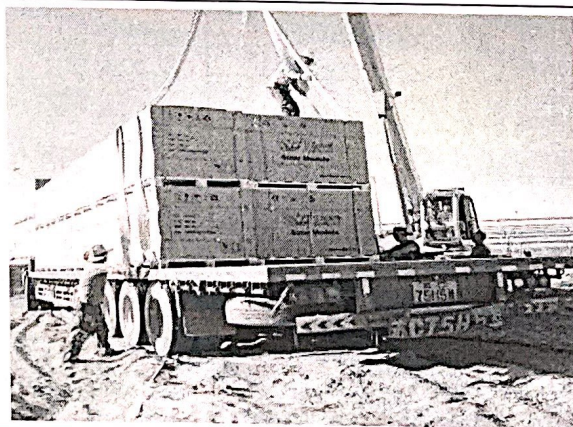

组件卸货不得超过两箱

二、叉车卸货：

- 1). 叉车卸货时建议单箱卸货。

2). 叉车卸货时，避免插齿对组件的碰撞，叉车的叉齿应平行卸下货物。

3). 在叉车叉齿的 L 型处关注 I 型处的长度，I 型处必须高出组件箱的高度，并在上面垫上减震的长条，长条的长度必须高出箱体的高度。

4). 卸货前必须剪断上下托之间的扎带，避免卸货时下托组件拉断扎带，对组件造成伤害。

5). 禁止晚上卸货。



叉车单箱卸货



未经改装卸货用的叉车

卸货注意事项：

1). 卸货场地需要平整，无石块等杂物影响组件的堆放。

2). 卸货卸货人员必须佩戴安全帽，做好安全措施，与卸货无关人员远离卸货现场。

3). 前请核对整车组件数量是否与该车发货单一致，若有出入请及时通知业主和厂家现场确认。

4). 卸货前必须查看整车货物箱体情况，若有箱体破损及时通知业主和厂家，签字拍照留档记录箱号，确认后继续卸货。

5). 在篷布解开后观察箱体是否有破损，如有破损现场拍下箱体破损处、托盘号和发货单。

三、组件存放：

1). 组件在卸货完毕后需覆盖上雨布，雨布要求组件上面及侧面进行全覆盖，底部雨布做好防风措施，防止受潮后箱体变形。

2). 建议组件有单独的储存区域并安置围栏，无关人员或牛、羊等牲畜进入，

对组件造成损坏，严禁未经许可的人接近组件储存区域。

3) . 组件不得集中堆放，以每五托为一排，五排为一个堆放区域，每个区域间需设安全通道，通道间距宜 70-80cm，每个区域需单独设材料标识牌。

4). 组件储存区域必须配备消防器材，防止火灾。

5). 组件储存区域必须有专人看管，看管人员必须有消防安全意识，有排除隐患能力。

6). 请把组件存储在阴凉干燥的地方

以上要求请于 7 月 1 日整改落实完毕并通知我方监理到场验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  汪立波

日

期： 2021.6.30

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
