

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单


编号: HRGF-JLT-050

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于升压站施工质量的相关事宜:

1. 检测楼细石混凝土散水基础宽度、垫层砂浆厚度、面层细石混凝土厚度均不符合图纸要求, 要求垫层宽度 700mm, 厚度 150mm, 面层宽度 600mm, 厚度 150mm。

请施工单位严格按照图纸施工。

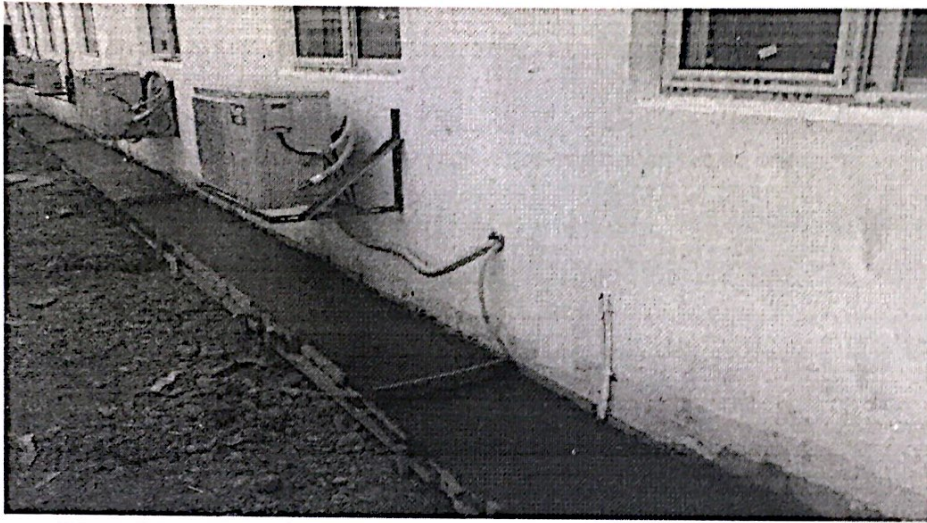

以上问题要求 2017 年 8 月 27 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.08.25



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

