

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-022

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 关于光伏区施工存在的问题

内容: 1. 光伏区临时码头处某段电缆桥架走向与设计不符;
2. 光伏区组件倒运时, 用铲车起吊, 组件震荡、受力不均易对组件造成损伤;
3. 组件安装时, 单人背运组件, 易对组件造成隐裂。要求双人抬运, 安装时小心谨慎, 切勿使组件强力撞击支架和其他组件。

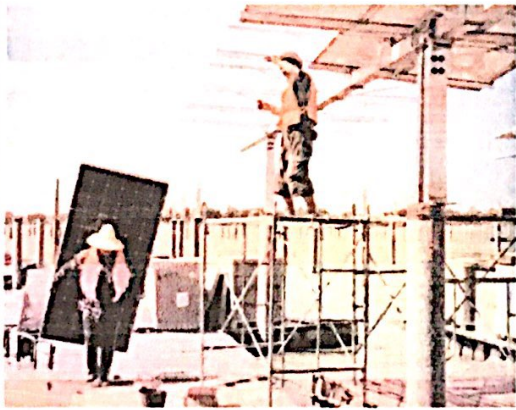

以上问题要求在 2018 年 06 月 27 日前以书面形式回复整改完成情况, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师: 肖家明

日期: 2018-06-26

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建
