

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-024

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 关于升压站给排水系统施工的质量问题

内容: 升压站给排水螺纹管道根据图纸设计要求, 管道下方必须铺设 200mm 中粗砂垫层, 监理现场发现未按照设计要求施工, 已多次口头提出未见整改。现要求贵部严格按照设计施工, 整改完成监理验收后方可回填。

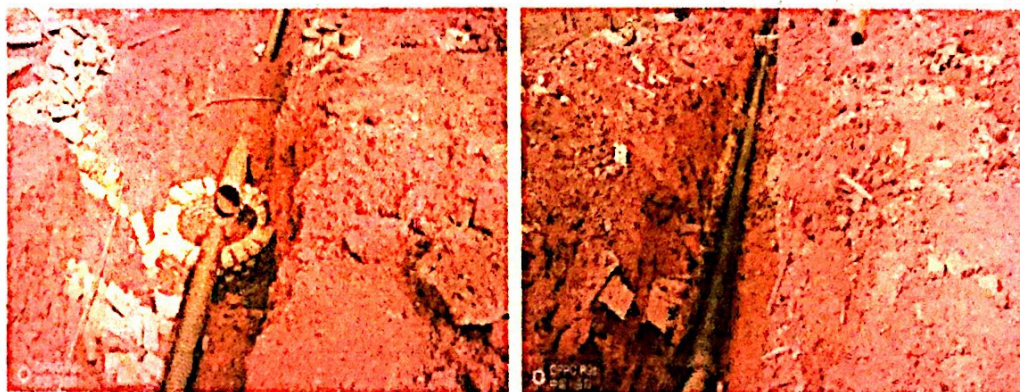

以上问题要求在 2018 年 07 月 06 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018-07-05



填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建
