

监 理 通 知 单

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: HSQD-JLTZ-20180701



致: 西门子电力自动化有限公司


事由

内容

对以下问题在 7 月 5 日 18 时前整改完成。

1. A 区平屋顶南侧组件表面仍有一根厂方的线缆, 影响组件正常发电, 必须进行调整。
2. 电缆桥架连接片螺丝生锈较多, 请针对生锈螺丝进行更换并做好相应防锈措施。
3. 部分组件组串过程使用 4 平方线经过底梁连接, 对于这部分 4 平方线请做好相应保护措施。

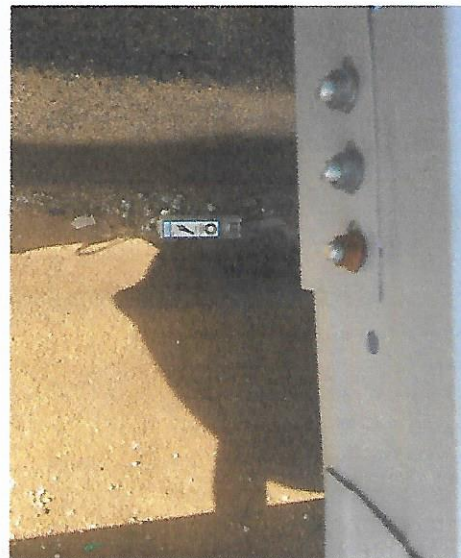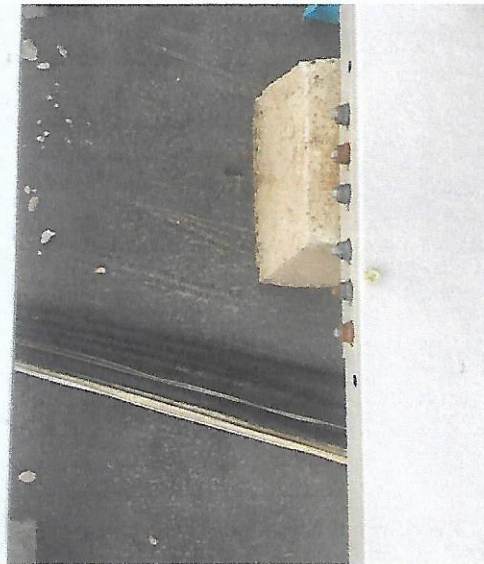

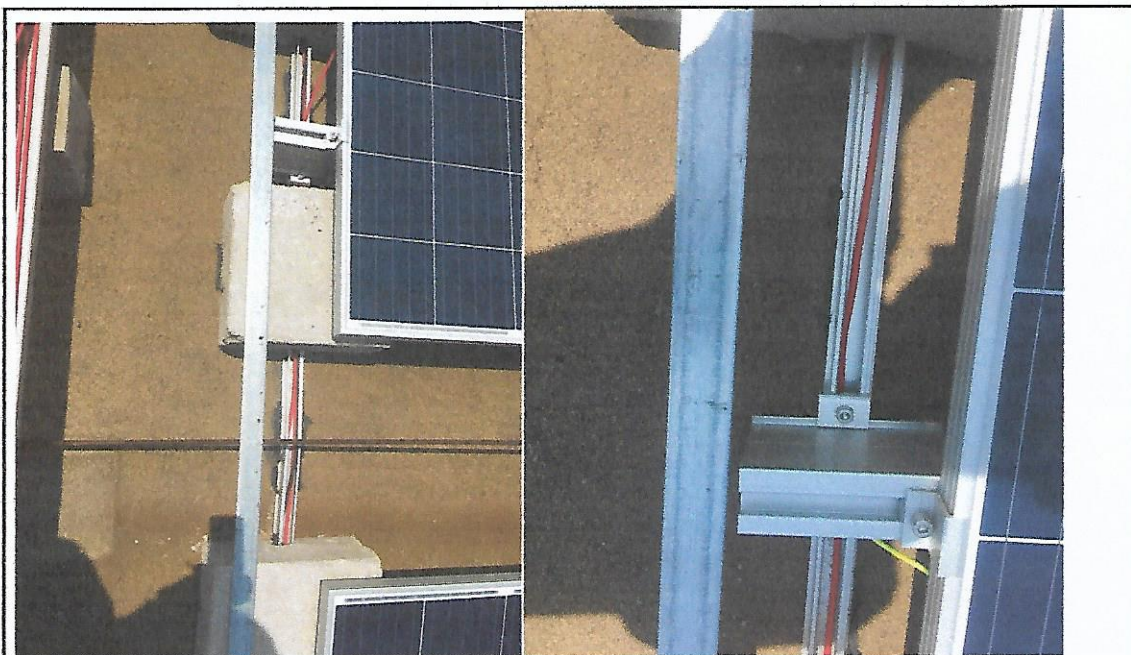

监理项目部 (章) 4867
 总/专业监理工程师: 2018
 日期: 2018 年 07 月 01 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。
