

监 理 通 知 单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW）编号：GFDZJBM08-01

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）：

事由：关于 D 号楼面采光带安全防护以及施工人员安全着装问题。

内容：经监理项目部 2018 年 10 月 29 日对（兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW）D 好安全楼面检查，发现存在以下质量问题：

- 1、D 号楼面采光带、楼面两端（女儿墙高度最低处仅为 30mm，低于有关规范）边缘
- 2、部分未按照浙江正泰新能源开发有限公司制定的《光伏电站施工标准图册》进行安全防护（附下图）。
- 3、D 号楼面施工人员安全着装不符合要求，存在安全帽未佩戴、反光背心未着装。
- 4、D 号楼面个别夹具、檩条螺栓紧固不到位，存在松动现象，且个别螺栓缺少平垫、弹簧垫（附现场照片）。

要求：

- 1、施工单位参照《光伏电站施工标准图册》进行安全防护。
- 2、施工单位负责人对楼面以及现场施工人员进行安全着装规范教育。
- 3、对 D 号楼面个别夹具、檩条螺栓紧固不到位，存在松动现象，且个别螺栓缺少平垫、弹簧垫问题应自检自查。

以上问题限期本周五下午五点前整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2018 年 10 月 29 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



由 扫描全能王 扫描创建




采光带未做安全防护




安全帽未佩戴以及反光背心未着装




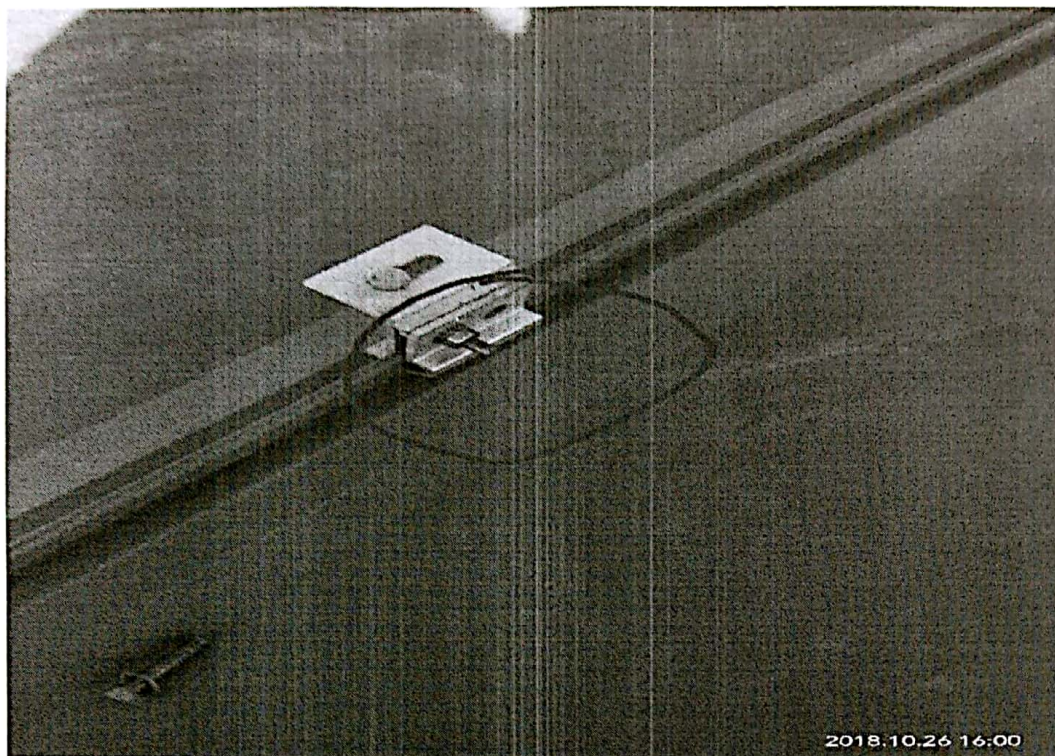


夹具缺少螺栓

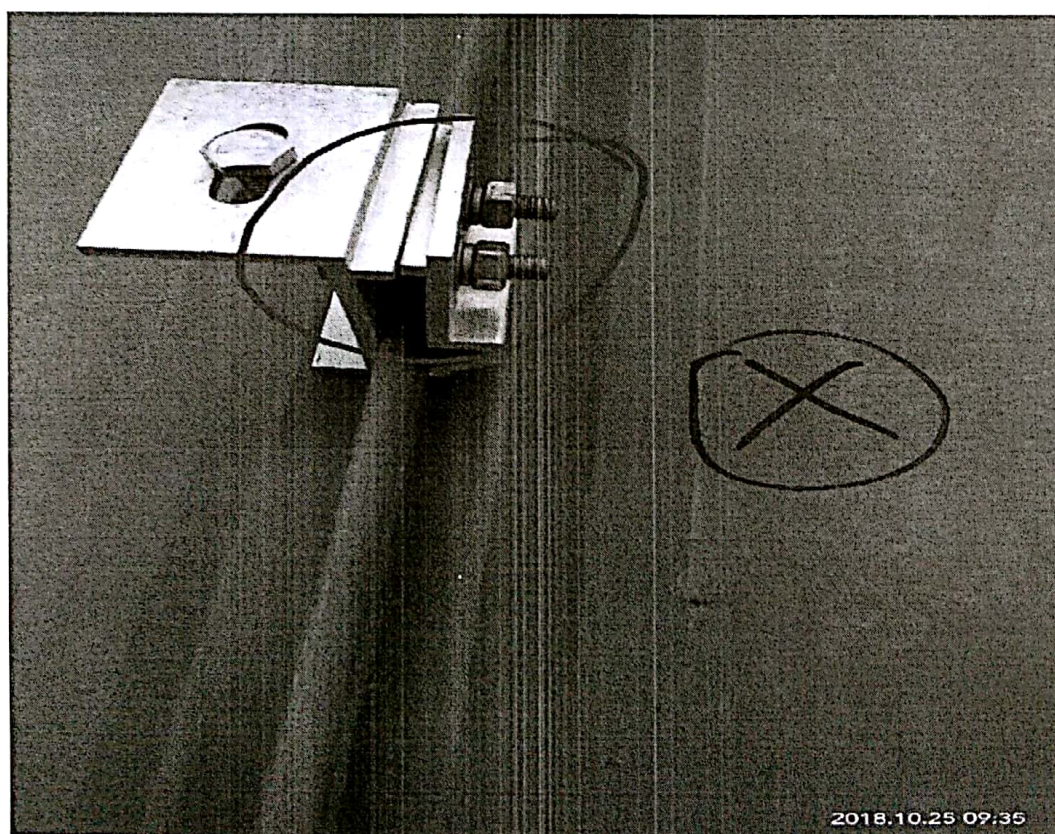

夹具安装不规范



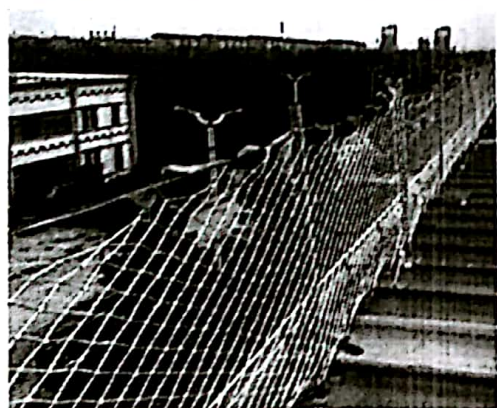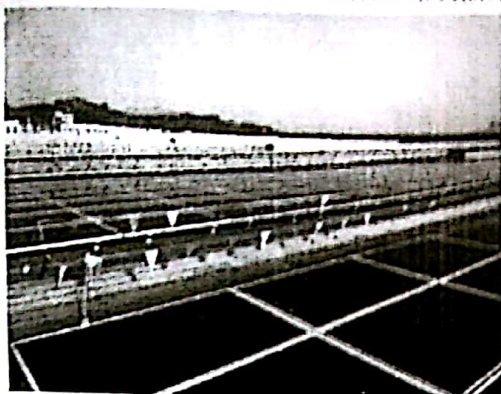

【要求】

- 1、屋面采光瓦处应设置警戒，避免人员误踩路造成坠落事故。
- 2、采光瓦屋面施工时应铺设临时施工通道。
- 3、道路施工，破路埋管，基坑开挖时应设置警示标识和围栏。
- 4、施工现场主要出入口，楼梯、爬梯，临边、坑洞，蒸汽管排放口、边坡、道路、配电室（箱）等处合理悬挂安全标识。

