

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-035

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏 T11 区高压带电区域安全措施、T2 区料场逆变器设备材料堆放、T13 区箱变摆放安全措施等事宜

内容：

目前光伏区已实现分区并网，经项目监理部对并网点和设备摆放点排查，发现以下问题：

1. T11、T1、T2 区域并网点（箱逆变）四周无安全护栏，无警示牌；（见图 1）
2. T11 区 35KV 线缆约 20m 裸露，没有保护措施，且 35KV 线缆旁堆放铁质支架；（见图 2）
3. T11、T1、T2 区域箱逆变铁质基础的接地网焊接后未做防腐处理；（见图 3）
4. T13 区箱变放置倾斜，且离水面太近，湿度较大对设备后期运行会带来不利因素（见图 4）；
5. T2 区料场堆放的逆变器倾斜且未做防雨水保护；（见图 5）

问题图片详见附件；

以上问题涉及人身、设备等安全，它将影响项目的安全目标，望你方尽快处理。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附件:




(图 1)




(图 2)



(图 2)

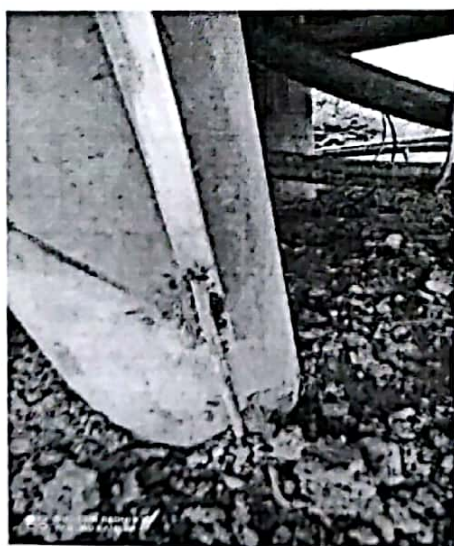


(图 3)

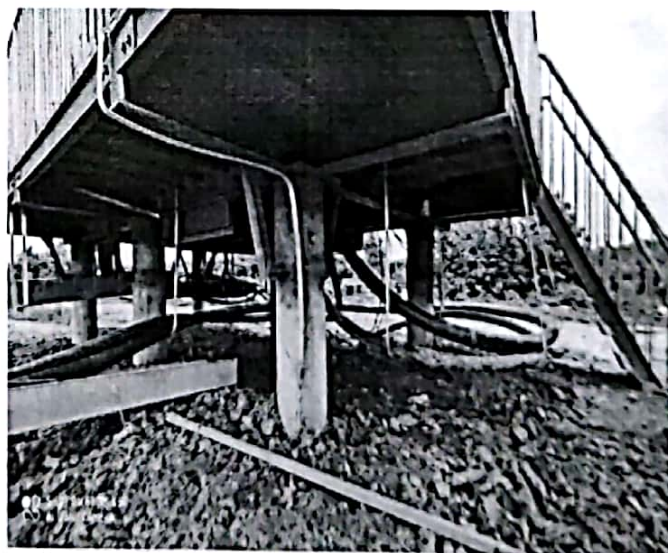

(图 3)



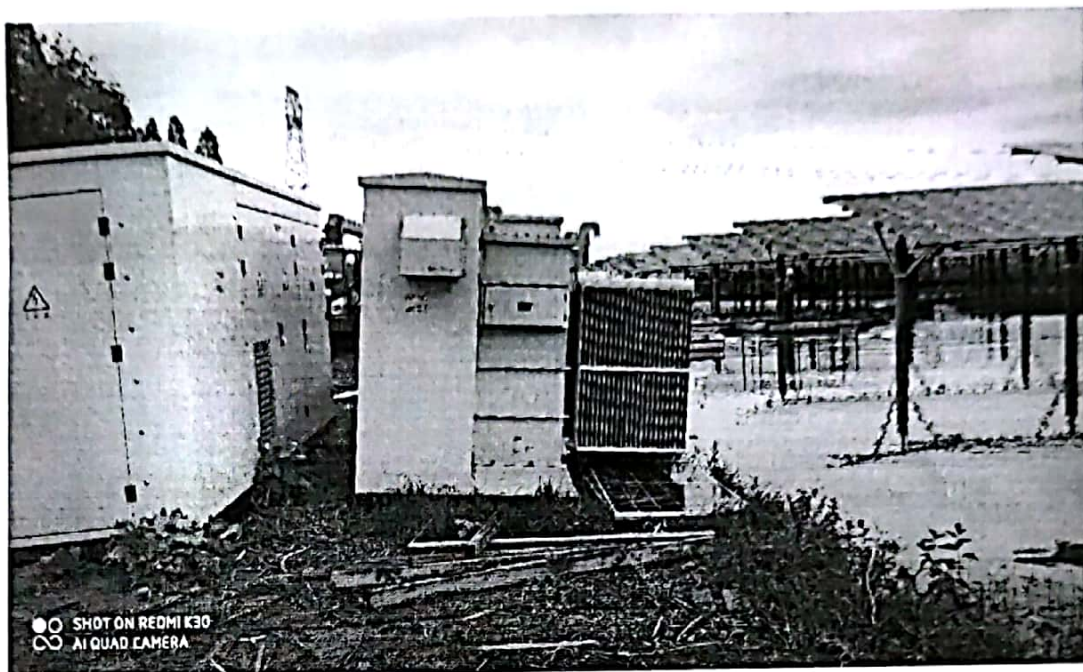

(图 4)



(图 5)

