

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-058

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟光伏区光伏专用电缆和普通电缆不可混用

内容: 4月24日上午, 监理人员在西沟地块现场安全检查发现, 现场设备使用光伏专用四平方线缆连接且配电箱未架空, 有进水风险。由于光伏专用线和普通电缆的材料、技术规格等方面存在明显的不同, 对设备都存有较大的安全隐患, 请及时更换为绝缘护套电缆。

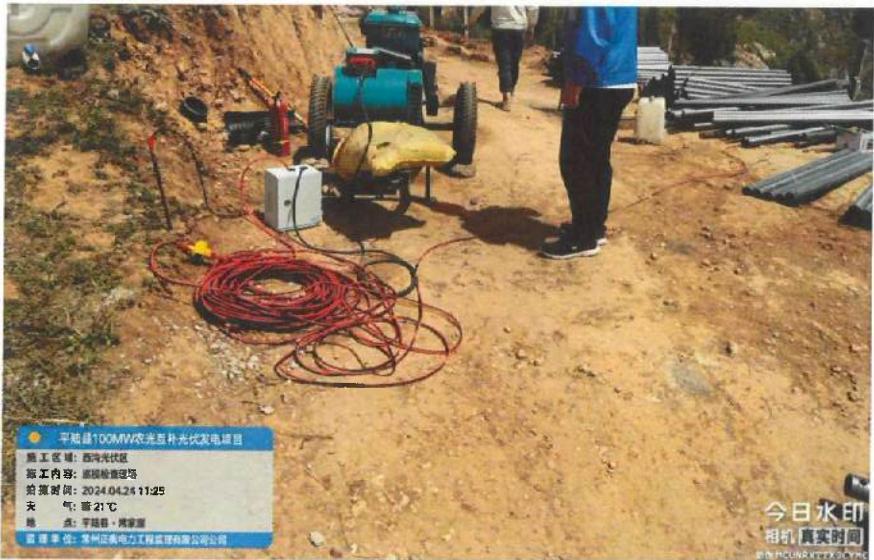

请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。
