

# 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

## 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-093

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟区域 5 号地块交流电缆敷设相关事宜

内容:

问题概述:

7 月 11 日上午, 监理单位及总包单位在西沟区域现场巡视时发现以下问题:

1、5 号箱变进线电缆绝缘层破损严重, 易发生漏电现象, 具有严重安全隐患。(后附图 1、图 2)

2、5 号地块部分交流电缆终端(逆变器侧)未做保护, 经过前几日的降雨, 电缆终端必然进水。进水会导致电缆绝缘性能下降, 影响其电气性能, 甚至可能引起短路、火灾等灾害, 具有严重安全隐患。(后附图 3、图 4)

现要求你方立即对绝缘层破损严重的电缆进行更换, 并以此为鉴, 对其他地块的电缆进行自检排查。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



图 1：电缆绝缘层破损严重



图 2：电缆绝缘层破损严重



图 3：电缆终端未做保护

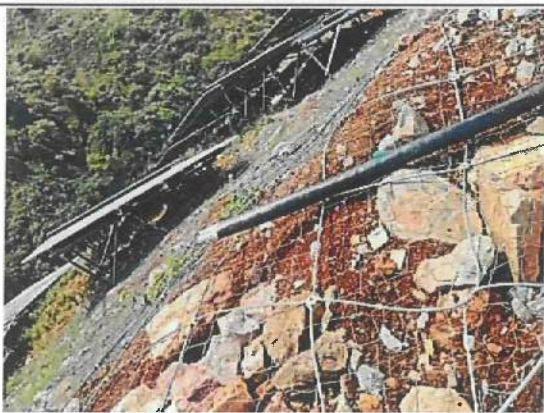


图 4：电缆终端未做保护
