

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-178

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池场区内 BZ1 号铁塔上塔高压电缆相关问题

问题概述:

2025 年 1 月 5 日监理单位对洪池 BZ1 号铁塔上塔高压电缆进行并网前验收发现以下问题:

- 1、冷缩分支套破损, 且内部填充胶不饱满。
- 2、电缆套管口处未做防火封堵。

请贵单位收到本通知后立即对洪池 BZ1 号铁塔上塔电缆地块进行自检复查, 确保在并网前完成以上问题整改, 不得影响并网。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日


期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



冷缩分支套破损，且内部填充胶不饱满

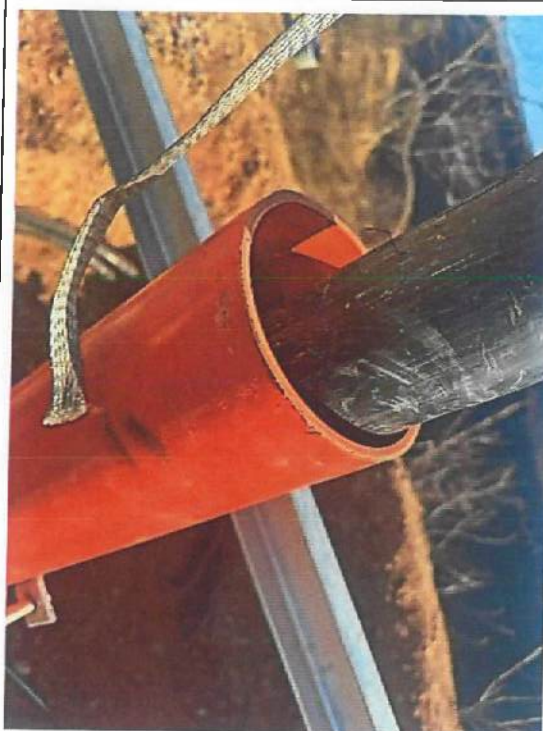

防火封堵未制作
