


会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH--TZHS-003

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、01、15、16:00
会议主持人	王金木	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目图纸事宜			
上次会议问题落实情况：本次为第 3 期图纸会审专题会议。			
本次会议内容： 刘晓峰：1、根据现场查的资料原先 1#方阵按 6 小时/日，计算出来间距为 20.5m，如今因为组件遮挡问题，就变成 5 小时/日，计算间距也缩短为 12.5m； 2、道路的话，根据 10~15%的坡度，同时要符合《厂矿道路规范》，实地考察如果有条件的话，可以设计修成环形道。 王金木：1、组件遮挡严重的调整支架角度，但还得检测发电效率； 2、山沟里组件遮挡严重、每日的光照只有 3-4 小时的要拆的，具体要拆的，要有记录上报监理备案； 3、电气设计总系统图应该先出，你回去催一下，尽快发过来。 沈臣友：1、设计应该优先考虑环形道路，修环形道路对施工提供方便，箱逆变基础位置可以基本放到方阵中间，同时为以后运维也能提供方便； 2、4#、5#、6#、7#、8#箱逆变基础位置需要调整； 3、组件遮挡严重的能不能调整组件倾角？ 4、箱逆变基础要尽可能靠近方阵中部； 5、所有的临时道路过水沟的位置，要适当的加涵道； 6、临时道路根据现场情况要求修成环形道路（1~6#、7~12~20#方阵有 2 条）； 7、组件遮挡问题，能调到满足每天 5 小时的光照量最好； 8、开关站前面有护坡，我认为护坡采用两级护坡； 9、从开关站到村里面有 6m 宽的水泥路，沿水泥路要挖一条排水沟； 10、沿水泥路大概有 300-400m 沿线是否安装路灯？ 11、在电站入口处是否要设置广告牌？是否有这方面的设计？ 12、施工现场是否有道路的标准？			

以下是临时道路及箱逆变位置的调整示意图（与业主研究过的）：

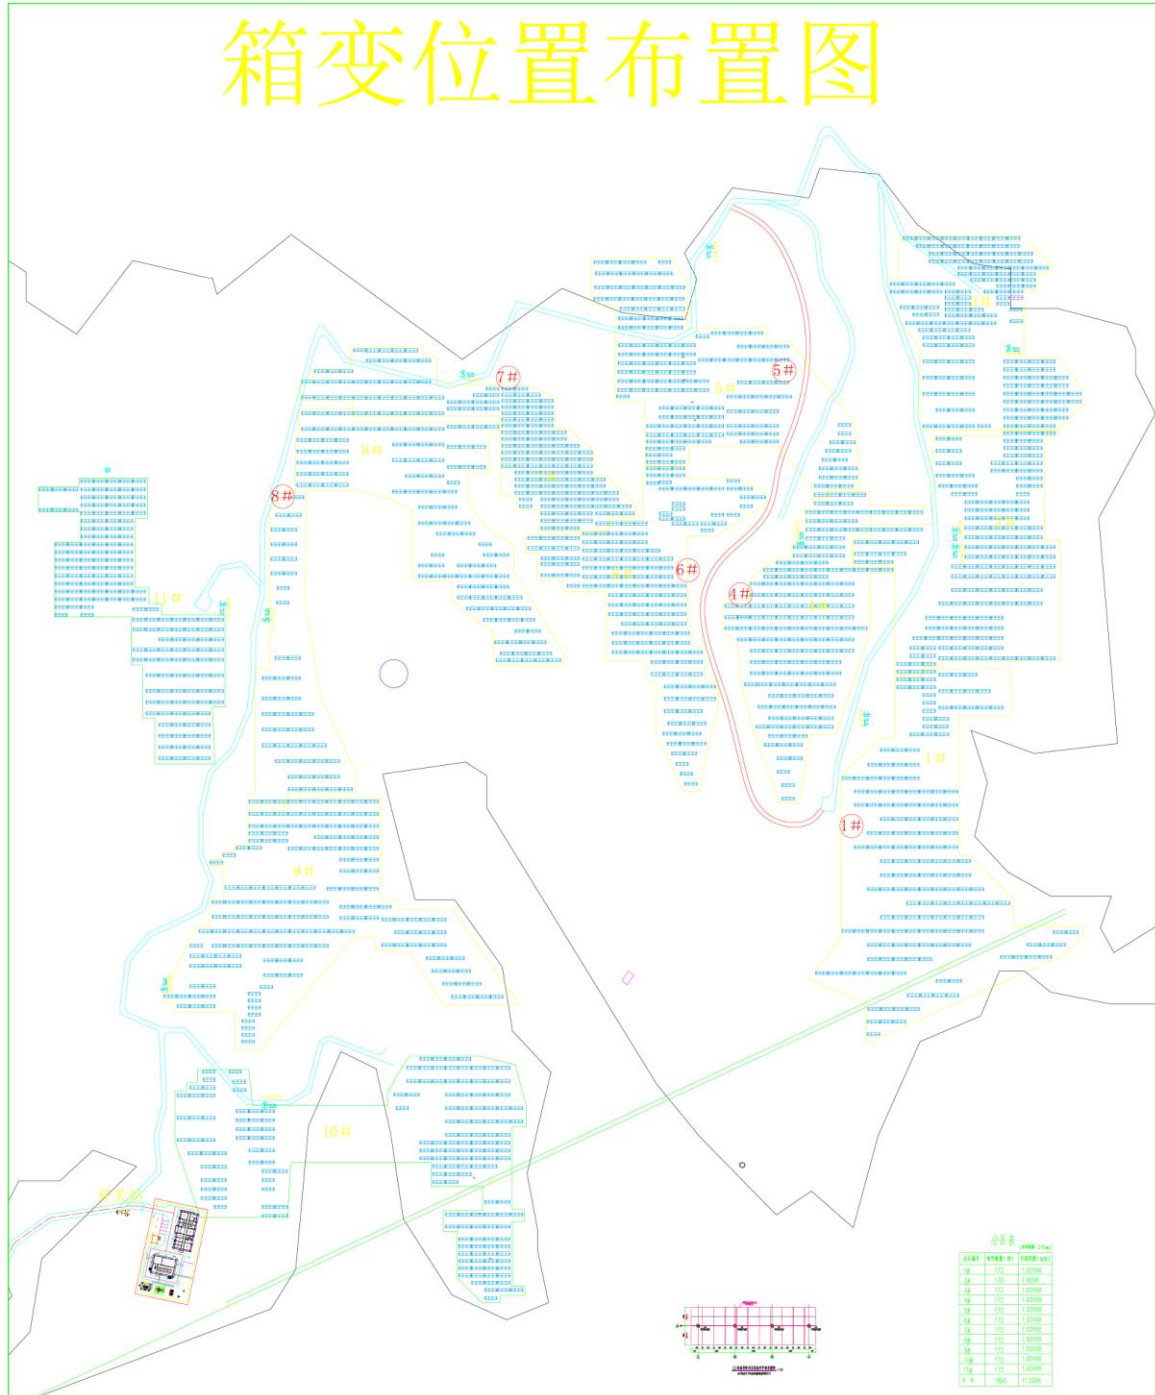

发文单位

隆化县金瀚太阳能发电有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司代发

签发

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 3 期图纸会审专题会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B62-LHJH-TZHS-003

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工第 3 期图纸会审专题会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： _____

总监理工程师： _____ 日期： 2017、01、15

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	16:00
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	主持人	王金木
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目图纸会审专题事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	高海涛 刘原	
	河北省能源工程设计有限公司	刘晓峰	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制

第 3 期 图纸会审 会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2017 年 01 月 15 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
高海涛	甘肃工程公司	工程部	13359321388
刘晓峰	河北能源工程设计院		15303109633
刘 原	甘肃工程公司	总工	18288465984
王全木	隆化金瀚	项目经理	18263060876
刘晨瑞	常州正统监理	监理员	18397903712
沈国友	常州正统监理	总代	13701557806
