


监 理 日 志

第 1 页 共 2 页

2016 年 12 月 07 日 星期：三	天气：晴 白天： 夜间：	气温： 最高 9 ℃ 最低 1 ℃
--------------------------	-----------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 1) B 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运 (26 人), 有指挥;
 - 2) B 厂区气楼面支架安装, 两组每组 6 人, 技术员 1 人计 14 人;
 - 3) D 厂区号箱逆变基础浇筑, 基础 250mm, 砼等级为 C25 防冻, 有振捣 (6 人) 有覆膜;
 - 4) 10KV 汇集站基础放线, 开挖 3 人;
 - 5) 现场施工人员共 49 人, 管理人员 6 人, 商混车 2 辆, 吊车 1 人叉车 1 辆, 挖机 1 辆, 振捣器 1 台
- 发现问题: 1) 部分分散组件的工人未带安全帽, 现场通知整改, 已确认整改;
2) 部分安装组件脚踏、掌压现象, 已现场制止, 并下发联系单, 要求重新技术交底;
3) 通知单 LZDK-ZHJL-001 已整改。

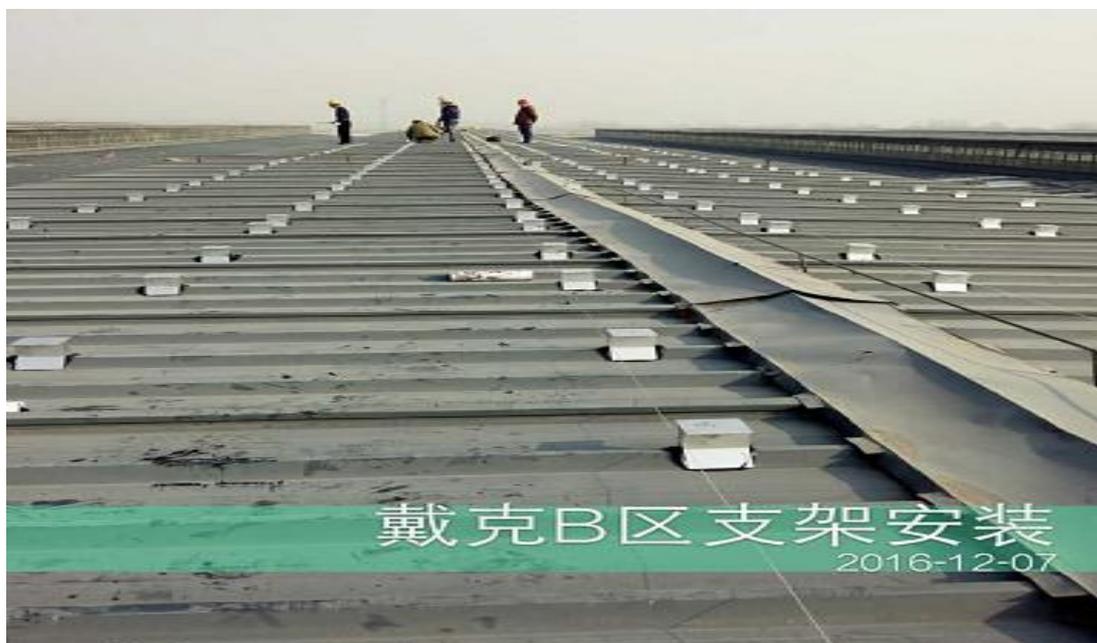



- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。
