

# 监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 15 日


天气：晴

星期：星期四

气温：23℃~33℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                     |                                                                       |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>预制仓施工垃圾未及时清理。与施工人员进行沟通，要求施工人员尽快整改。</p> <p>检修车间敷设直流电缆时，没有对彩钢屋顶进行保护，要求施工人员行走时，必须铺上纸板，避免踩坏屋面。</p> <p>立面桥架里的电缆任然没有加固，提醒施工人员尽快完成。</p> |                                                                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                         |  |
|                            | 河北冀电<br>电力工程<br>设计咨询<br>有限公司                                                                                                        | 型材主车间接地线接线<br>1#2#检修车间直流电缆接线<br>汇流箱电压测试<br>直流电缆敷设<br>预制仓调试<br>电缆沟电缆直埋 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                     |                                                                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                     | 生金文、袁野、张红军                                                            |  |
| 记录人:袁野                     |                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:                                                  |  |

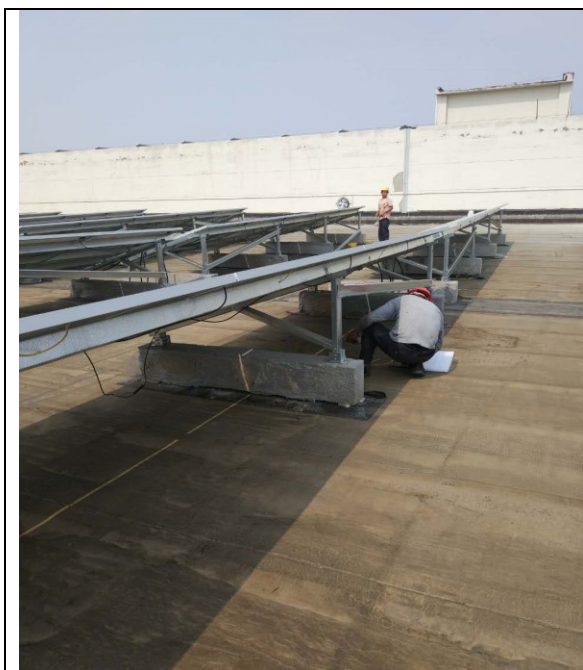

光伏组件接地线连接



汇流箱电压检测
