

珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

工程建设标准强制性条文 检查实施计划

审核： 杜国栋

编制： 杨国栋

常州正衡电力工程监理有限公司

2020年05月



前 言

电力工程建设执行强制性条文，是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规的具体体现，是工程建设过程中应强制执行的技术法规，是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》，以确保工程建设的质量与安全。

目 录

一、编制目的

二、适用范围

三、编制依据

四、执行计划

4.1 组织机构

4.2 职责

五、建立必要的管理制度

5.1 学习培训制度

六、检查计划

6.1 施工强条实施计划表

6.2 施工强条执行检查表

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表编号

表 JXMB4-2 变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表

表 JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

七、强制性条文流程

一、编制目的

为了在本工程建设过程中，强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度，确保工程建设的质量和安全，实现工程创优达标和国优工程的目标，促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实，特编订本实施检查计划。

二、适用范围

本计划适用于江苏腾盛纺织光伏发电项目。

三、编制依据

- 1) 《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号)
- 2) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)
- 3) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)
- 4) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第 373 号)
- 5) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50170
- 6) 《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输〔2006〕8 号)
- 7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号
- 8) 《电力建设工程质量监督检查大纲》(火电、送变电部分)
- 9) 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第 81 号)
- 10) 《电力建设安全工作规程》(第一部分：火力发电厂 DL5009.1)
- 11) 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 2011 版
- 12) 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 2013 版
- 13) 《电气装置安装工程质量及评定规程》 DL/T5161.1-5161.17
- 14) 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。

四、执行计划

4.1 组织机构：

成立强条执行监督检查小组

组 长：杜召栋

成 员：杨铃铃

4.2 职责

总体策划：

- (1) 编制本工程项目强制性条文实施检查计划
- (2) 编制强制性条文管理计划

(3) 实施阶段性强制性条文执行情况检查

(4) 公布检查结果，对违反强制性条文的行为提出处理建议

1) 编制本工程强制性条文实施计划

2) 组织编制本专业的强制性条文的实施细则，并组织贯彻落实。

3) 组织经常性的自检，参加工程领导小组组织的阶段性的检查活动，针对检查出的问题提出整改措施，并组织落实，建立整改问题台账，进行管理。

五、建立必要的管理制度

5.1 学习培训制度

(1) 目的：为了使《工程建设强制性条文》在工程建设期间得到很好的落实，必须加强对《工程建设强制性条文》的宣传和组织培训活动，对参加本工程建设的各专业专职工程师和管理人员熟悉其内容要求，并且在工作中自觉地得到贯彻落实，要求项目部各专职工程师和管理人员一定要掌握本专业有关的《工程建设强制性条文》的内容要求，达到应知应会、知行合一的目的。

(2) 学习培训对象：项目部各专业工程师及管理人员，各施工队专工、技术员

(3) 培训责任领导：项目经理、项目技术负责人、工程部组织

(4) 学习内容：

1) 《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号)；

2) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)

3) 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第 293 号)；

4) 《电力监管条例》(国务院令第 432 号)

5) 有关强制性条文的的专业内容

(5) 学习方式：采用多种形式，包括自学、专业组织集中学习、研讨、请专家讲课、参加本单位组织的学习班等方式，力求达到理解和使用的目的。

(6) 培训经费由项目部设立专项资金。

5.2 强条的执行、检查和落实

1) 强制性条文和强制性标准的其他条款都应该执行。

2) 要求在施工单位编制施工组织设计、专业施工组织设计、施工方案、施工措施、施工作业指导书等文件时，必须有强条的内容和执行的要求。

3) 在审批以上文件时，必须检查强制性条文的内容和具体实施措施，没有此内容的一律不得批准。

4) 监督检查施工单位在技术交底时，必须提出本项目应该包括的具体强制性条文的内容和实施措施，如何填写施工记录，并按照交底程序管理和记录。

5) 工程验收时，一定要首先检查强条的执行情况和记录完善情况，没有执行或没有合格的执行记录可查依据，一律不得验收。

6) 违反强条规定者，无论其行为是否一定导致事故的发生，都要按照《建设工程质量管理条例》和建设部 81 号令的规定进行处罚。

7) 在执行中，要特别注重强制性执行条文和强制性标准的时效性，要实施标准动态管理，及时更新，保证执行标准的准确性，对作废的标准要及时清理、发布更替。

8) 除应严格执行强制性条文和标准外，对于有的项目还要涉及到其他推荐性的标准，凡是已经列入合同内要求的其他标准，为了保证工程质量、安全，也应必须严格遵守。

六、检查计划

根据本工程执行的规程内容，有关强制性条文要求及使用表格规定如下：

6.1 施工强条实施计划表


工程编号						工程名称	责任单位			强制性条文执行表号
单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批		施工单位	勘测单位	设计单位	
01						房屋建（构）筑物工程	√		√	
	01					光伏区、升压站、外线杆塔基础				
		01				地基与基础	●	●		表 4.0.2
			01			土石方工程	○	●		表 4.0.2
				01		土石方开挖	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
		02				混凝土基础	○	●		表 4.0.2
			01			垫层	●	○		表 10.5.2
				02		基础模板	●	○		表 10.1.2
			03		基础钢筋	●	○		表 10.3.2、10.4.2	
			04		基础混凝土	●	○		表 10.5.2	
		02				主体结构	○	●		表 4.0.2
			01			混凝土结构	○	●		表 4.0.2
				01		模板	●	○		表 10.1.2、10.2.2
				02		钢筋	●	○		表 10.3.2、10.4.2
				03		混凝土	●	○		表 10.5.2
			02			砌体工程	○	●		表 4.0.2
				01		砖砌体	●	○		表 9.1.2
		03				建筑装饰装修	○	●		表 4.0.2
			01			地面	○	●		表 4.0.2
				01		基层	●	○		表 12.1.2
				02		面层	●	○		表 12.1.2、12.10.2
			02			抹灰与勾缝	○	●		表 4.0.2
				01		一般抹灰	●	○		表 12.2.2、12.10.2
			03			门窗	○	●		表 4.0.2
				01		金属门窗安装	●	○		表 12.3.2、12.10.2
		04				建筑屋面	○	●		表 4.0.2
				01		屋面找平层	●	○		表 13.0.2
				02		屋面保温层	●	○		
				03		屋面卷材防水层	●	○		
				04		屋面工程细部构造	●	○		
		05				建筑给水及排水	○	●		表 4.0.2
			01			室内给水系统	○	●		表 4.0.2
				01		室内给水管道及配件安装	●	○		表 14.1.2
				02		室内给水设备安装	●	○		
			02			室内排水系统	○	●		表 4.0.2
工程编号						工程名称	责任单位			

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批		施工单位	勘测单位	设计单位	强制性条文执行表号	
				01		室内排水管道及配件安装	●	○		表 14. 2. 2	
				01		雨水管道及配件安装	●	○			
		06	01			建筑电气	○	●		表 4. 0. 2	
						电气动力、照明安装	○	●		表 4. 0. 2	
				01		动力、照明配电箱(盘)安装	●	○			
				01		电线导管、电缆导管和线槽敷设	●	○			
						电线、电缆穿管和线槽敷线	●	○			
				01		电缆头制作、接线和线路绝缘测试	●	○			
						灯具安装	●	○			
				01		开关、插座安装	●	○			
				04		建筑物照明通电试运行	●	○		表 15. 0. 2	
		07	01			通风与空调	○	●		表 4. 0. 2	
						通风工程	○	●			
				01		通风机安装	●	○			
				01		通风与空调系统调试	●	○			表 4. 0. 2
02	01					基础工程					
						组件支架基础工程					
			01			地基与基础	○	●		表 4. 0. 2	
				01			定位及高程控制	●	○		表 10. 5. 2
					01		单位工程定位放线	●	○		表 10. 1. 2
			02			混凝土基础	●	○		表 10. 5. 2	
				01		模板	○	●		表 4. 0. 2	
				02		钢筋	●	○		表 10. 5. 2	
				03		混凝土	●	○		表 10. 5. 2	
			03			预埋件安装	○	●		表 4. 0. 2	
				01		地脚螺栓安装	●	○		表 10. 5. 2	
03	01					附属工程					
						厂区道路、围栏、旗台及大门				表 4. 0. 2	
		01			厂区道路				表 4. 0. 2		
			01			路基				表 12. 1. 2	
				01		基层	○	○		表 12. 1. 2	
			02		水泥混凝土路面	○	○		表 10. 5. 2		
			03		泥结碎石路面	○	○		表 10. 5. 2		
工程编号					工程名称		责任单位				

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批		施工单位	勘测单位	设计单位	强制性条文执行表号
				02	室外给水管道及井室工程		○	○		表 14.4.2
					室外排水管道		○	○		表 4.0.2
					垫层		○	○		表 10.5.2
				03	排水管道安装		○	○		表 4.0.2 表 14.4.2
					管道安装		○	○		
					消防水泵结合器及室外消火栓安装		○	○		
04					光伏电站安装工程					
				01	支架安装					
					固定支架安装		●	○		表 14.2.2
					固定支架安装		●	○		
				02	组件安装		○	●		表 4.0.2
					光伏组件安装		○	●		表 4.0.2
					光伏组件安装		●	○		表 14.2.2
					组串内接线		●	○		
					组串内接线		○	●		表 4.0.2
				03	汇流箱安装		○	●		表 4.0.2
					箱体安装		●	○		表 14.2.2
					汇流箱箱体安装		●	○		
					汇流箱接线及回路检查		○	●		表 4.0.2
					汇流箱接线及回路检查		○	●		表 4.0.2
				04	逆变器室设备安装		●	○		表 14.2.2
					逆变器柜(箱)体安装		●	●		表 4.0.2
					逆变器接线及回路检查		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					区数据采集柜接线及回路检查		○	●		表 4.0.2
				05	35kv 箱式变压器安装		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					变压器基础安装		●	●		表 4.0.2
					变压器基础安装		○	●		表 4.0.2
					变压器本体安装		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					变压器本体安装		●	●		表 4.0.2
					变压器检查		○	●		表 4.0.2
					变压器检查		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				06	电气设备安装		●	●		表 4.0.2
					控制及直流系统设备安装		○	●		表 4.0.2
					盘柜基础安装		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					电控室控制及保护屏台安装		●	●		表 4.0.2
					电控室二次回路检查及接线		○	●		表 4.0.2
				04	直流屏及充电设备安装		●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2

				05		直流屏二次回路检查及接线	●	●		表 4.0.2
				06		蓄电池安装	○	●		表 4.0.2
			02			35KV 配电装置安装	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				01		盘柜基础安装	●	●		表 4.0.2
				02		配电盘安装	○	●		表 4.0.2
				03		母线安装	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				04		断路器检查	●	●		表 4.0.2
				05		二次回路检查及接线	○	●		表 4.0.2
				06		箱式升压变压器安装（1 区-16 区）	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				07		35KV 配电装置带电试运	●	●		表 4.0.2
			03			站（场）用配电装置安装	○	●		表 4.0.2
				01		盘柜基础安装	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				02		PC（动力中心）盘安装	●	●		表 4.0.2
				03		母线安装	○	●		表 4.0.2
				04		二次回路检查及接线	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				05		就地动力控制设备安装	●	●		表 4.0.2
				06		站（场）用变压器安装	○	●		表 4.0.2
				07		站（场）用电系统设备带电试运	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
		07				线路及电缆				
			01			电缆管配制及敷设	●	●		表 4.0.2
				01		电缆管配制及敷设	○	●		表 4.0.2
			02			电缆敷设	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				01		电缆敷设	●	●		表 4.0.2
			03			电力电缆终端制作及安装	○	●		表 4.0.2
				01		电力电缆终端制作及安装	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
				04		控制电缆终端制作及安装	●	●		表 4.0.2
					01	控制电缆终端制作及安装	○	●		表 4.0.2
				05		电缆防火与阻燃	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					01	电缆防火与阻燃	●	●		表 4.0.2
			08			防雷与接地	○	●		表 4.0.2
				01		室外接地	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					01	室外接地装置安装	●	●		表 4.0.2
					02	主接地装置安装	○	●		表 4.0.2
				02		室内接地	●	○		表 5.1.2、5.2.2、5.3.2
					01	室内接地装置安装	○	●		表 4.0.2

七、强制性条文流程：

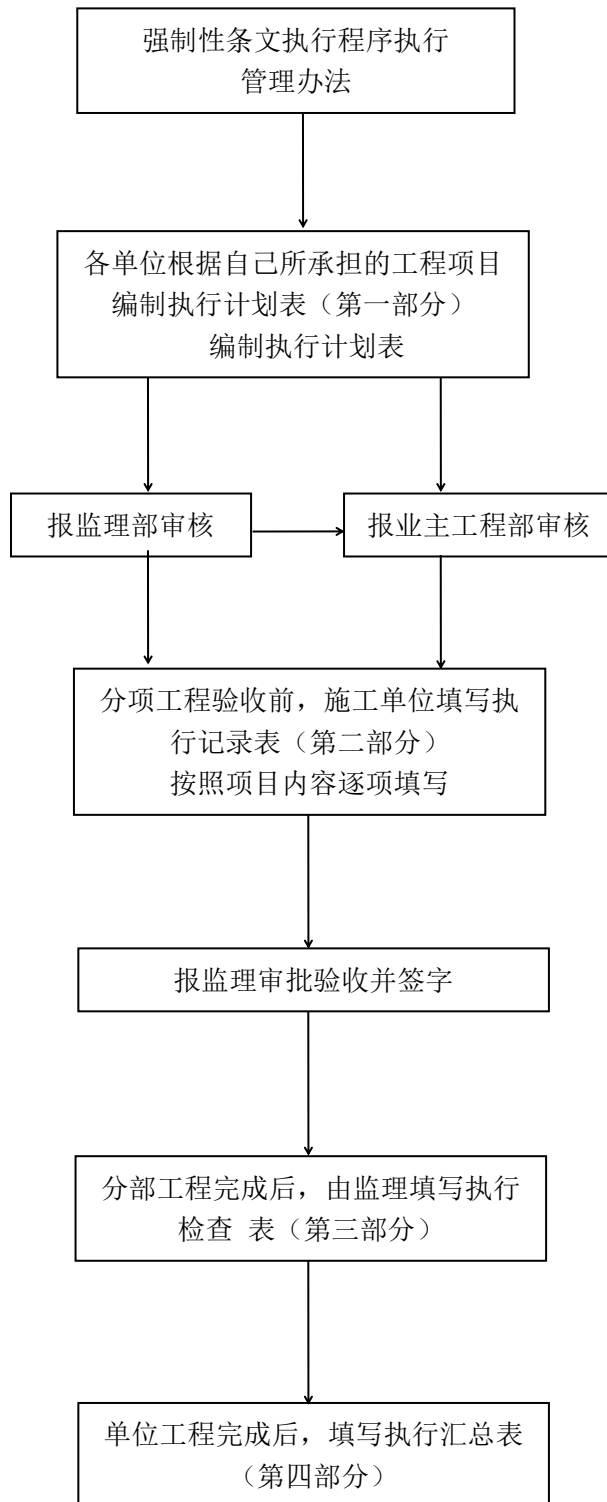

(-----以下无正文-----)
