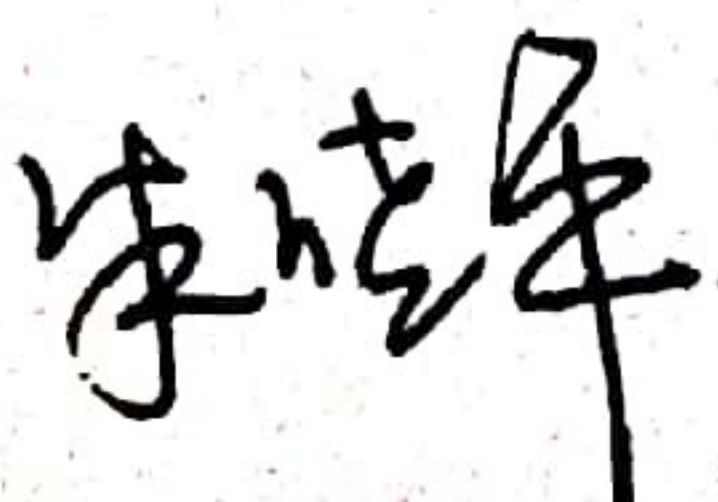



工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-DQ-QTJC-014

工程名称		蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目								
单位 (子单位) 工程名称		电气装置安装工程	分部 (子分部) 工程名称	低压电器设备施工						
施工单位		中国电建集团江西省电力设计院有限公司	项目经理	陈明毅						
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料						
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 GB 50254-2014										
1	2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求: 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。 表 2.0.4 不同相的母线最小电气间隙 <table border="1"> <tr> <th>额定电压</th> <th>最小电气间隙</th> </tr> <tr> <td>$U \leq 500$</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>$500 < U \leq 1200$</td> <td>14</td> </tr> </table>		额定电压	最小电气间隙	$U \leq 500$	10	$500 < U \leq 1200$	14	已执行	检查记录
额定电压	最小电气间隙									
$U \leq 500$	10									
$500 < U \leq 1200$	14									
2	2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表 2.0.4 的规定。		已执行	安装记录						
3	3.0.2 低压断路器的安装,应符合下列要求: 2 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。		已执行	安装记录						
4	3.0.3 低压断路器的接线,应符合下列要求: 1 裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。		已执行	检查记录						
5	7.0.3 按钮的安装应符合下列要求: 3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护罩。		已执行	检查记录						
6	10.0.1 熔断器及熔体的容量,应符合设计要求,并核对所保护电气设备的容量与熔体容量相匹配;对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器,严禁替代。		已执行	检查记录						
7	10.0.5 安装具有几种规格的熔断器,应在底座旁标明规格。		已执行	检查记录						
项目总工:			专业监理工程师:							
										
2020年07月28日			2020年07月28日							
