


11. 信息管理流程

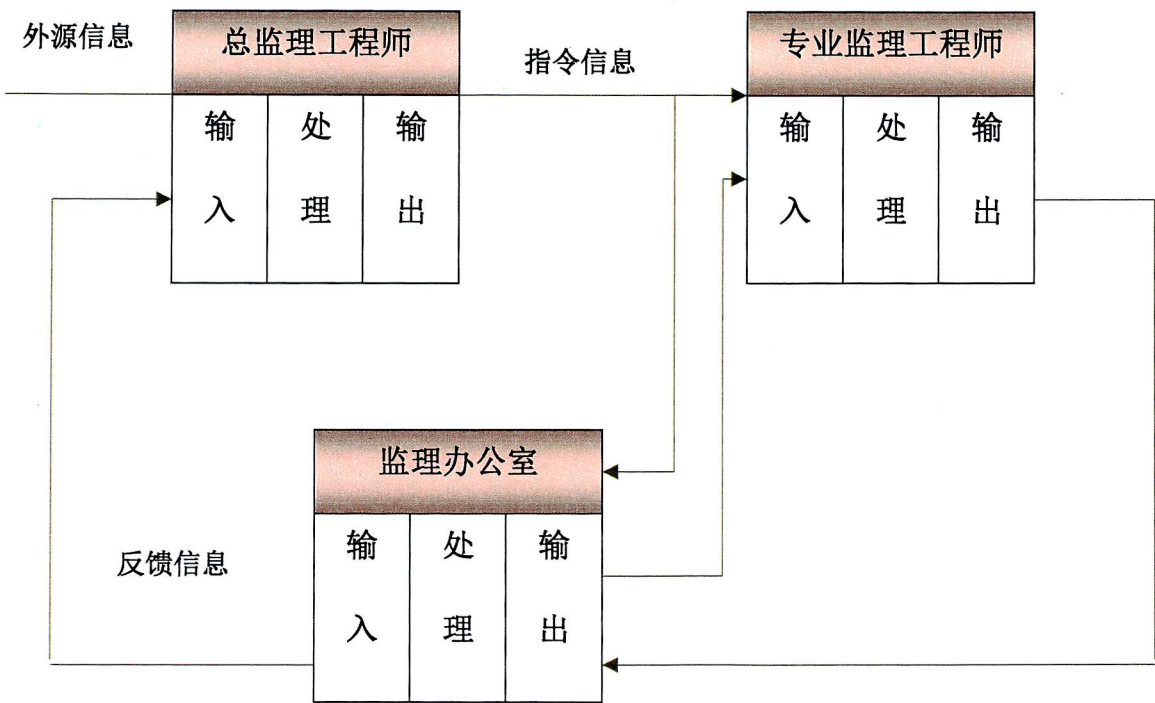

五、建安工程质量控制

(一) 建安工程范围：

本建筑工程主要包括：支架基础施工、电缆沟道施工、并网设备基础。

(二) 建（构）筑物质量控制：

主要包括：方阵内建构筑物（光伏组件支架基础）等。

1) 本工程的混凝土主要施工区域为屋面光伏组件支架预制基础预制配重块。混凝土基础浇筑或预制应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）要求；同时混凝土基础构架支撑面，还应同时满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）中对混凝土基础顶面标高、水平度及平面定位等精度的相关要求，以确保现场设备构架的顺利安装。

2) 在混凝土浇筑过程控制中应严格控制浇筑时间。

3) 水泥进场应对其品种、级别、包装、出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的有关规定。

- 当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月（快硬硅酸盐水泥超过 1 个月）时，应进行复检，并按复验结果使用。
- 检查数量：按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过
