

土工击实试验检测报告

试验室名称: 铜川市公路交通试验检测中心

报告编号: BG-2016-TGJ-321

施工/委托单位	中清能绿洲科技股份有限公司	委托编号	WT-2016-667
工程名称	中广核陕西铜川二期50兆瓦农业大棚光伏发电项目	样品编号	YP-2016-TGJ-321
工程部位/用途	回填	样品描述	黄色, 无臭味
试验依据	JTG E51-2009 (T0804-1994)	判定依据	JTG/T F20-2015
主要仪器设备及编号	击实仪TG-001、烘箱GT-002、电子秤GT-003		
取样地点	原地面		

试验次数	1	2	3	4	5
平均含水率(%)	12.0	14.0	16.2	18.2	20.0
干密度 (g/cm ³)	1.68	1.75	1.78	1.75	1.69

最佳含水率 (%) = 16.1


最大干密度 (g/cm³) = 1.78

修正最佳含水率 (%) = -

修正最大干密度 (g/cm³) = -

土的鉴别分类、代号

细粒土

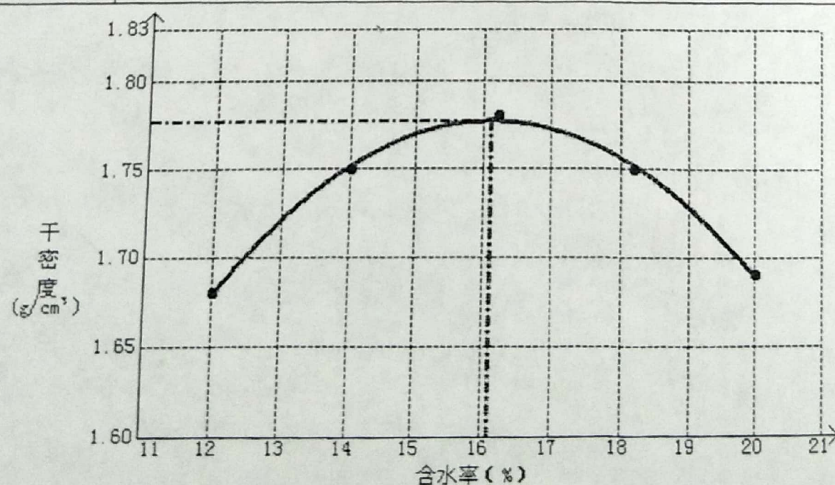

检测结论:

经检测, 该土样品的最大干密度为1.78g/cm³和最佳含水率为16.1%。

备注:

试验: 高莉莉 审核: 王军 签发: 王军 日期: 2016 年 12 月 15 日 (专用章)
