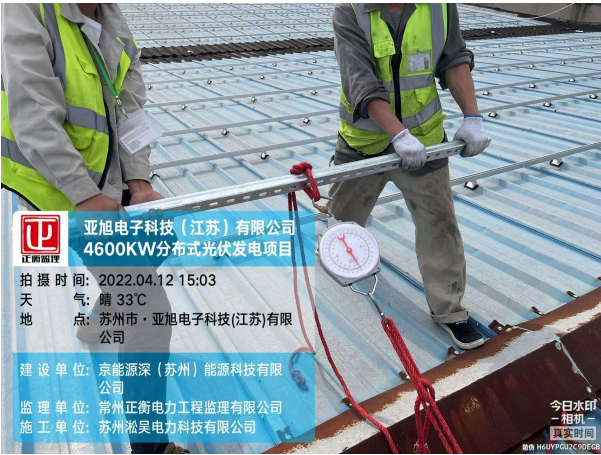


# 旁站监理记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：YXDZ-PZJL-004

|                                                                                                                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 日期及气候：2022.04.12 晴                                                                                                                                                               | 工程地点：亚旭电子科技（江苏）有限公司有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：大仓库彩钢瓦屋面夹具拉拔试验                                                                                                                                                        |                         |
| 旁站监理开始时间：下午 14:30                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：15:00          |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行试验交底，然后开始试验。将弹簧秤用绳子扣好，然后两人用铁杆抬起，弹簧秤指针达到设计要求的拉拔数据而夹具未被拉起，检验合格。</p>                                                           |                         |
| <div></div> |                         |
| <p>监理情况：</p> <p>整个拉拔试验操作正确，拉拔力符合设计要求。</p>                                                                                                                                        |                         |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                      |                         |
| <p>旁站监理人员（签字）：2022 年 04 月 12 日</p>                                                                                                                                               |                         |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
