

图纸会审记录

编号：001



工程名称	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目	建设单位	南京彩虹新能源有限公司
施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	南瑞电力设计有限公司	勘察单位	南瑞电力设计有限公司
占用面积		工程造价	
结构类型		会审地点	工地项目部会议室
层数			
承包范围		会审时间	2017 年 12 月 01 日
图纸 会审范围	南京熊猫现代服务业光伏发电项目 QC170002S-E02-T0101、QC170002S-E02-T0102、QC170002S-E02-T0103、QC170002S-E02-J0102、QC170002S-E02-J0103、QC170002S-E02-J0106		
参 加 单 位	单 位 名 称	参 加 人 姓 名	
	南京彩虹新能源有限公司	刘阳阳	
	常州正衡电力工程监理有限公司	田同有	
	南瑞电力设计有限公司	胡健、宋永占 徐秋林、周同、陈婷婷、董洁	



由 扫描全能王 扫描创建

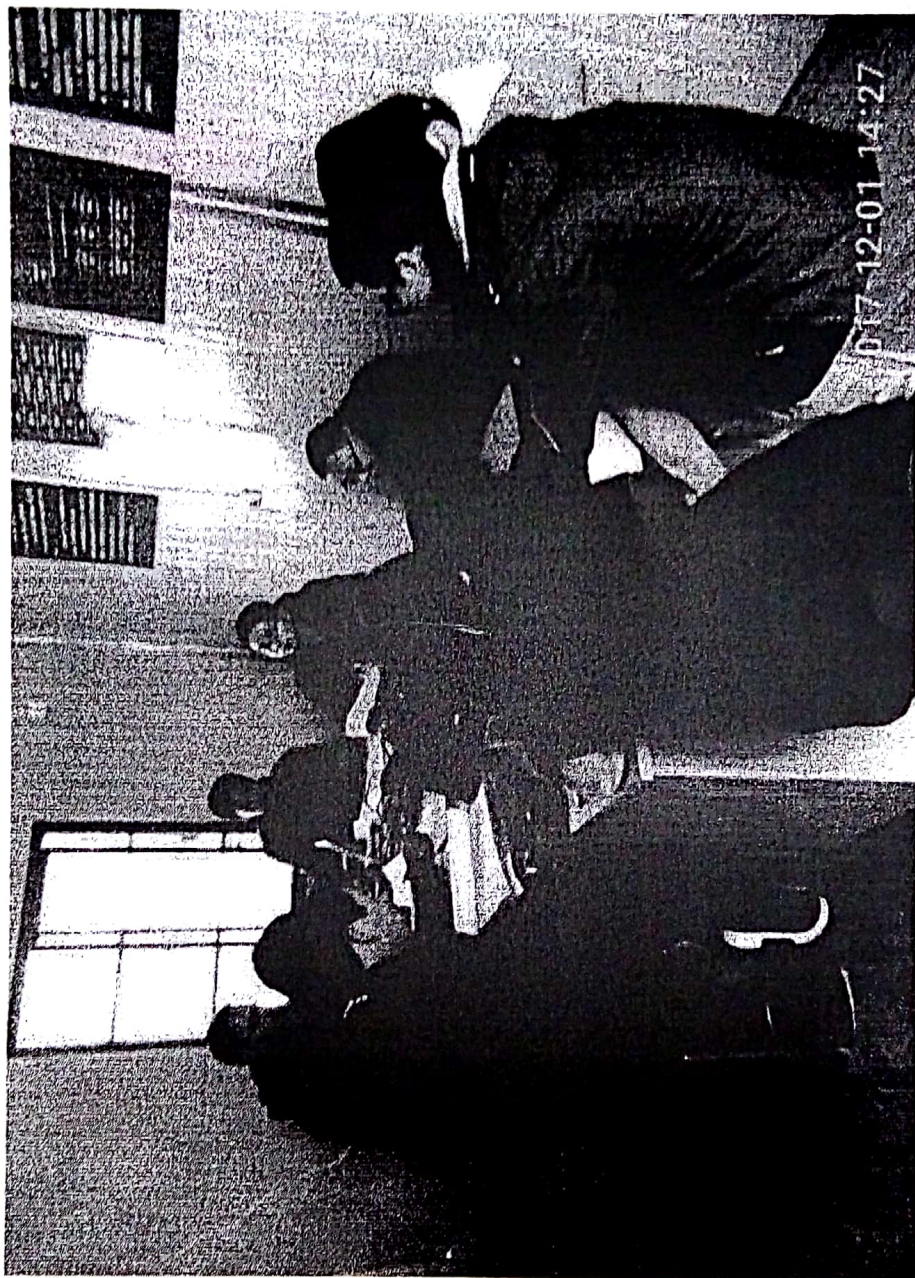
设计图纸会审记录

图 纸 编 号	审 图 意 见	设计答复
QC170002S-E02-T0101	1. 支墩混凝土 C25 是否满足技术条款要求 2. 支架横条预留孔位置核实 3. 2#楼人孔位置与横条有冲突需调整位置 4. 角度调节设计方式需补说明 (通过调整支墩调整角度)	1.2 设计联系确认 3.4 蓝图出图时调整
QC170002S-E02-T0102-	1. 支架六角螺栓 10*30 图纸为外六角, 到货为内六角建议一致; 2. 接地扁铁安装根据现场情况可优化	设计答复同意改动
QC170002S-E02-T0103	1. 业主明确: 箱变基础按图施工, 按要求做好防水处理避免箱变积水。 2. 箱变进线管距离地面高度需标注	监理方、施工方已确认
QC170002S-E02-J0102	按图施工	
QC170002S-E02-J0103	按图施工	
QC170002S-E02-J0106	低压电缆桥架固定方式, 与楼面距离按照 3 兆瓦安装方式执行	设计方补图纸

施工单位 (盖章):  2017年12月 / 日	监理单位 (盖章):  2017年12月 / 日	设计单位 (盖章):  2017年12月 / 日	建设单位 (盖章):  2017年12月 / 日
---	---	--	---

附: 参会人员签到表





会议人员签到表

日期 2017.12.1

姓名	单位名称	职务	联系电话	备注
田国菊	迁安安理公司	财务主管	15728737725	
胡健	南瑞	项目负责人	18551626169	
米永立	南瑞	—	15895957633	
符元林	南瑞	—	13705150323	
田国菊	南瑞	—	1281730807	
刘阳阳	南瑞	项目负责人	18740350106	
曹小	南瑞	项目负责人	13805559608	
董浩	南瑞	土建设计	15812917614	
陈婷婷	南瑞	土建	1561867132	

