监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-TZD-02

致 东风设计研究院有限公司 （承包单位）：

主题：关于施工质量的事宜

内容：

日常巡查现场，发现以下质量问题事项：

1、檩条拉杆垫圈尺寸过小，起不到良好的安全作用。

2、部分檩条几何形状不符合设计要求，变形扭曲，且没有校正固定。檩条拉杆螺丝没有紧固。

3、组件位置摆放不整齐，组件固定螺栓垫圈过小，起不到良好的固定作用。

4、部分钢结构横梁扭曲变形，影响组件安装及表面观感质量。

5、车棚钢柱底部未稳定，部分底部支撑钢垫块脱落，且钢柱未砼包封稳固，存在基础不稳定的情况下就安装组件，存在影响结构安全的隐患，必须立即整改。

6、所有材料、工序均未经报验通过就进行下道工序作业。过分重视施工进度而忽视了施工质量。

以上存在的质量问题及其他未详事项要求你方立即组织人员进行整改，整改到位后报监理部复查，复查通过方可进行继续施工，未经验收而擅自施工，造成的影响、责任由你方自行承担。

限 2016 年 09 月 18 日内回复。

附件：现场照片

抄送：上海宝网天穗太阳能有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　　期：2016.9.14

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。

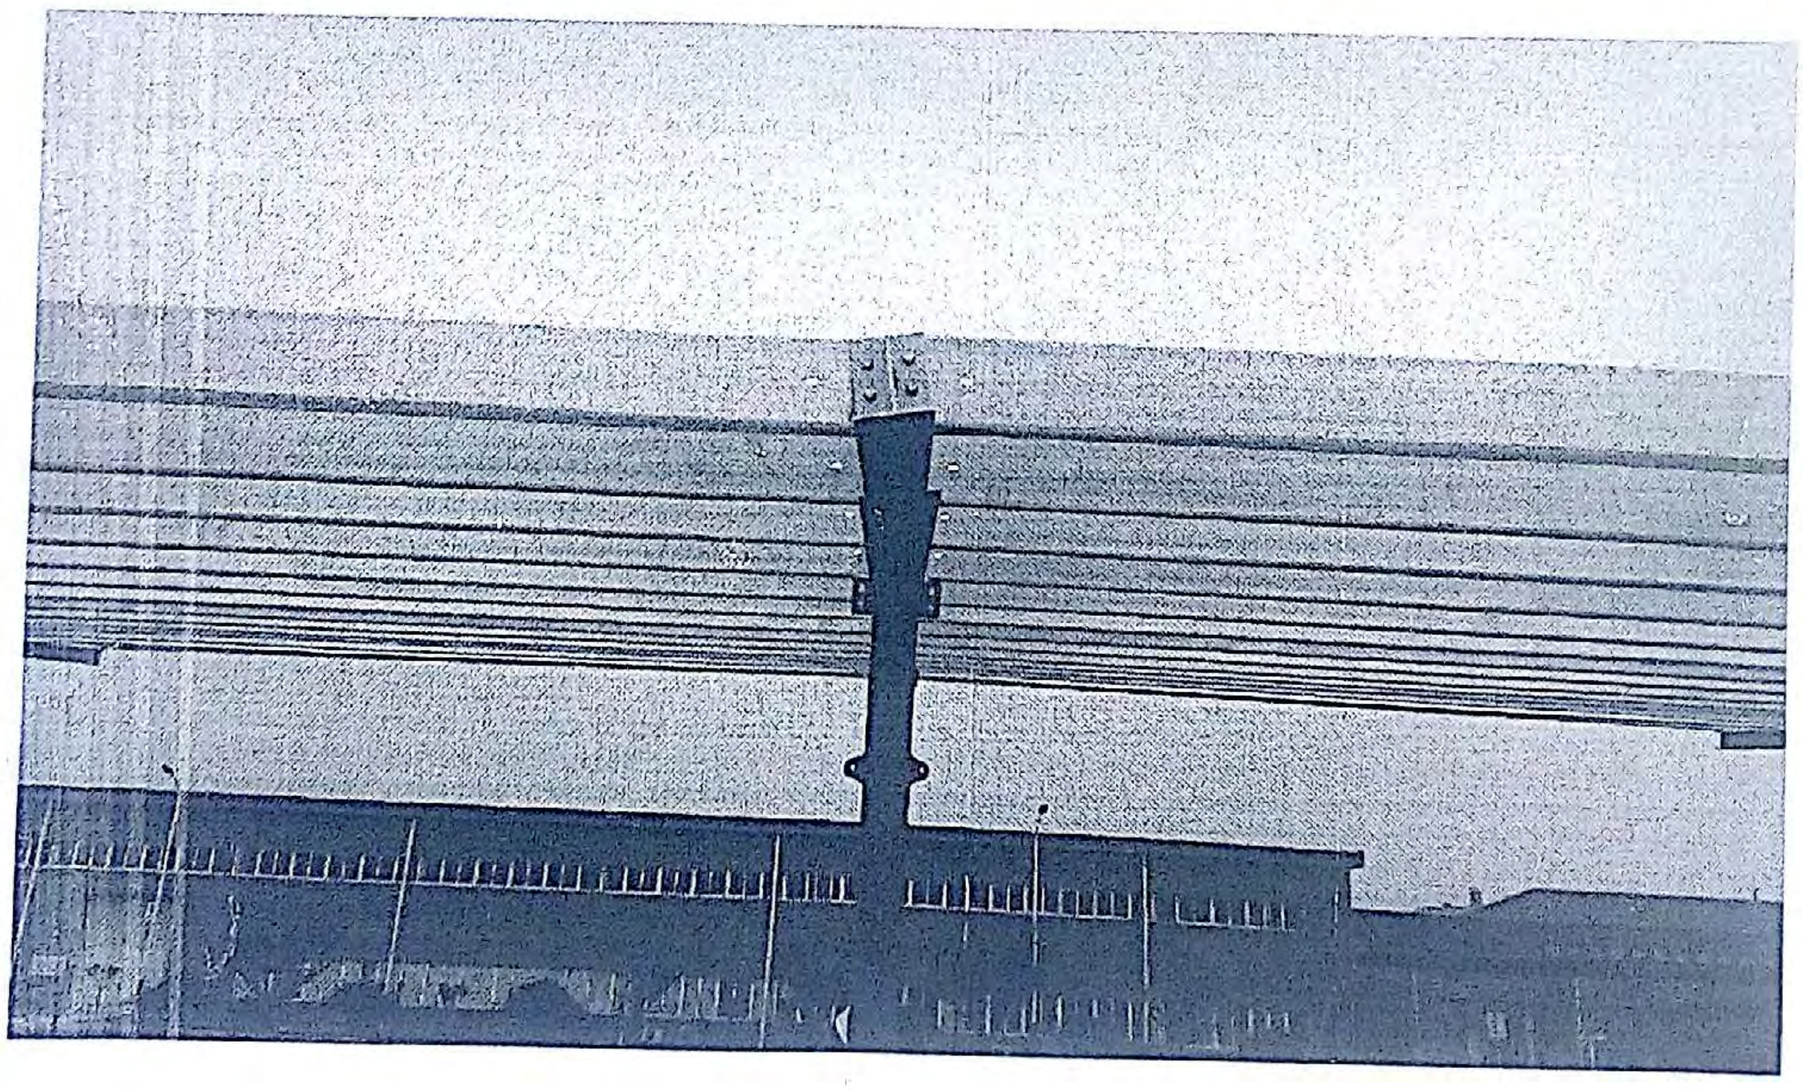

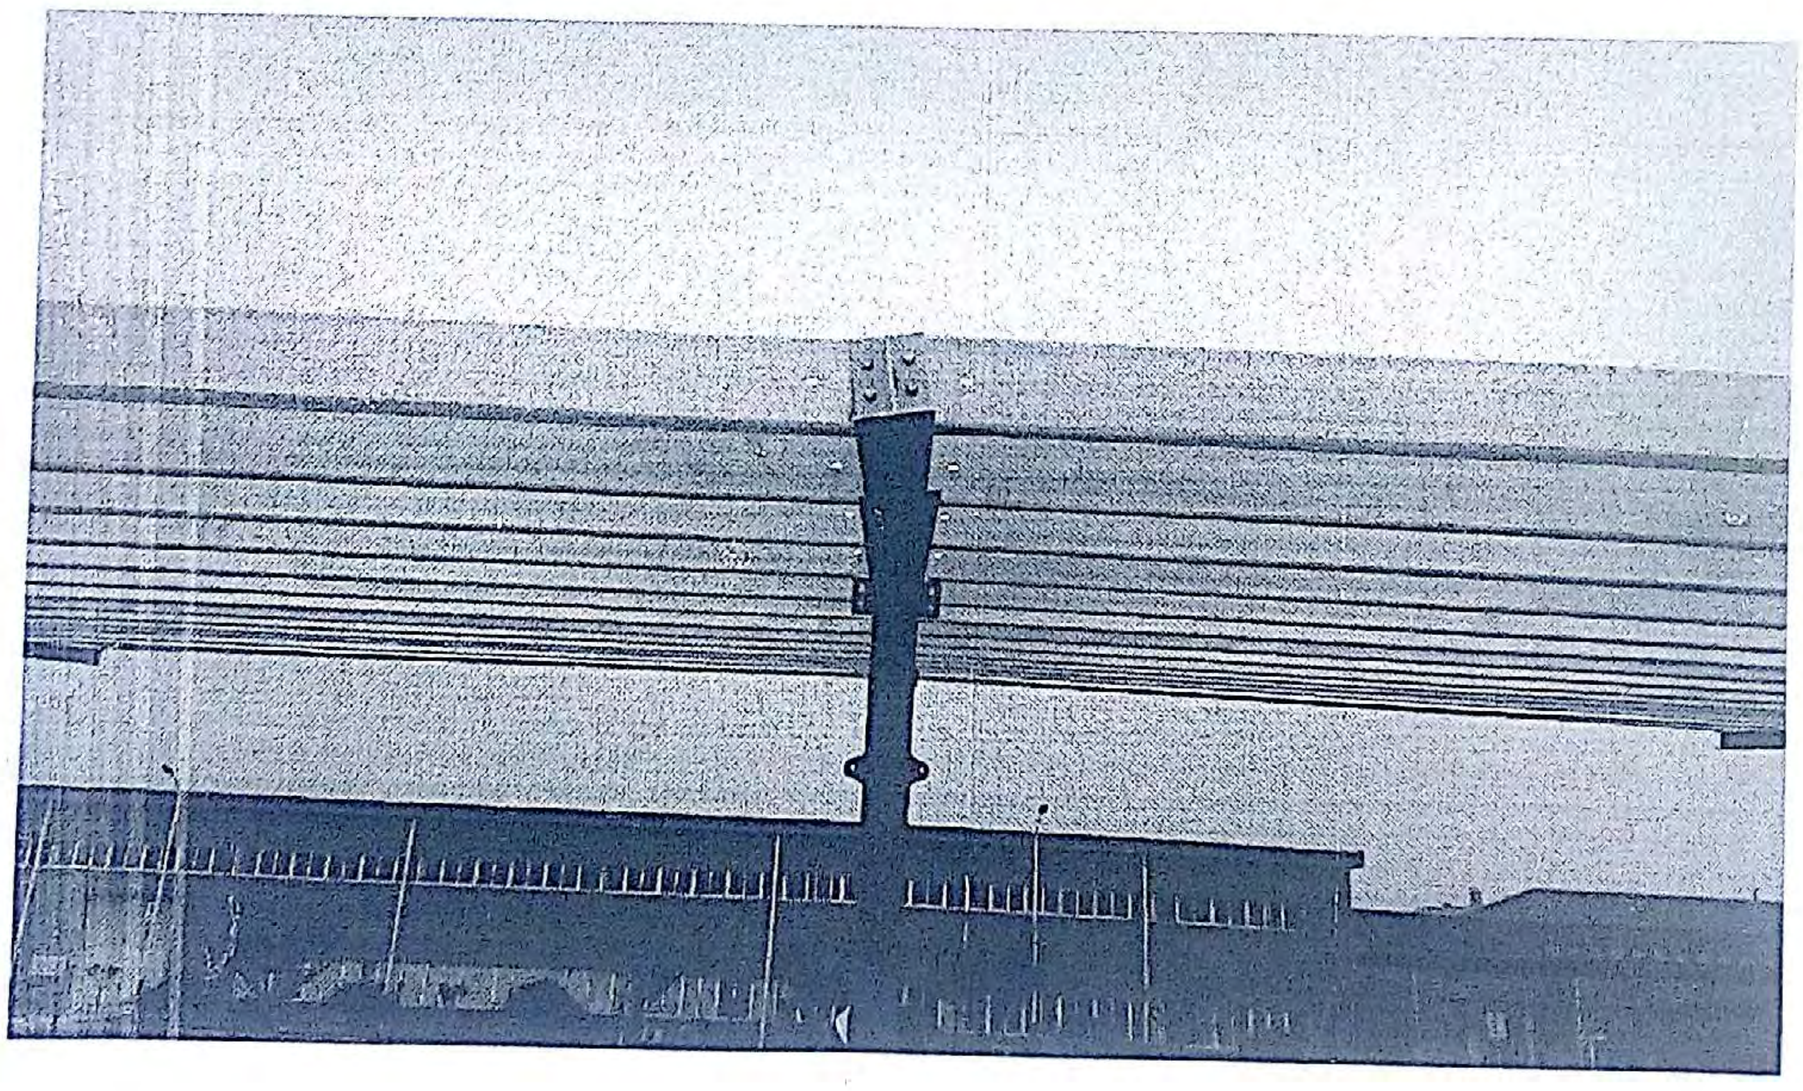

监理通知回复单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目　编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方已接到编号ZHJL-TZD-02的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附:1、檩条、拉杆垫圈为标准件

2、檩条变形已返厂

3-5、正在整改

6、已送审

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：

2016 年 9 月 18 日

复查意见：

经复查，大部分整改事项已完成，未完成整改事项望尽快整改到位，报监理部复查。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：

2016 年 9 月 18 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知回复单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目　编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方已接到编号ZHJL-TZD-02的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附：

3、已调整完成（见附图）

4、梁变形严重的已返厂处理，其他已整改完成（见附图）

5、柱脚砼浇筑已完成（见附图）

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：

2016 年 10 月 5 日

复查意见：

经复查，已整改完成。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：

2016 年 10 月 5 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

檩条调直固定

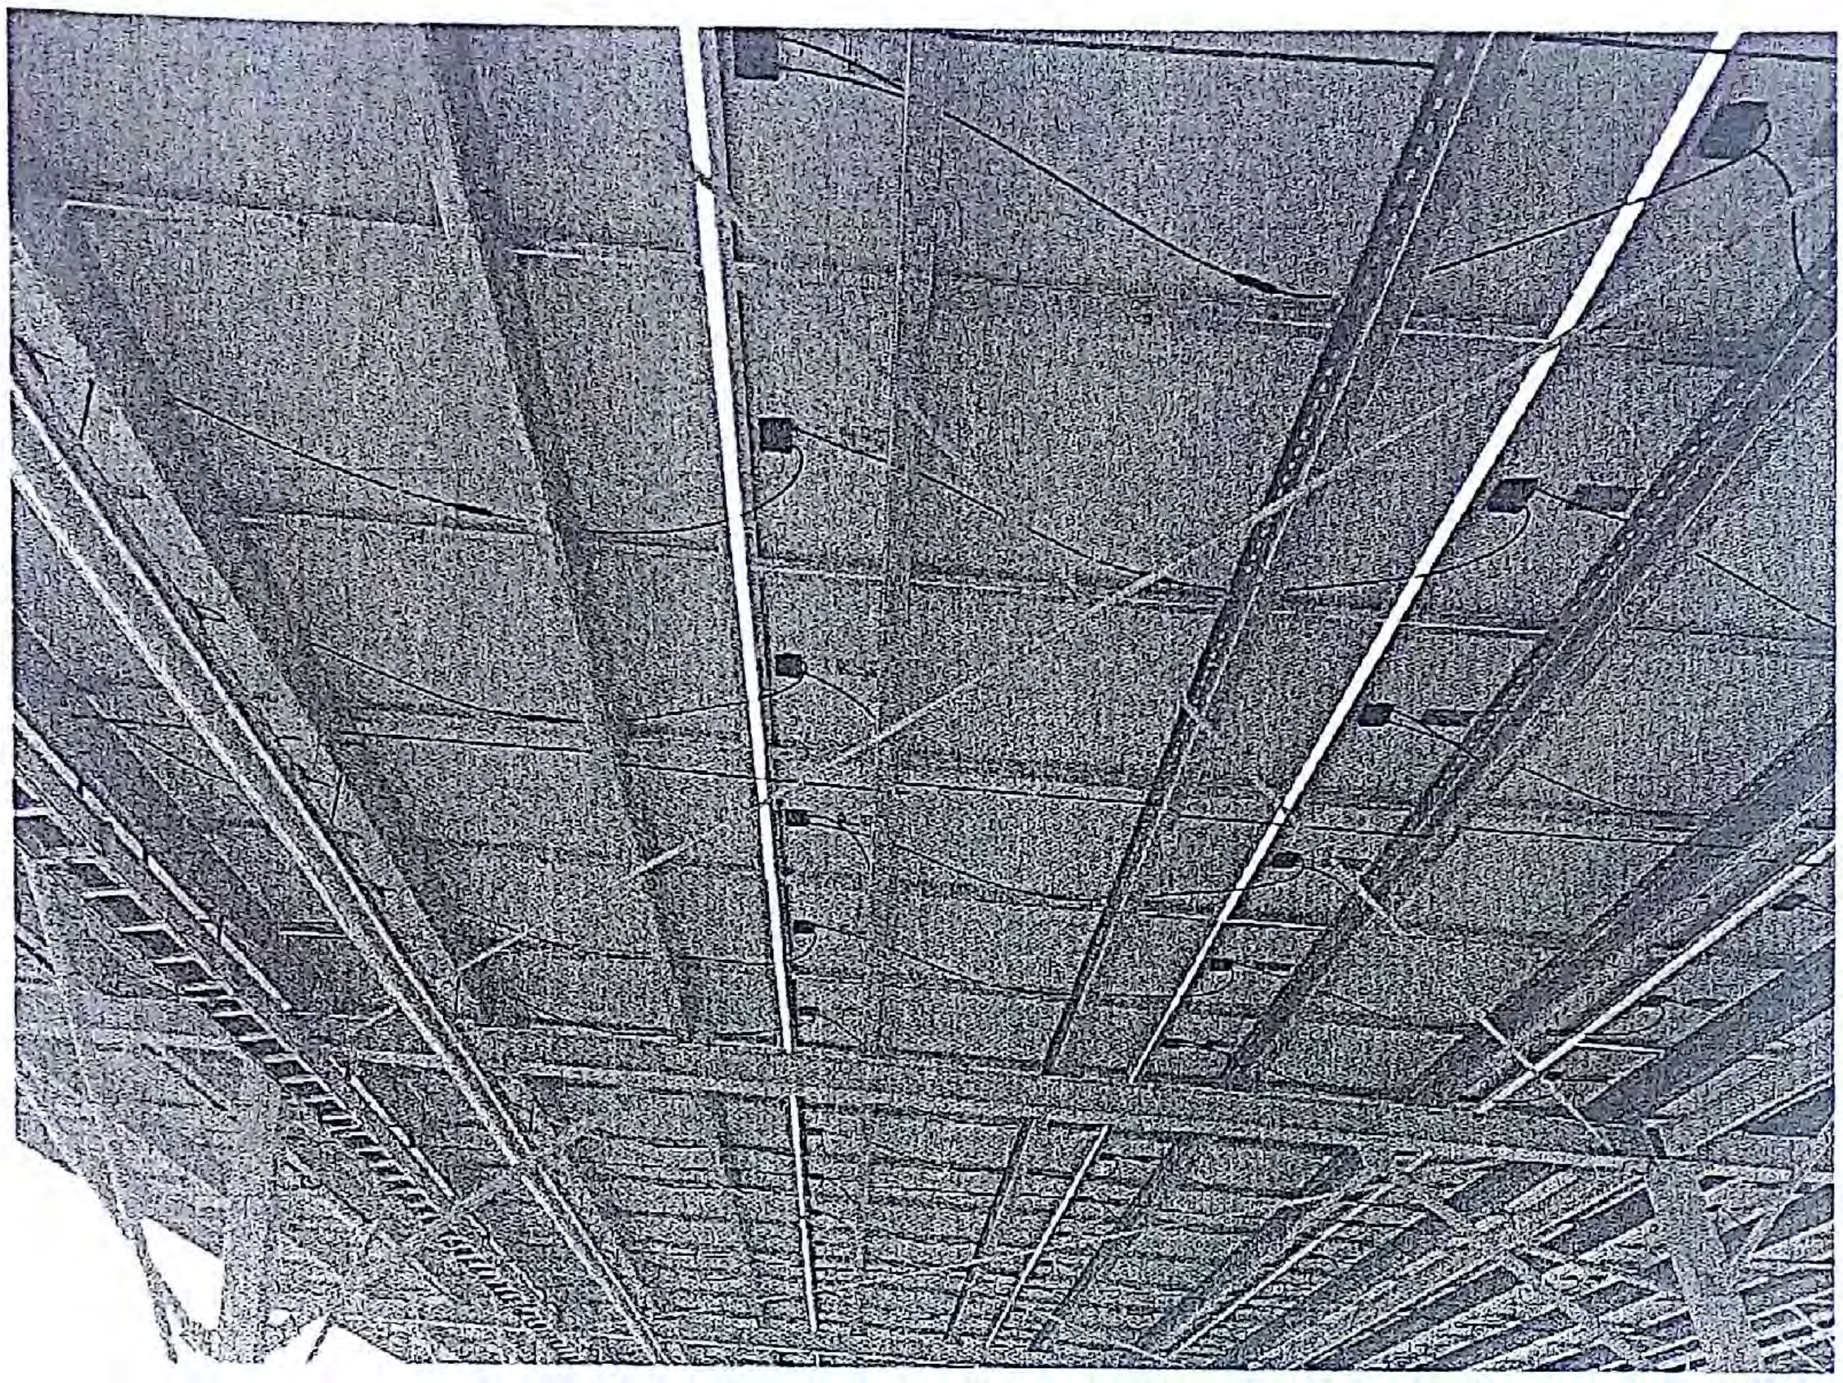
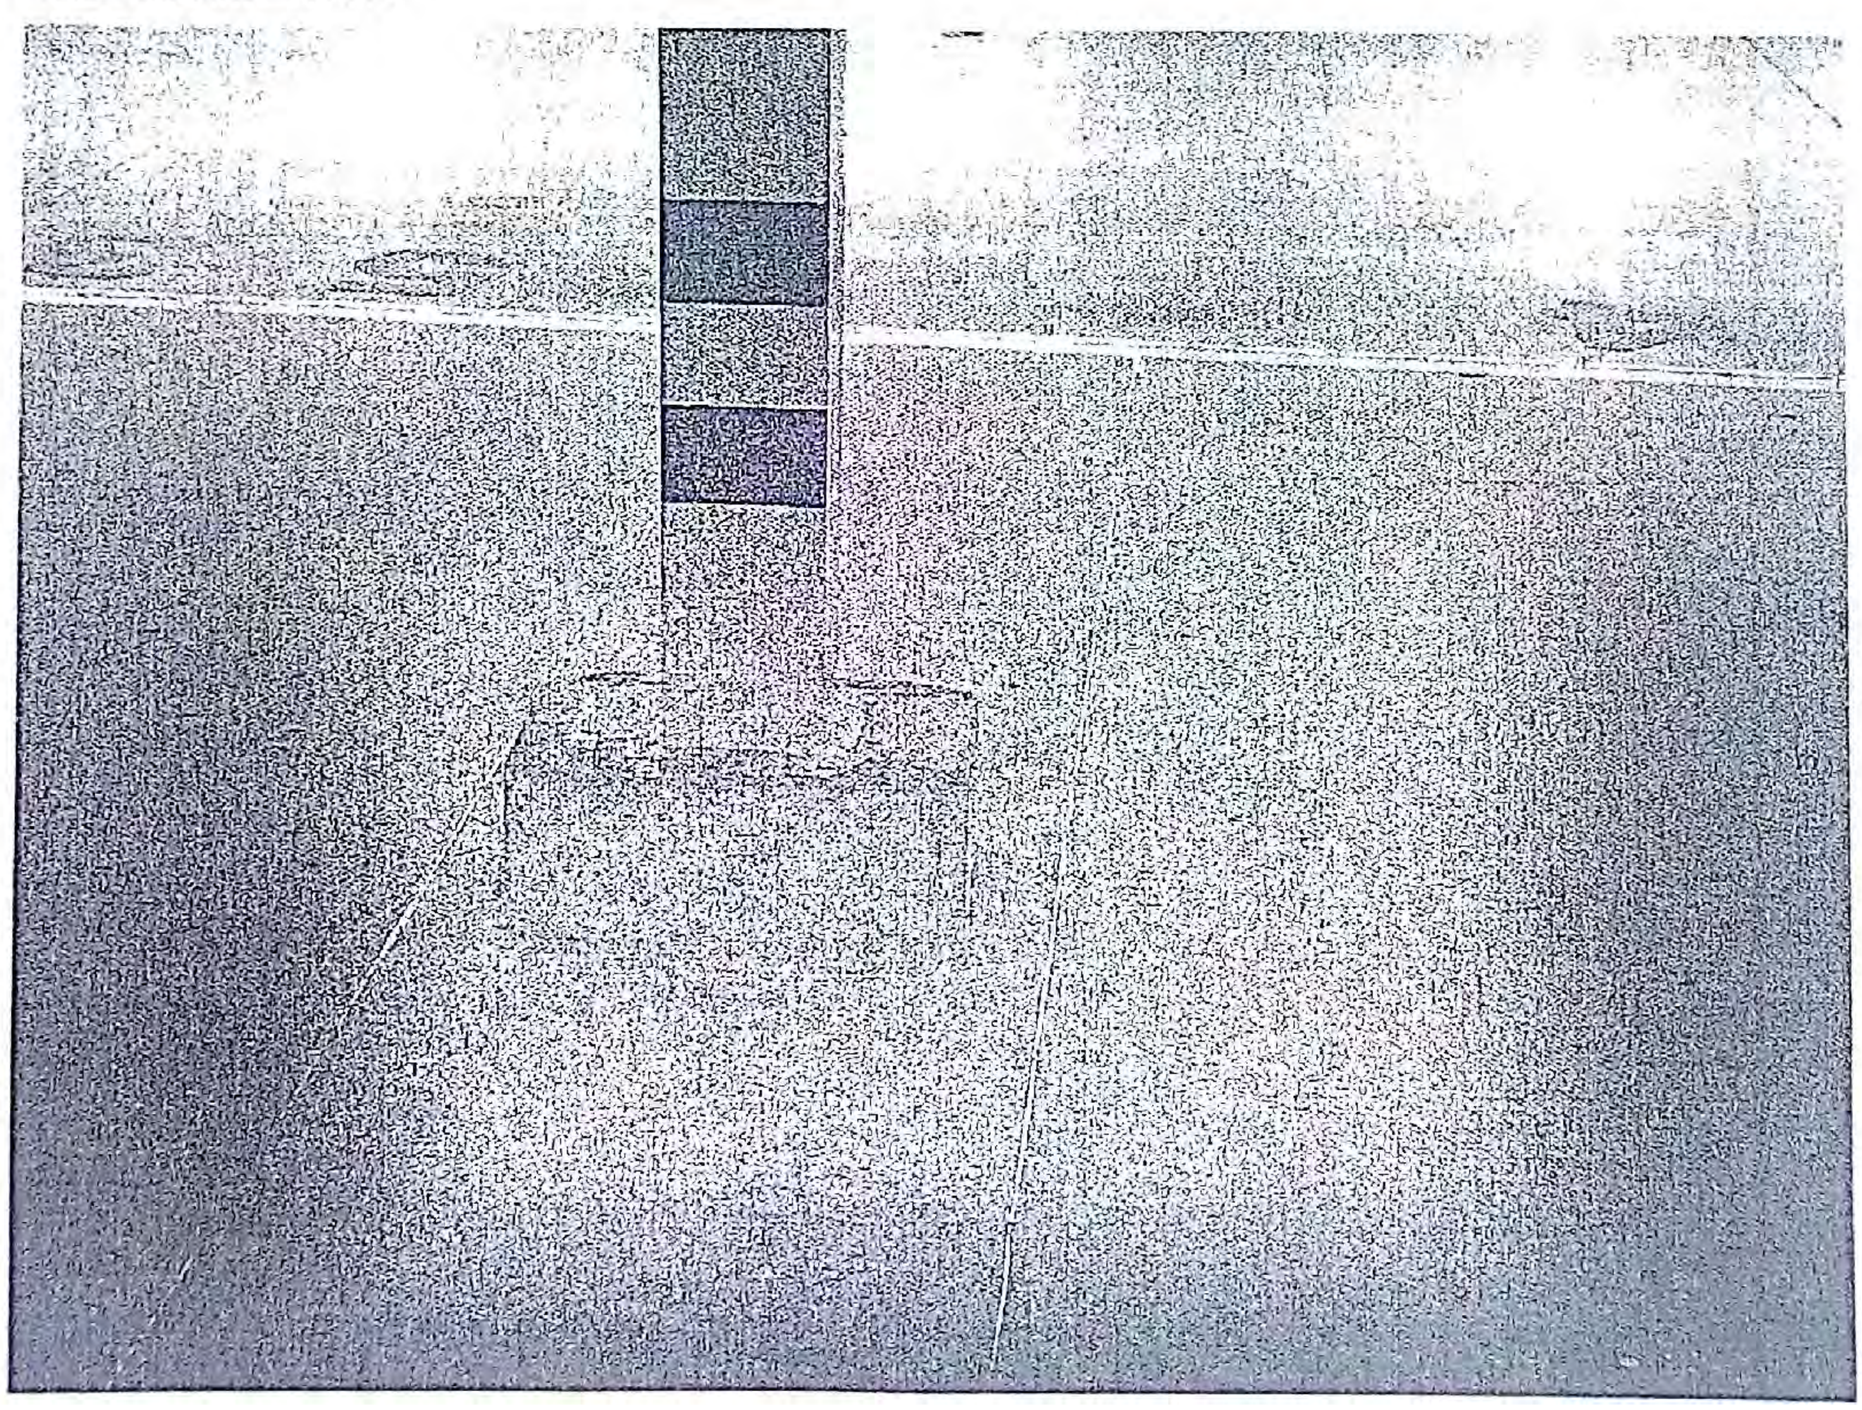
钢柱包脚施工完成
