监 理 通 知 单

工程名称：天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦）　编号：JL-A07-004

致：　常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦）（EPC总包项目部）

事由:关于现场质量及安全文明施工事宜；

内容：你单位承建的天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目，2023年11月03日上午对施工区域及料场检查发现如下；

一、三标段：

①施工区域及道路缺少安全标识标牌；②水面作业人员未配备安全带，救生圈配备不足；③料场办公区域用电不规范（电器开关未见漏电保护器）；

二、二标段：

①吊装区域未设置安全警戒线；②鱼塘内部分管桩桩头未做防腐、桩顶未用丁基防水胶带进行封堵；③施工区域及道路缺少安全标识标牌；

三、一标段：

①管桩堆放过高，不允许堆放高于4层；②扁铁检测发现镀锌层达不到（65μm）现场实测为12.7μm；③料场材料码放凌乱、废弃纸箱、模板随意丢弃；④料场灭火器未见检查记录表；⑤现场乙炔瓶和氧气瓶倾倒并随意摆放；⑥材料未分类随意摆放；

附件：照片7张

对以上问题总包单位，总承包单位加强现场管控，整改部分必须2日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高立标

日　　期：2023年11月03日

注　本表一式_3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

问题照片

面作业人员未配备安全带，救生圈配备不足	电器开关未见漏电保护器
镀锌层厚度不足到	灭火器未见检查记录表
	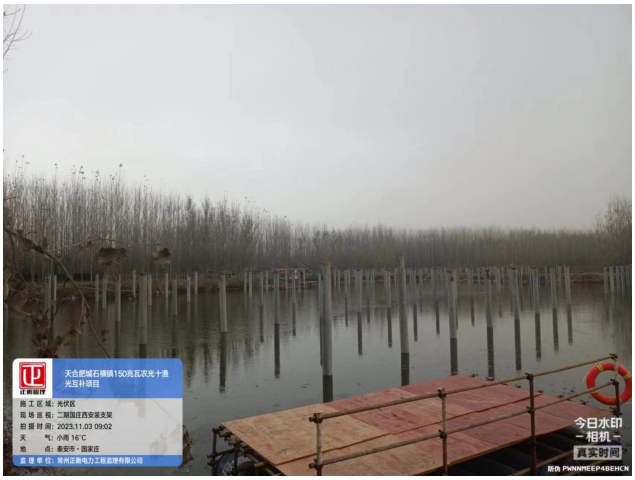
材料未分类随意摆放	桩头未做防腐

乙炔瓶和氧气瓶倾倒并随意摆放	
