监理通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五"盐锅光伏发电项目　　编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-006

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

事由：关于你处光伏支架施工存在问题:。

内容：

2024年05月09日，我监理部巡查光伏支架施工施工现场存在以下问题:

1、现场使用支架厂家资质未报验;

2、现场进场支架未经监理填报开箱验收记录(已卸车)(图1)。

望项目部引起高度重视，提高自身质量管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控，严格监理程序,认真分析存在问题原因,对出现问题严格落实整改,严格按照报验程序施工,限二日内整改完成,整改后报监理复查。如拒不整改后果自负。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总//专监理工程师（签字）：

日期：2024.05.09

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

扫描全能王 创建

附图1：

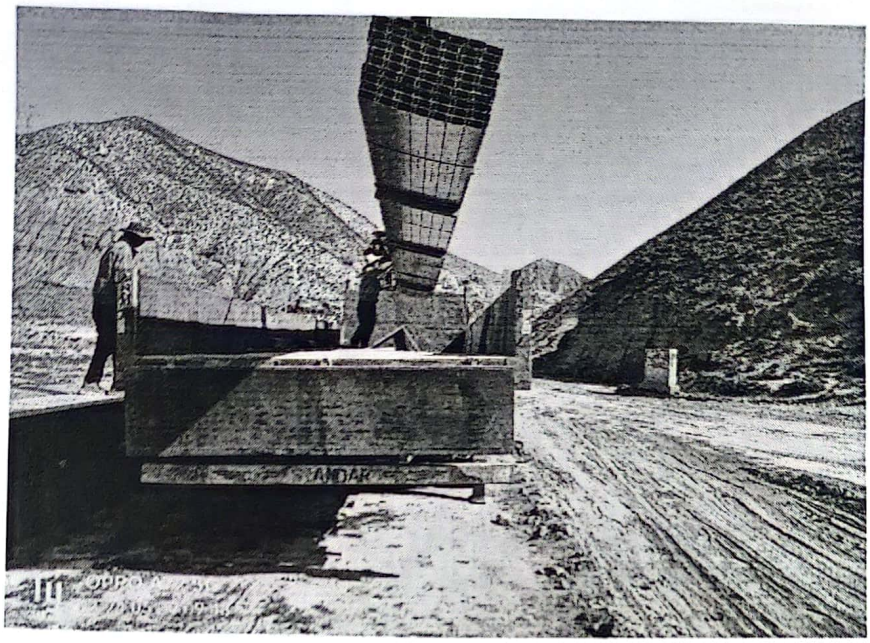

支架卸车（图1）

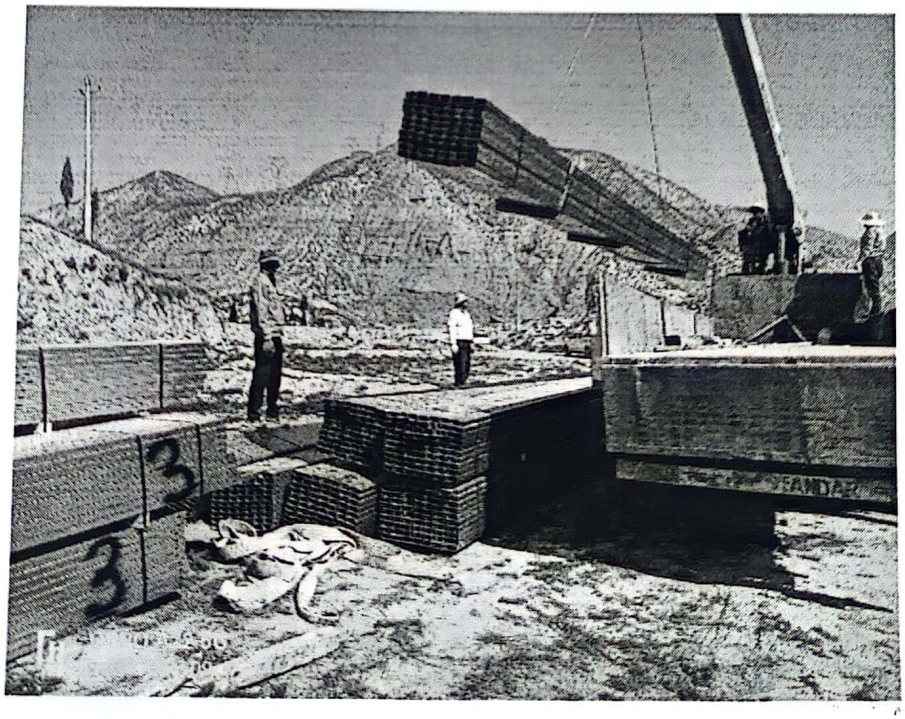

支架卸车（图1）

扫描全能王 创建

监理通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五"盐锅光伏发电项目　　编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-007

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃浩博新能源有限公司

事由：关于你处施工甘肃浩博永靖330KV升压站主控楼钢筋施工存在的问题：

内容：

2024年05月07日，我监理部巡查甘肃浩博永靖330KV升压站主控楼钢筋施工现场时存在以下问题：

1、底板钢筋重叠处搭接长度不足（图1）。

2、基础梁主筋保护层过大（图2）。

望项目部引起高度重视，提高自身管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控，保证现场施工质量和安全。迅速全面排查现场现场相关问题，认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实整改，严格按照规范施工，限三日内整改完成，整改后报监理复查。如拒不整改后果自负。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2024.5.7

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

扫描全能王 创建

图1：

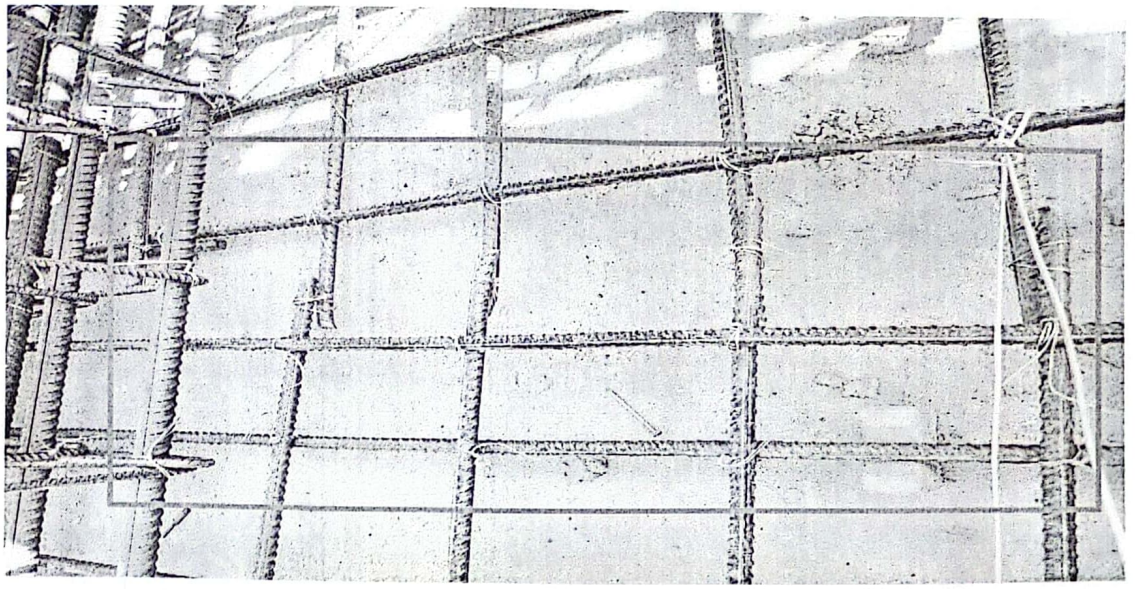

图2：

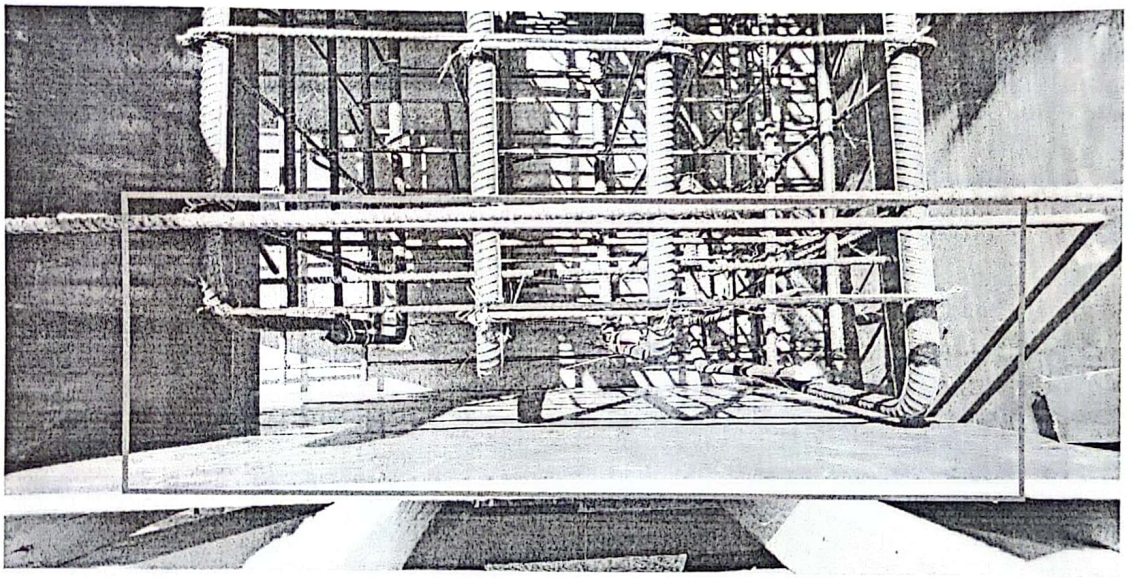

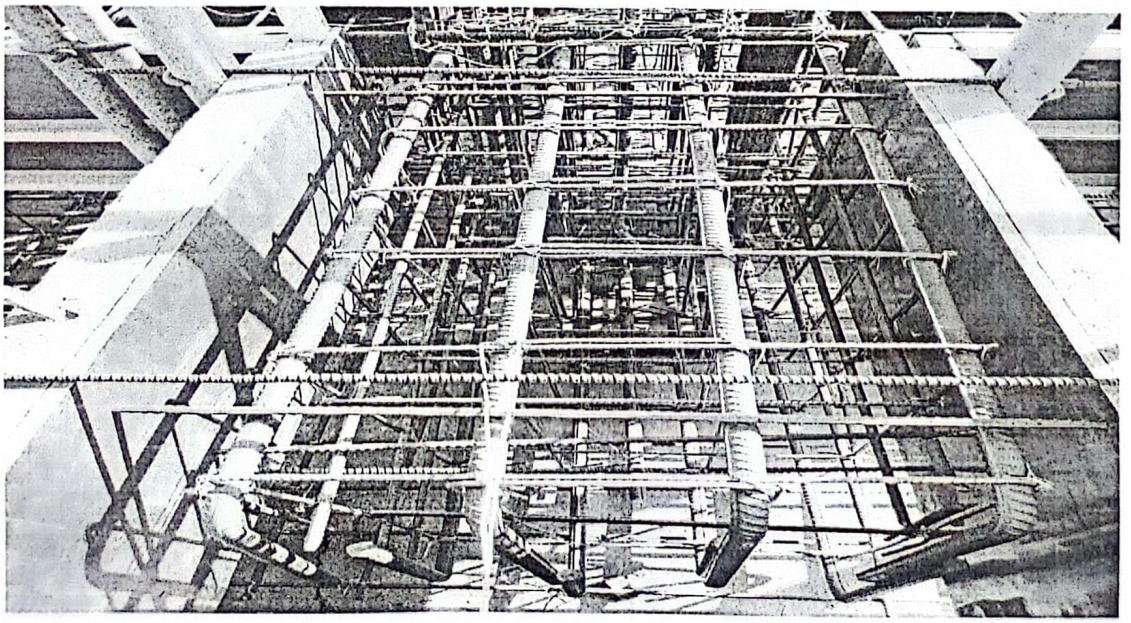

扫描全能王 创建
