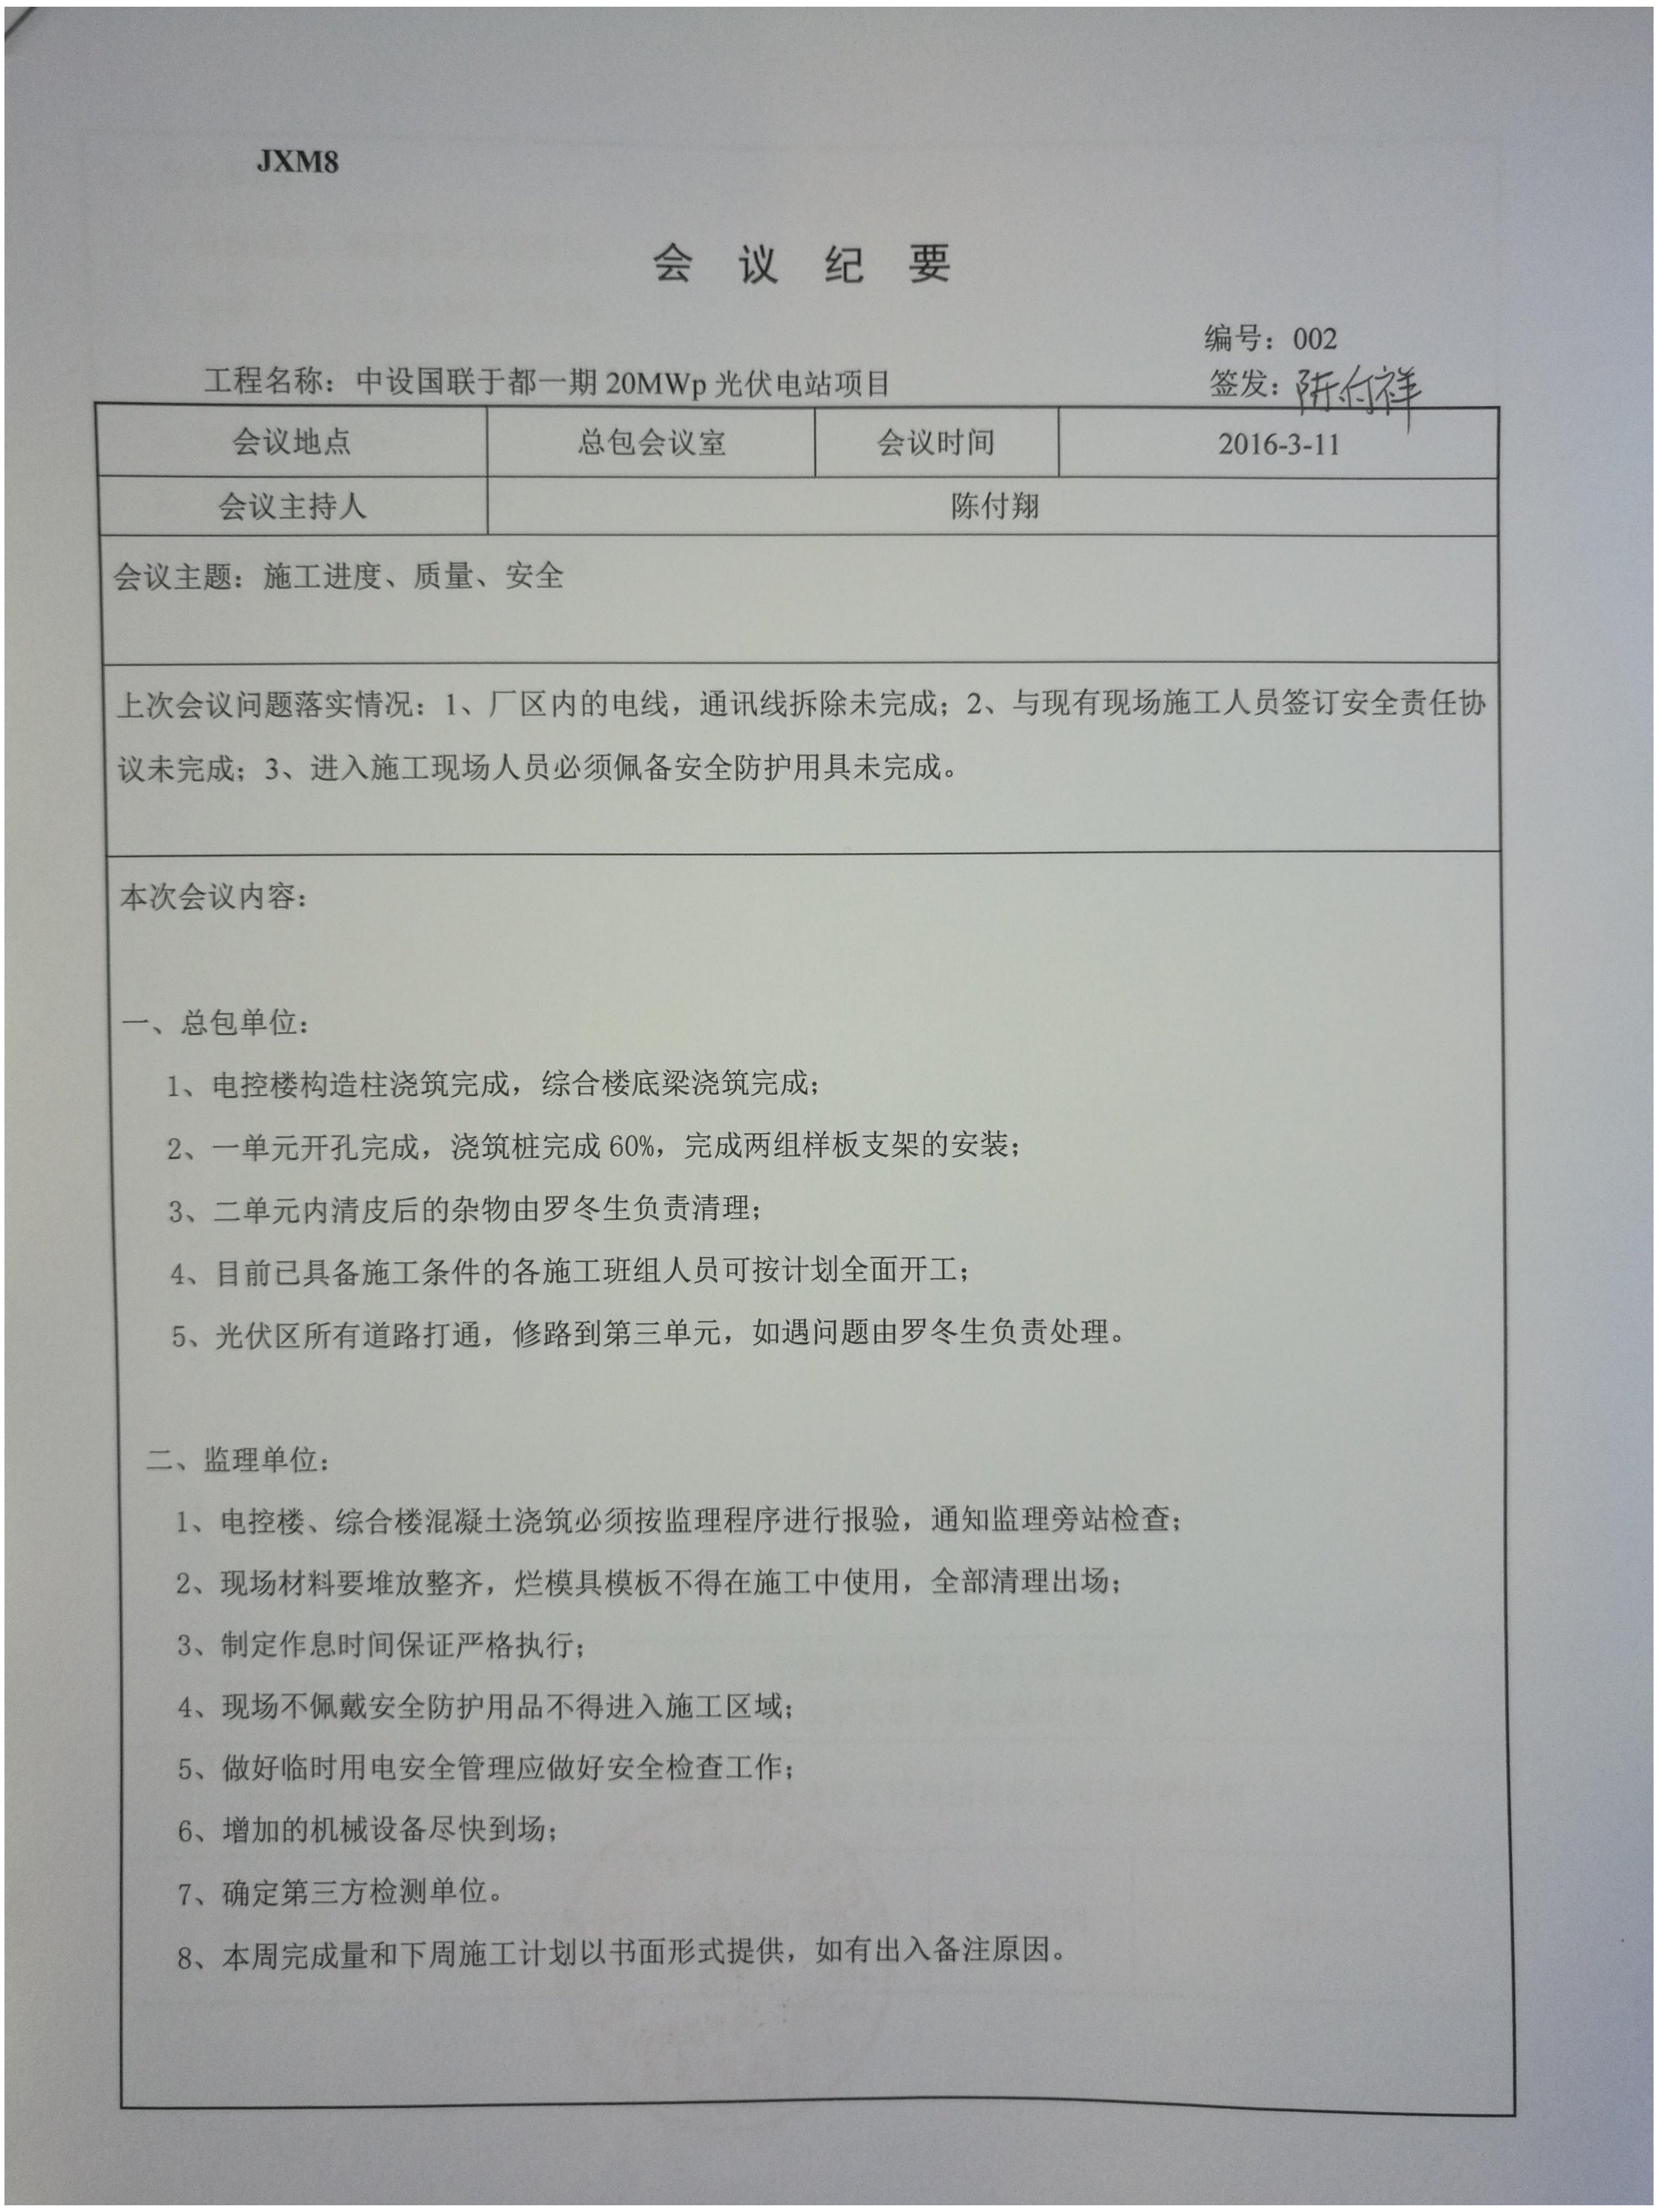

JXM8

会 议 纪 要

编号：002

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目　　签发：陈付祥

会议地点	总包会议室	会议时间	2016-3-11
会议主持人	陈付翔		

会议主题：施工进度、质量、安全

上次会议问题落实情况：1、厂区内的电线，通讯线拆除未完成；2、与现有现场施工人员签订安全责任协议未完成；3、进入施工现场人员必须佩备安全防护用具未完成。

本次会议内容：

一、总包单位：

1、电控楼构造柱浇筑完成，综合楼底梁浇筑完成；

2、一单元开孔完成，浇筑桩完成 60%，完成两组样板支架的安装；

3、二单元内清皮后的杂物由罗冬生负责清理；

4、目前已具备施工条件的各施工班组人员可按计划全面开工；

5、光伏区所有道路打通，修路到第三单元，如遇问题由罗冬生负责处理。

二、监理单位：

1、电控楼、综合楼混凝土浇筑必须按监理程序进行报验，通知监理旁站检查；

2、现场材料要堆放整齐，烂模具模板不得在施工中使用，全部清理出场；

3、制定作息时间保证严格执行；

4、现场不佩戴安全防护用品不得进入施工区域；

5、做好临时用电安全管理应做好安全检查工作；

6、增加的机械设备尽快到场；

7、确定第三方检测单位。

8、本周完成量和下周施工计划以书面形式提供，如有出入备注原因。

三、建设单位：

1、确保进度，做好形象工程建设；

2、提供 1、2、3 单元的交工日期；

3、电控楼、综合楼要确保按期交工；

4、做好安全工作；

5、做好设备材料供应工作；

6、电力质检材料要提前着手准备。

主送单位	于都中设国联于都工程项目部 西安大唐于都工程项目部		
抄送	江苏华能建设工程集团有限公司于都项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-3-11

中设国联于都一期20mw光伏电站项目
监理项目部

第二期监理会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
申鹏鹏	正衡公司	专工	18937230756
蒋开伟	江苏华能		18252256299
汪波	江苏华能		13915877908
王建春	西安大唐		18700945386
高兴东	钻孔机		15131420613
罗文生			13763963688
王志明	木工		13814347970
陈伟祥	正衡监理		13646116461
许耀春	正衡监理		15297933838
赵飞	西安大唐		13757909091
翁浩	西安大唐		
[illegible]	中设国联		
