上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶600kwp分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量		
土建工程	支架基础	工程总量	1072个	监理工作情况	施工人员7人，安全防护措施到位。进行C栋楼及配电房基础浇筑作业，施工人员天泵区域设置警戒线，现场厂家安保人员协调管理厂家内部人员。施工前对模板及钢筋笼进行全面检查，确认无误后进行施工单位浇筑作业，预埋件安放作业要求施工人员不得偏差较大，务必能够保证与立柱顺利对接且外观质量合格。对施工不合格预埋件基础监理方及时发现及时更换并要求施工单位不得再次施工变形、不合格预埋件。
		完成情况	100%		
	配电房基础施工	工程总量	100%		
		完成情况	100%		
电气工程	支架安装	工程总量	536组	施工情况	施工人员7人，完成C栋楼及配电房屋面基础浇筑作业。进行收光抹面、保养作业。
		完成情况	20%		
	组件安装	工程总量	2332块		
		完成情况			
	汇流箱安装	工程总量	6台		
		完成情况			
	逆变器安装	工程总量	18台		
		完成情况			
	电气设备安装	工作总量	100%		
		完成情况	100%		
	接地装置施工	工程总量	100%	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
		完成情况			
	桥架施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	电缆施工	工程总量	100%		
		完成情况			
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
	编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司			编辑人：邓伟	日期：2017-04-13

材料、设备	厂家	型号	类型	数量
组件	晶澳	270Wp	多晶	2332块
逆变器	台达	30KW	组串式	18台
汇流箱	台达		组串式	6台

参建单位：	
建设单位	远景能源（南京）软件技术有限公司
	上海台能新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	上海历挚机电设备有限公司
施工单位	上海南电工程安装有限公司

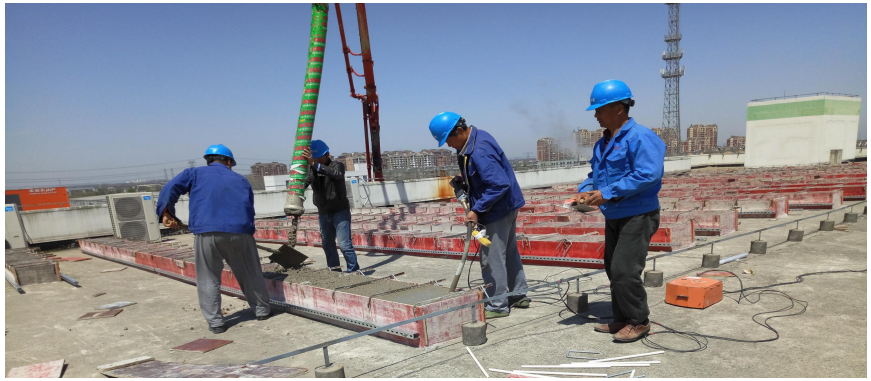

基础浇筑
