监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 27 日　　天气：多云

星期：星期四　　气温：14°~22° c

工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理检查。 2、1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成监理检查。 3、1 支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位 1826 个，总计完成 54.8%监理检查。 4、柱墩吊装至屋面，1#、2#厂房吊装完成 1826 个，5#房柱墩吊装完成 174 个，总计吊装完成 60%监理安全旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能	1、支架基础柱墩混凝土浇筑完成 100%。 2、1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成，安装预计要 2 天。 3、柱墩未运输，总计进场 2294 个，总计进场 70%。 4、1 支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位 1826 个，总计完成 54.8%。 5、柱墩吊装至屋面，1#、2#厂房吊装完成 1826 个，5#房柱墩吊装完成 174 个，总计吊装完成 60%。现场施工人员共计 26 人。
其它事项		
本日现场监理人员	**孟文伟**	
记录人:孟文伟	**总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**	

08:00
2017-04-27 星期四 苏州

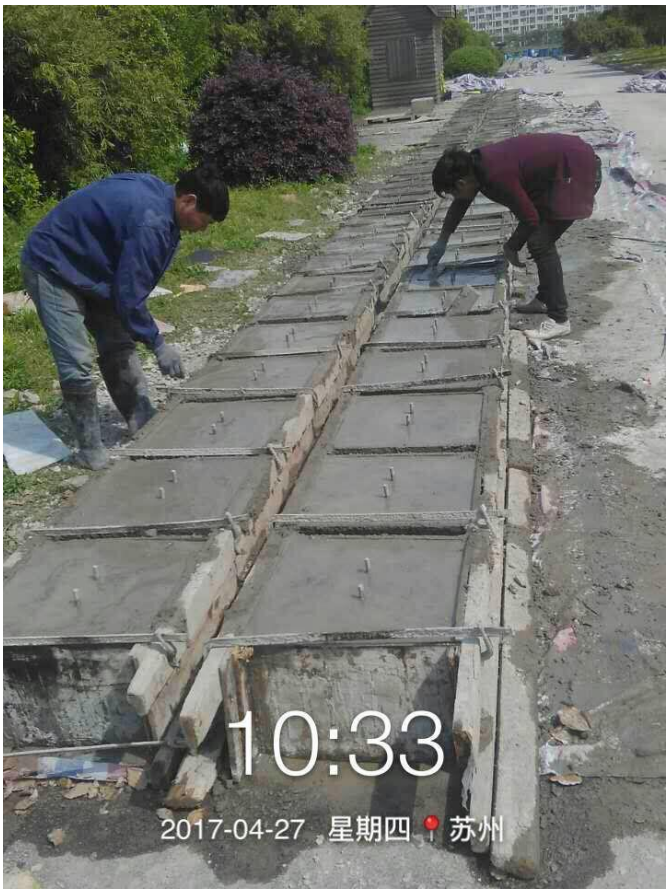
10:33
2017-04-27 星期四 苏州

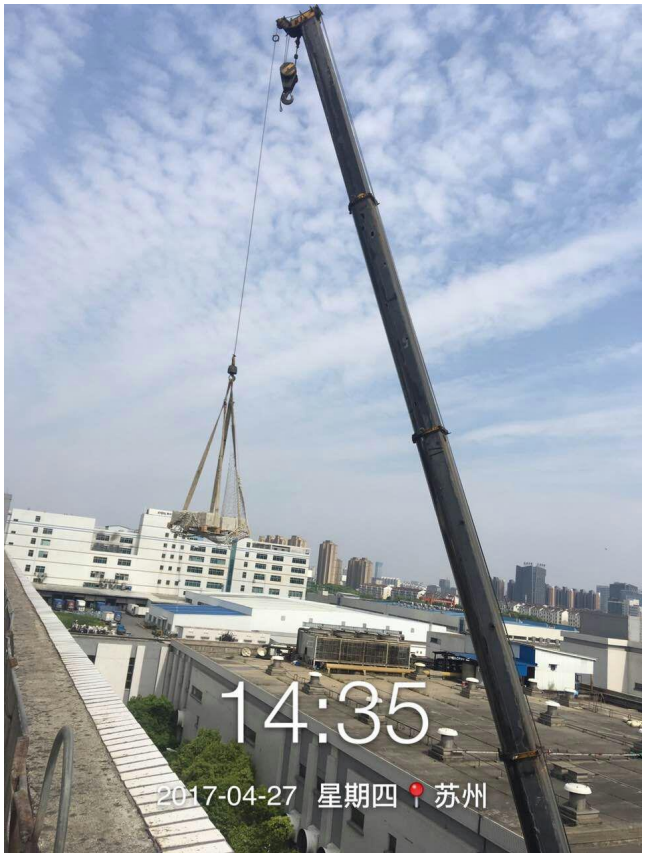
14:35
2017-04-27 星期四 苏州

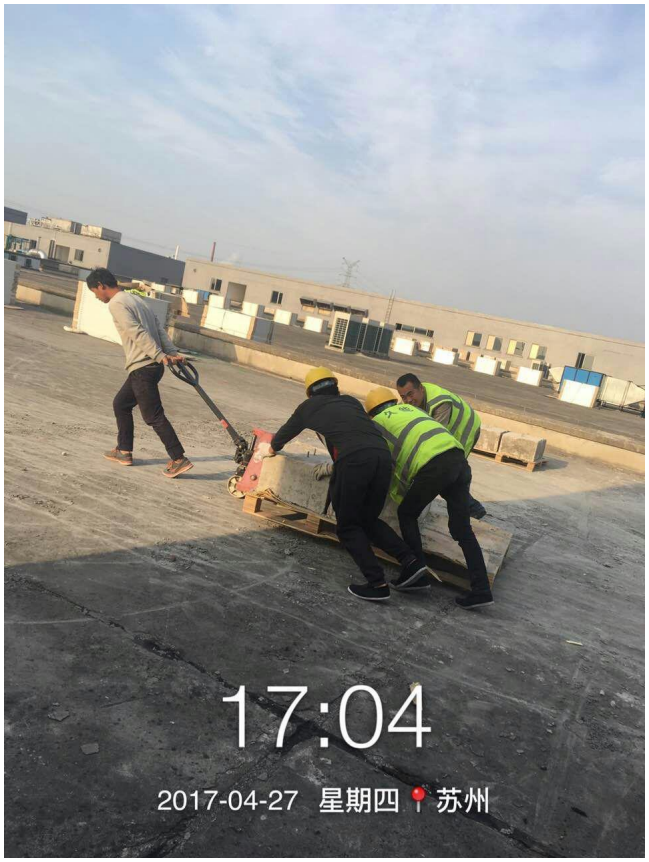
17:04
2017-04-27 星期四 苏州
