监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 05 月 18 日　　天气： 晴

星期： 四　　气温： 21~33°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、巡视压扁胶排车间支架组件安装，再巡视的过程中检查发现一阵列组件呈波浪形，角度超出设计范围。
2、巡视退火车间、料场车间支架和组件安装，支架、组件阵列横平竖直，符合组件安装要求。
3、开关站开挖尺寸:15m×5m×1.4m</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司</td><td>1、1#生产车间屋面组件倾角调整。（共 8 人）
2、压扁胶排车间支架安装完成 7%，累计完成 97%；组件安装块 292，累计完成 1760 块（共 1936 块）。（共 6 人）
3、退火车间支架安装完成 5%，累计完成 5%；组件安装完成 214 块，累计完成 831 块（共 3124 块）。（共 9 人）
4、料场车间支架安装完成 10%，累计完成 60%；组件安装完成 256 块，累计完成 640 块（共 2706 块）。（共 8 人）
5、开关站、SVG 基础开挖。（共 2 人）
6、电缆过路段切割混凝土路面。（共 2 人）</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>夏志兵</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人： 夏志兵</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>

退火车间组件安装

压扁胶排车间组件安装

料场车间组件安装

电缆过路段切割

开关站、SVG基础开挖

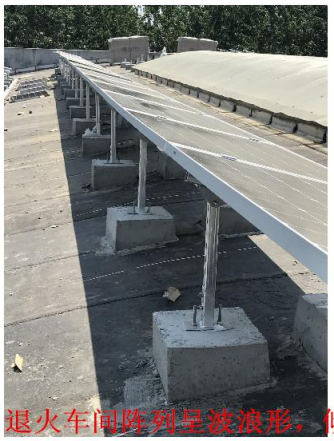

退火车间阵列呈波浪形，倾角超出设计范围
