监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 06 月 28 日　　天气：晴

星期：三　　气温：23~34°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、要求箱变倒送电前，用万用表检查汇流箱到箱变进线电流，线路无障碍（之前已经检查过线路和相序，无错误现象）。
2、旁站箱变合闸，高压侧合闸冲击试验 3 次，均运行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司</td><td>1、运维人员在开关站后台指挥箱变厂家技术人员安全合闸，二次设备厂家配合。（3 人）
2、箱变厂家技术人员到场进行#1、#2、#3 箱变合闸，并网发电。（1 人）
3、箱变厂家技术人员完成箱变调试。（1 人）</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">原定于 2017 年 06 月 29 日箱变倒送电，总包单位临时接到供电公司通知，同意在 2017 年 06 月 28 日上午 10:00 到 11:00 进行箱变倒送电及并网发电试运行，具体正常并网发电时间还是按照原计划 2017 年 06 月 29 日进行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>夏志兵</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人： 夏志兵</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>

箱变技术人员高压侧合闸

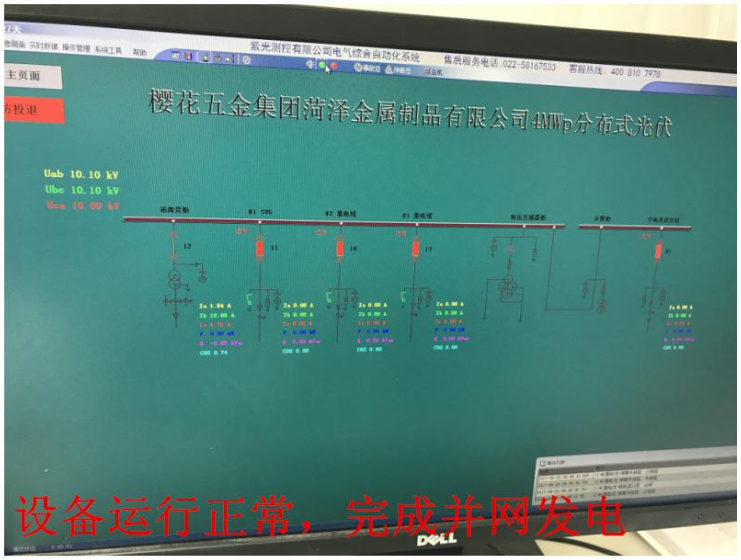

设备运行正常，完成并网发电
