监理日志

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-063

2018 年 6 月 3 日	天气：多云	气温 18℃/24℃

施工人员：

现场施工人员 7 人

施工机械：

无机械施工

施工进度：

1、B 区串接线固定绑扎完成 60%；逆变器进线接线完成 40%。

2、B 区至 C 区大电缆屋面桥接固定消缺；

3、安装大电缆桥架盖板。

4、C 区公母头制作及连接线串接完成 90%，串接线固定绑扎完成 50%；

5、D 区清理灰渣及分类整理托盘和纸箱等。

施工存在问题：

经我监理方人员巡视发现，在潮湿地面放置的产生回路的光伏板串接线头有部分出现放电现象。

监理方处理措施及意见：

上述情况我监理方告知业主及施工方施工人员，串接线头应悬空放置在干燥地点，安全施工。
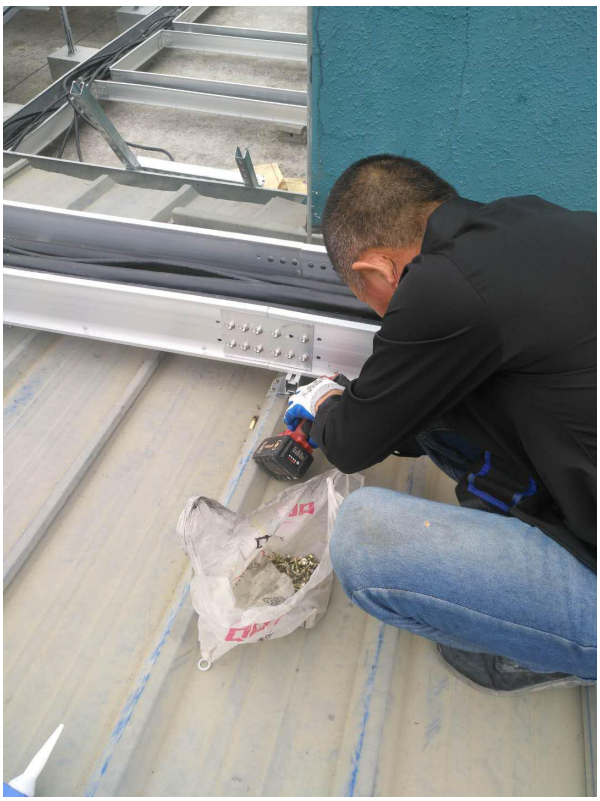
（注：下附施工现场照片）
