监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 04 月 09 日 **天气：** 晴 **星 期：** 五 **气 温：** 8～18℃

工程名称： 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、监督落实早晚班会、防疫工作；
2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况：基本正常；
3、检查钢构檩条情况：檩托板、钢架梁、系杆螺栓连接缝隙较大、螺杆露丝过短、未拧紧。未及时整改。
4、检查电气安装情况：无
5、检查组件安装情况：个别组件安装前后间距不均，安装不正，整体不直，螺栓未紧到位
6、安全（危险）因素：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害
7、存在问题：
1）组件安装高处作业安全带系扣位置不正确，已整改
2）组件传递高处作业人员站位存在安全隐患，不得借助非人工升降设备上下施工作业面
3）场地用电源线过路无防护措施，任意拉拽，未整改
4）脚手架作业移动时人员未安全撤离逗留在脚手架上，已整改
5）高处作业时脚手架底脚未固定锁死，已整改
6）叉车作业停留时驾驶员离开，已整改
7）西区设备处电箱接线不规范，带电导体外露，未整改
8）一只移动电源箱无进线漏保，且一闸多用，不符合使用及规范要求，已要求停止使用
8、材料/设备到货情况：组件到货 28 箱，1064 块
9、材料/设备检查情况：组件开箱整体包装完好，无破损，组件无损坏，出厂证明文件齐全
10、材料/设备供应情况：组件供应不足，檩条缺货
11、总体施工进度情况：进度有滞后偏差。应增加作业班组，加快材料进场，同步施工作业。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>承包单位</td><td>施 工 内 容 及 进 度</td></tr>
<tr><td>浙江慈农电力发展有限公司</td><td>钢结构安装已全部完成；檩条安装约 2 方阵，已完成约 33 方阵（50 方阵）。组件安装 402 块，共完成 1974 块（本期 19950 块 6.2643MW）。

今日施工：檩条安装、改装打孔；组件安装。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 26 人
明日工作：檩条安装、错孔开孔；组件安装；
其它方面：安悦一位领导到场检查</td></tr>
<tr><td>本场监理人员</td><td colspan="2">李松远</td></tr>
</table>

李松远

记录人：	总监理工程师：
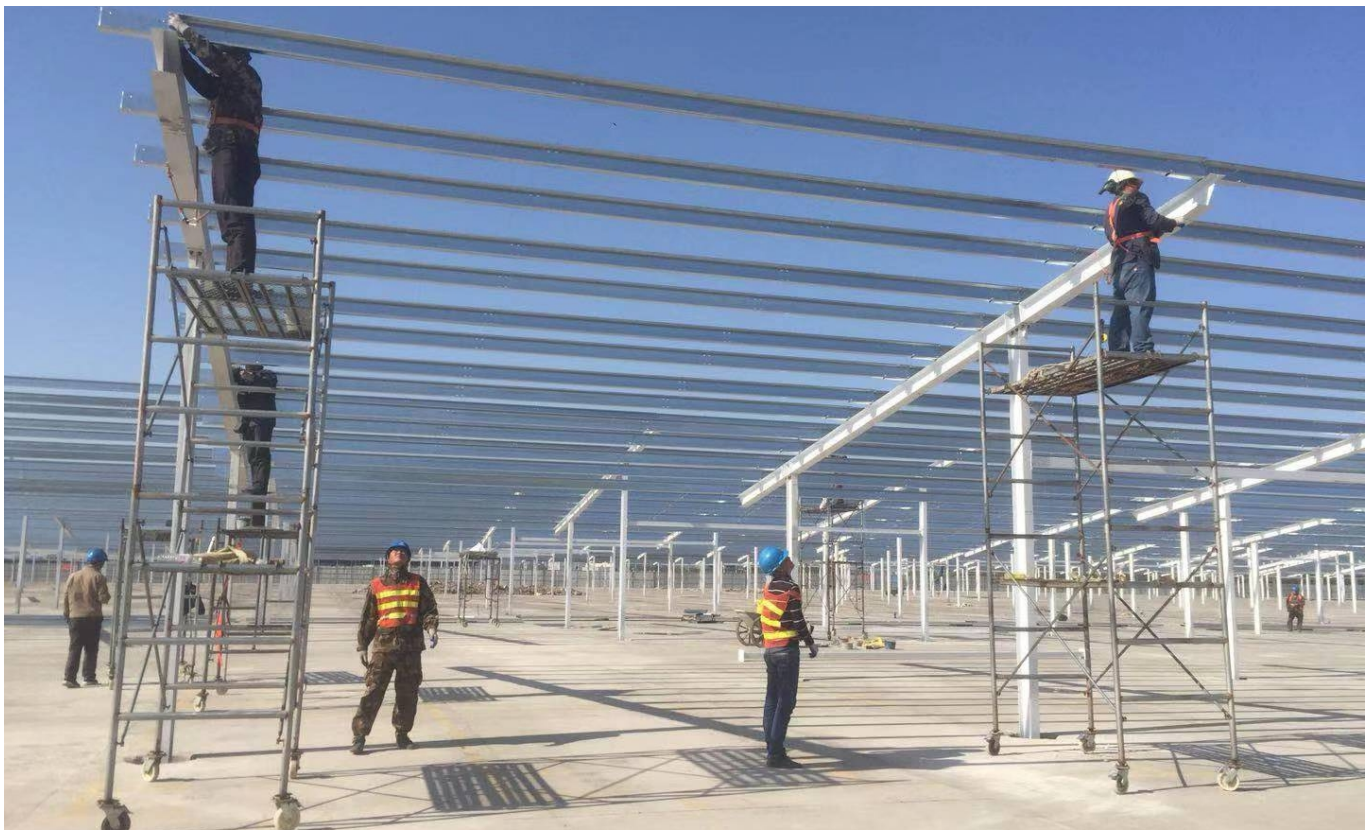
现场照片
