监 理 日 记（ ）

日期：2021年08月31日　天气：晴　星 期：二　气 温：24～34℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期17.29MW分布式光伏电站项目

监理工作情况

1、督促落实班会及防疫工作

2、高温安全施工情况：高温作业,按高温作息时间施工，场地防暑降温用品配备齐全。

3、安全文明施工情况：机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。

4、电气施工情况：无。

5、钢结构施工情况：已完工。

6、组件安装情况：已完工。

7、电缆施工情况：2*120㎜^{2} 2548米直流电缆已敷设完毕，等待余下电缆到货。电缆敷设工艺和电电缆头制作工艺基本可控，弯曲半径大于15D，符合要求。对于管口转角处要做好防止电缆皮割破的防护措施。

8、其它施工情况：钢结构问题整改。

9、安全（危险）因素：高处坠落、机械伤害、物体打击，触电，孔洞掉落。

10、施工危险点：电缆敷设，登高作业组件电缆插接头制件。

11、存在问题：

（1）电缆敷设打开的沟盖处应设安全警示标识，以防掉落；已恢复

（2）组件插接头接线登高作业人员未第安全带，已整改

（3）一名人员安全帽未佩戴，已整改

（4）场地清理不到位。

12、材料/设备到货情况：直流2*120电缆已用完。

13、材料/设备检查情况：无。

施工情况

承包单位	施 工 内 容 及 进 度
浙江慈农电力发展有限公司	**三区进度完成情况**：钢结构安装已完工，檩条安装已完工 ，组件安装已完工；汇流箱安装已完工；组件及汇流箱电缆接线完成22%；照明施工完成83%，2*120低压直流电缆敷设完成34%。**今日施工**：2*120直流电缆敷设，组件插接头电缆制作，汇流箱接线，反光胶条粘贴，照明电缆敷设，直流电缆头制作，钢结构整改。

其它事项

施工人员投入：电气13人，钢结构整改6人

机械设备投入：登高作业车3台，电缆放线架1个，叉车1台

明日工作：电缆敷设、电缆头电缆制作，汇流箱接线，钢结构整改。

其它方面：无。

本场监理人员	
记录人：	总监理工程师：

现场照片

汇流箱接线	电缆敷设转角处
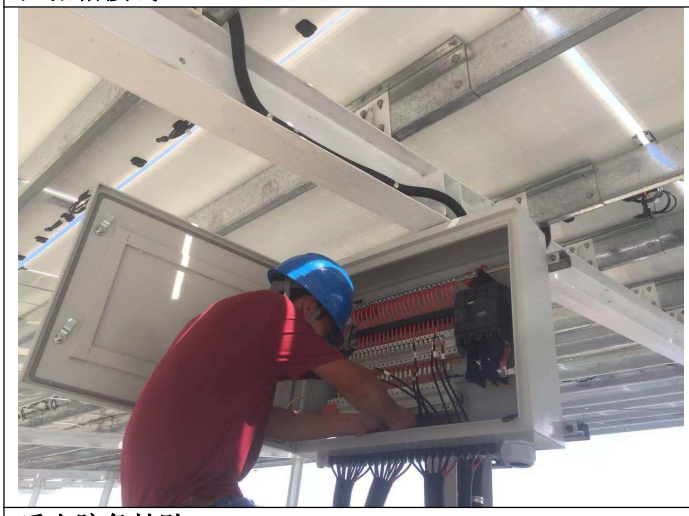	
反光胶条粘贴	组件电缆接线
	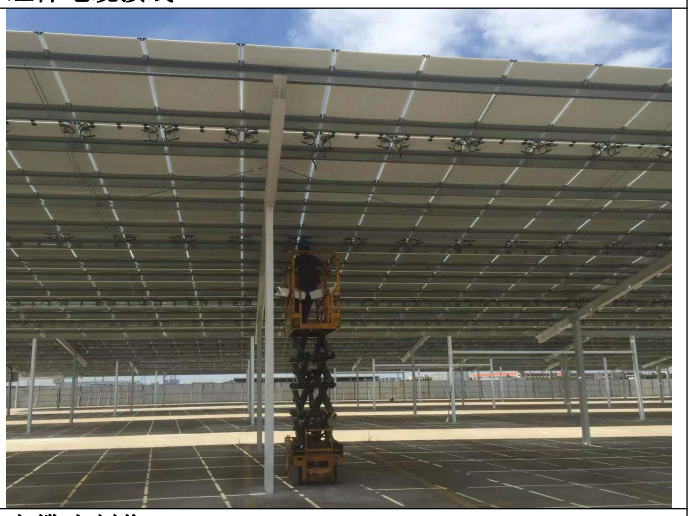
照明电缆敷设	电缆头制作
