苏垦麦芽1.56MW工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020年10月20日　　星期二　多云 12-20℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人26人，班组长1人，项目部2人。

2、宿舍楼前过路电缆沟混凝土路面抹面收光、养护。

3、彩钢瓦仓库屋面导轨安装。

4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。

5、彩钢瓦仓库屋面锈点补漆。

6、彩钢瓦仓库屋面检修通道开始安装。

7、组件检测。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

组件厂家来项目现场进行组件开箱、搬运、安装等的技术交底。监理发联系单要求项目部根据厂家技术交底文件做好对施工班组的书面技术交底工作。

发监理联系单要求将屋面待检测的整箱组件立即散开，避免在屋面形成集中荷载。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固1180根檩条：累计完成1141根，完成97%。

屋面围栏共500米，今日完成120米，累计完成500米，已全部完成。
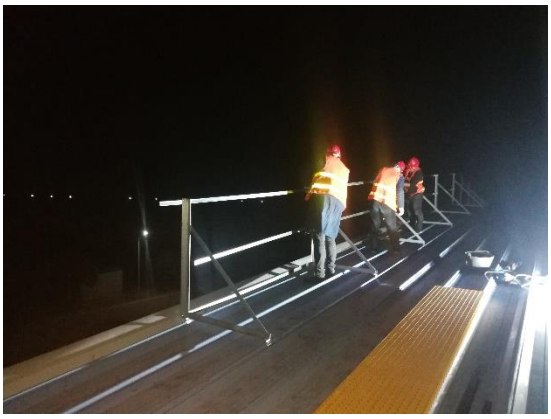
彩钢瓦仓库屋面夹支架导轨安装50组，累计完成120组，完成63%。
