监理日报

2021 年 12 月 04 日　　星期六 多云 -1-14℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、3*240 低压交流电缆放线敷设完成 3 根，共需要敷设 8 根，累计敷设完成 8 根，累计完成 100%；

施工人员 8 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 2 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织电缆敷设人员安全技术交底，包括卷扬机使用注意事项，现场临时用电安全，电缆沟内有厂区原有电缆，放线时注意避免剐蹭，以免造成损坏，目前现场安全状况良好；

质量：检查低压交流电缆 3*240 敷设情况，目前 8 根电缆已全部敷设完毕，检查电缆转角处是否符合电缆转弯半径，敷设时避开厂区电缆沟内原有电缆，转角以及进入管道处做好安全防护，专人进行监护，情况不对时及时停止作业，避免电缆绝缘层受损，目前已敷设 8 根电缆，暂时未发现有破损现象；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；明日逆变器开箱安装，电缆头制作安装；

电缆沟至并网柜电缆敷设	交流电缆敷设
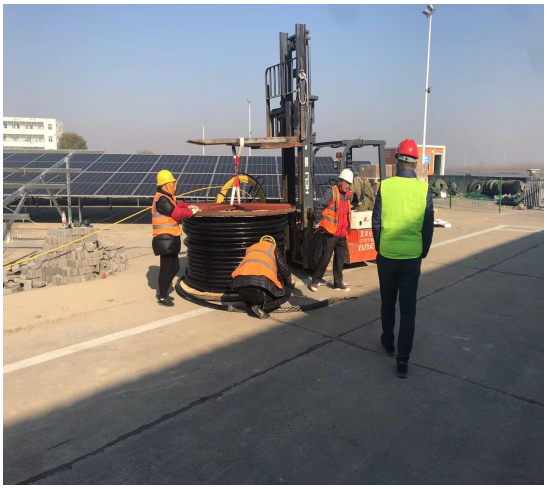
电缆转角敷设	电缆转角敷设
电缆敷设检查	电缆敷设至配电室
电缆转角敷设检查	电缆盘吊起
