监理日报

2021 年 12 月 10 日　　星期五 多云 3-14℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、支架地脚螺栓浇筑混凝土保护层 70%；

2、组件与支架间接地线连接完成 100%；

3、逆变器、并网柜通讯线连接安装完成；

4、电缆沟盖板修复整改完成 100%；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对混凝土保护层浇筑施工人员安全技术交底，检查现场施工人员安全帽以及反光服佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：支架地脚螺栓逐个检查验收，目前已验收 100%，截止到目前发现脱落松动的地脚螺栓已全部使用记号笔标注在立柱，要求施工人员整改，整改完成后复验合格，才能浇筑混凝土保护层。

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；

地脚螺栓检查验收	电缆保护管捆扎

	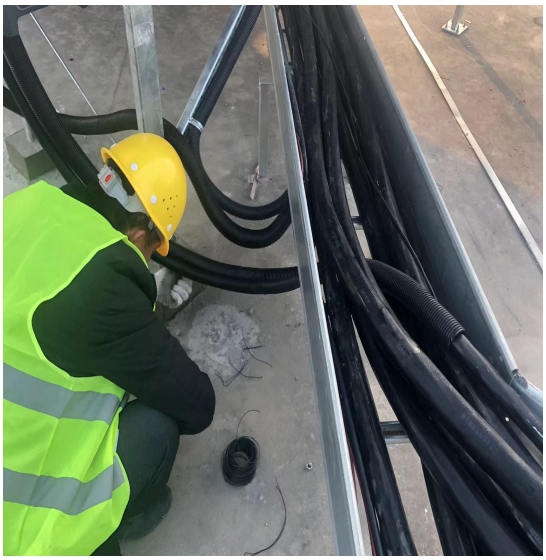
逆变器通讯线连接安装	组件与支架接地连接
电缆沟盖板浇筑	光伏区概况照片
