日报

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目		日期	2022.11.03		
天气	晴	风力	1 级	温度	15-25℃
今日作业情况	1、施工人数 条基模板安装 6 人，条基钢筋绑扎 1 人，电气施工 20 人，条基调整 4 人。 2、施工机械 随车吊 1 台 3、今日完成工作： 1.条基模板安装 100 米； 2.组件吊装 400 块。				
明日工作计划	由于株洲疫情防控紧张，明日暂无施工计划。				
到货累计数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。				
今日监理工作情况	1. 监理安全旁站条基吊装，要求施工单位安全员及时就位，吊装区域周围拉上安全警戒线。 2. 监理安全旁站组件吊装。				
其他事项或协调问题					

本日现场监理人员：

记录人：

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件准备吊装	吊装组件
照片	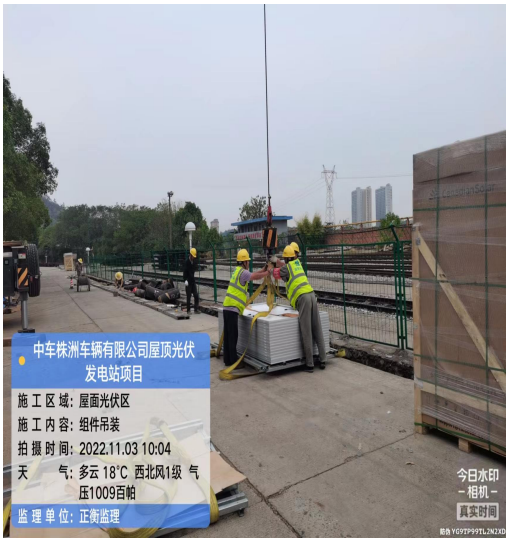	
文字描述	条基模板制作安装	组件安装
照片		
