监　理　日　志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目24.5MW光伏发电项目

<table>
<tr><td>日期</td><td colspan="2">2025年04月10日星期四</td><td>气候</td><td>多云</td><td>气温</td><td>22-26℃</td></tr>
<tr><td colspan="4">监理人员 动态：2人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求</td><td colspan="3" rowspan="3">材料进场:
无</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工方人员动态：主要管理人员:4人,施工员:6人,全站仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工机械动态：挖机1台、打桩机1台、1104型拖拉机1台、3吨叉车一台，满足施工现场要求。</td></tr>
<tr><td>施工部位进度情况</td><td colspan="6">1、钢平台焊接，3号地4平方线3200米，新增地块支架+5号地8，新增地块支架+5号地336，高压顶管拉管80米。</td></tr>
<tr><td>监理今日工作内容</td><td colspan="6">1、巡视检查钢平台焊接，3号地4平方线，新增地块支架+5号地，新增地块支架+5号地，高压顶管拉管。
2、在宿舍整理资料。
3、填写监理日记。
4、基础开挖及浇筑均已完成。组塔情况：组塔完成16.3基，分别为：G1#、G2#、G7#的80%、G8#、G9#、G10#、G11#、G14#、G15#、G16#、G17#、G19#、G20#、G28#，今日完成：G12#剩余的40%此基塔安装已完成，G21#剩余的60%此基塔安装已完成，G22#安装已完成50%。</td></tr>
<tr><td>检查发现问题及处理措施</td><td colspan="6">未见异常情况</td></tr>
<tr><td>协调内容或其他</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>记录人</td><td colspan="2">[illegible]</td><td>总监签阅</td><td colspan="3">[illegible]</td></tr>
</table>

监理巡查光伏区二号地块组件安装	监理巡查光伏区三号地块箱逆变一体机平台加工围栏
	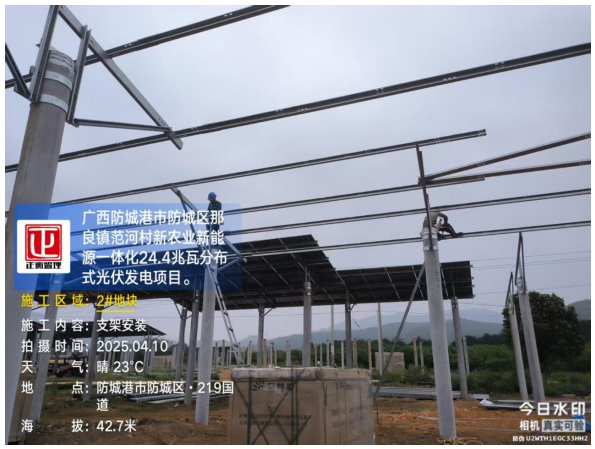
监理巡查外线 G2 外线塔材支架组装	监理巡查光伏区二号地块支架安装
	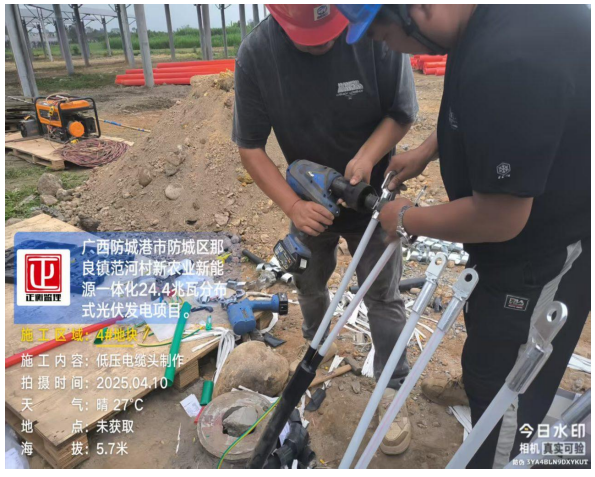
监理巡查光伏区四号地块低压电缆头制作	监理巡查光伏区四号地块低压电缆头制作

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>监理巡查外线 G28 过道顶管</td><td>监理巡查外线 G12 开始组塔</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">监理巡查 G28 外线电缆井开挖</td></tr>
</table>
