正衡监理

编号：JL-03

# 监　理　月　报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2018 年 11 月　第 20 期

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 11 月 30 日

# 监　理　月　报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目　11 月　第 20 次　月报开始时间 2018 年 11 月 01 日　结束日期 2018 年 11 月 30 日　监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 | | 影像 | | |

## 一、　监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|---|---|---|---|
| 进度 | | 44 亩场区本月已并网发电<br><br>支架安装 | 44 亩地支架、组件安装完成。电气施工完成、并网发电。竣工验收。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br> <br>浇 | 组件安装<br><br>高压电缆回填 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 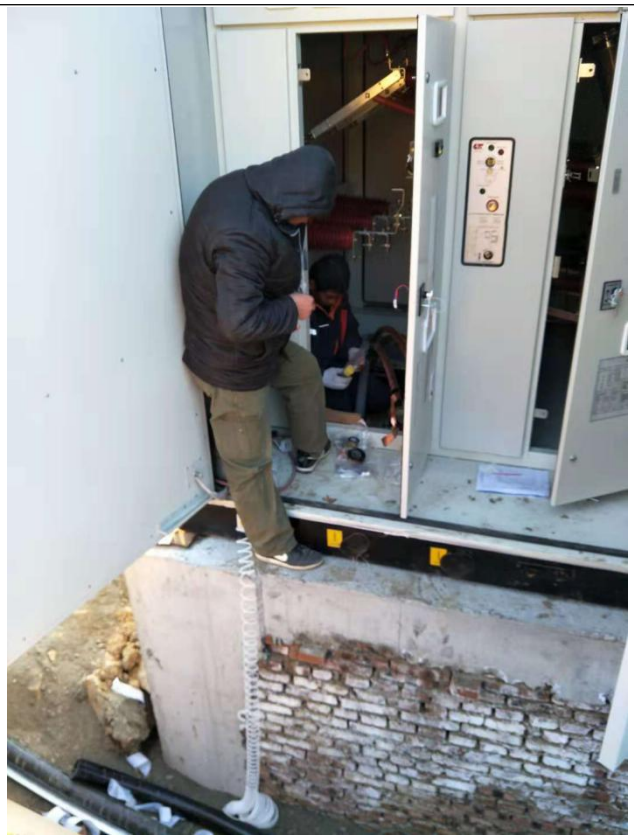 | 高压电缆终端头制作 | |
| | | 高压电缆耐压试验 | |
| | | 低压电缆制作安装 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 设备交付进度 | 无 | |
| | 设计交付进度 | 光伏区图纸完成 | 44 亩地光伏区图纸完成 |
| | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| | 施工图会审 | 结束 | |
| | 设计交底 | 完成 | |
| | 方案审查 | 完成 | 督促施工单位报审其他资料 |
| | 技术交底 | 完成 | |
| | 设计变更 | 无 | |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| | 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| | 安全措施落实情况 | 已认真落实 | 随时监督抽查施工单位落实情况 |
| | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 支架、组件安装、电气安装、符合标准 | 主要工序质量在可控范围之内（部分不符合要求的在发出通知单后能及时整改） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 主要原材料质量 | 无 | |
| | 构（配）件质量 | 无 | |
| | 设备质量 | 无 | |
| | 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
| | 款项支付情况 | | / |
| | 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订 | / |
| | 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |
| | | | |

## 二、 本月进度情况

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 亩地（以并网发电） | | | | | | | | |
| 1 | 箱变基础 | | | | | | | |
| 2 | 现场消缺 | | | | | 95% | | |
| 3 | 剩余土地场坪完成 | | | | | | | |
| 4 | 引孔 | | | | | | | |
| 5 | 灌桩 | | | | | | | |
| 6 | 支架安装 | | | | | | | |
| 7 | 组件安装 | | | | | | | |

## 三、 下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 亩地施工 | | | | | | | | |
| 1 | 箱变基础 | | | | | | | |
| 2 | 电缆沟 | | | | | | 90% | |
| 3 | 逆变器、汇流箱 | | | | | | 100% | |
| 4 | 引孔 | | | | | | 100% | |
| 5 | 灌桩 | | | | | | 100% | |
| 6 | 支架安装 | | | | | | 95% | |
| 7 | 组件安装 | | | | | | 90% | |

## 四、 安全文明施工情况

| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | | | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | | | 1 | / | / | / |

## 五、 施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|---|---|---|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作 | 剩余 44 亩地土地、支架安装、组件安装、电气全部完成。已完成安装部分全部并网。 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 认真做好剩余土地安装的安全工作。 |
| 质量管理 | 做好材料的进场预验收；督促施工单位质 | 提高施工人员自身素质，加强施工过程质量控制 |

| | | |
|---|---|---|
| | 量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 认真做好消缺工作，不遗漏。加强施工过程中的技术控制。 |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | |

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10mw项目监理项目部

2018年11月30日
