正衡监理

编号：ZHJL-YB-20191225

监 理 月 报

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

2019 年 12 月 第 07 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：徐耀生

报告日期：2019 年 12 月 26 日

监 理 月 报

工程名称：赫章县大山坪风电场项目　　月次 第 7 次

月报开始时间 2019 年 11 月 27 日 结束日期 2019 年 12 月 26 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	赫章县大山坪风电场项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度	 	①升压站围墙砌筑完成50%；升压站挡土墙开挖完成、西侧挡土墙砌筑完成、东侧、北侧挡土墙砌筑完成80%；升压站室外电缆沟开挖完成、砌筑完成、混凝土浇筑完成；升压站消防水池基础开挖完成；主变油池砌筑完成、抹灰完成；防火墙框架柱混凝土浇筑完成、拆模完成；②综合配电楼墙体砌筑完成、抹灰完成、第二遍刮腻子完成、地面防水完成、垫层抹平完成、窗户安装完；35KV开关柜室、继保室照明线管敷设完成、配电柜铜排安装完成；继保室盘柜支架加工安装完成、继保室预埋件安装完成；GIS室内接地扁铁焊接完成；③SVG室	①挡土墙砌筑完成；升压站围墙砌筑完成生；消防水池基础浇筑完成；升压站给排水系统完成；升压站接地网焊接完成；升压站道路换填浇筑完成；站用变安装完成；升压站室内照明系统安装完成。②生活楼室内地砖铺设完成、墙砖铺设完成、生活楼踢脚线铺设完成。③综合配电楼继保室设备安装完成、GIS室设备安装完成、室内第三次刮刮腻子完成、轴流风

	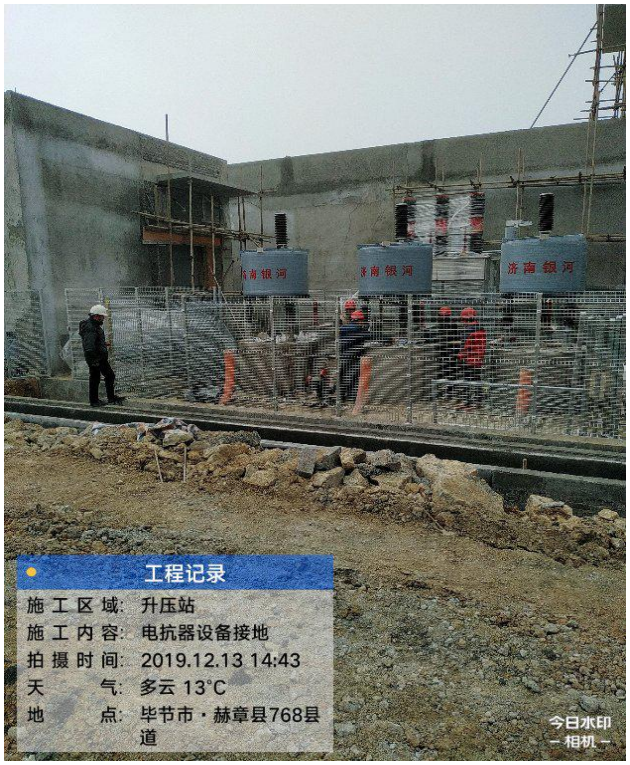 	接地安装完成、无功补偿装置安装完成、围栏安装完成；④生活楼地面防水完成、地面垫层抹平完成、墙砖、地砖铺设完成65%、屋顶找平完成、窗户安装完成、刮腻子完成、落水管安装完成75%。 风机基础：完成10#、16#、17#、18#风机位基础地质勘查。9#、19#风机位基础地质勘查完成50%。 送出工程：上月共计5基铁塔基础开挖完成、6基铁塔基础浇筑完成，1基塔基测量完成，组塔完成8基；目前累计36基铁塔基础开挖，其中35基铁塔基础开挖完成，浇筑完成34基。 。	机安装完成、主控室静电地板铺设完成。④SVG室内轴流风机安装完成。⑤送出工程：外送工程涉及塔基共计36基，累计完成基础开挖36基，浇筑完成36基，组塔完成36基，同步开展架线作业。
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成

	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	完善
	设计交底	道路基础、风机基础已交底、电气一次图已交底	陆续完成其他工序图纸会审交底
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加安全文明标语标牌
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/

	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	升压站挡土墙开挖完成	2019.12.02	2019.12.07	2019.12.02	2019.12.07	100%		
2	主变油池支模完成	2019.12.02	2019.12.02	2019.12.02	2019.12.02	100%		
3	综合配电楼抹灰完成	2019.12.03	2019.12.14	2019.12.03	2019.12.14	100%		
4	升压站室外电缆沟开挖完成、砌筑完成	2019.12.01	2019.12.10	2019.12.01	2019.12.10	100%		
5	综合配电楼墙体砌筑完成、抹灰完成、第二遍	2019.12.01	2019.12.20	2019.12.01	2019.12.20	100%		

	刮腻子完成、地面防水完成、垫层抹平完成、窗户安装完							
6	SVG室接地安装完成、无功补偿装置安装完成、围栏安装完成	2019.12.01	2019.12.20	2019.12.01	2019.12.20	100%		
7	生活楼地面防水完成、地面垫层抹平完成	2019.12.10	2019.12.20	2019.12.10	2019.12.20	100%		
8	完成10#、16#、17#、18#风机位基础地质勘查	2019.12.01	2019.12.26	2019.12.01	2019.12.26	100%		
9	共计5基铁塔基础开挖完成、6基铁塔基础浇筑完成，1基塔基测量完成，组塔完成8基；目前累计36基铁塔基础开	2019.12.01	2019.12.26	2019.12.01	2019.12.26	50%		

	挖，其中35基铁塔基础开挖完成，浇筑完成34基							
10								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
1	挡土墙砌筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
2	升压站围墙砌筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
3	消防水池基础浇筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
4	升压站给排水系统完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
5	升压站道路换填浇筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
6	综合配电楼继保室设备安装完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
7	GIS室设	2020.01.01	2020.01.30			100%		

	备安装完成							
8	外送工程涉及塔基共计36基，累计完成基础开挖36基，浇筑完成36基，组塔完成36基，同步开展架线作业	2020.01.01	2020.01.30			100%		
9								
10								
11								
12								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2份	70人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，升压站SVG基础砼浇筑完成、避雷针安装，18#风机基础换填。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
