监 理 月 报

工程名称： 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

2024年 11月 第 五 期

（2024 年11月01日 至 2024年11月30日）

项目监理部（章）：

监理工程师：

报告日期：2024年 11月 30日

监 理 月 报

一、安全情况：

1.开工工期130天；安全生产130天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。

2.监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。

3.施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5.对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。

6.施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。

7.组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2份	8人	/	/	/	/

二、本月进度情况：

序号	工作名称	开始时间	完成时间	备注
1	混凝土墩子	2024年7月1日	2024年7月4日	已完成100%
2	支架	2024年7月4日	2024.11.1	已完成100%
3	直流电缆	2024年8月20日	安装中	已完成98.1%
4	组件	2024年7月23日	2024.11.15	已完成100%
5	逆变器	2024年8月14日	安装中	14/17
6	接地扁铁	2024年8月23日	安装中	98.1%
7	桥架	2024年8月23日	安装中	97.5%
8	交流电缆	2024年9月20日	2024.10.10	100%
9	箱变	2024年10月10日	2024.11.1	已完成100%
10	一二次设备	2024年10月15日	2024.11.1	已完成100%

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	组件安装，护栏安装完成100%，逆变器安装，光伏线接线，走道板安装，电缆敷设完成，一二次设备接线。	光伏线放线，桥架安装 接地系统安装，清洗系统安装，监控安装，并网。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。	现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	BIPV组件、支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
造价管理	无	无
物资供应	无	无

四、施工质量问题情况：

1、接地扁铁不符合图纸设计要求已通知总包方更换。

2、桥架电缆过多，需更换桥架。

五、监理工作情况

1、直流电缆敷设巡视。

2、每周安全质量监理检查。

3、日常巡视检查。

4、每周安全质量监理检查。

5、日常巡视检查。

9、监理日志及会议纪要整理。

10、施工报审资料审核。

11、资料完善并上传系统

。七、其他事宜：

1、无。

八、工程形象进度照片

<table>
<tr><td>1.2次舱吊装</td><td>逆变器安装</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>水泥屋面光伏线绑扎</td><td>SVG就位</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>支架安装</td><td>支架验收</td></tr>
</table>

材料检查	南区箱变放线
一分厂电缆沟开挖	电缆沟深度检查
箱变低压侧接线	电缆井砌筑

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>电缆沟铺砂盖砖</td><td>业主巡视现场</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>监理例会</td><td>现场巡视</td></tr>
<tr><td> 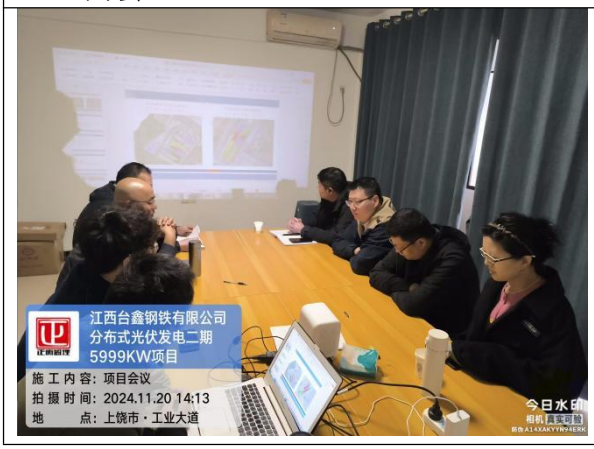
</td><td>
</td></tr>
</table>

常州正衡电力工程监理有限公司

江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

2024 年 11月30日
