GFDZJBM45：施工图会检纪要

施 工 图 会 检 纪 要

编号：CZHJL-001

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

签发：

会议地点	总包项目部	会议时间	2017、2、21
会议主持人	王超伦		

会检图册：综合楼、电控楼基础 01、02、03、04、05、（白图）无编号

本次会议内容：

建设单位：陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

总包单位： 中国新时代国际工程有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：西部抗震岩土工程有限公司

参加人员：王超伦、侯少波、苏康龙、杨杰、王涛、黄泽桐、刘朋

内容：

根据建设单位驻现场代表王超伦的要求：综合楼、电控楼素土挤密桩在图纸会审后，提出以下几点要求：

1、要求分包单位提供素土挤密桩施工方案。

2、做好挤密桩的测量、放线的施工记录，监理跟踪复测。

3、尽快提供挤密桩第三方检测单位的资质和检测标准报建设单位、监理单位进行审核。

4、要求总包单位进一步做好进场施工人员的三级教育培训工作。

5、交底过程中四方单位已确认图纸符合施工条件，要求施工单位安图施工。

最终建设单位项目代表指出，各单位有无合理化的建议有助于工程

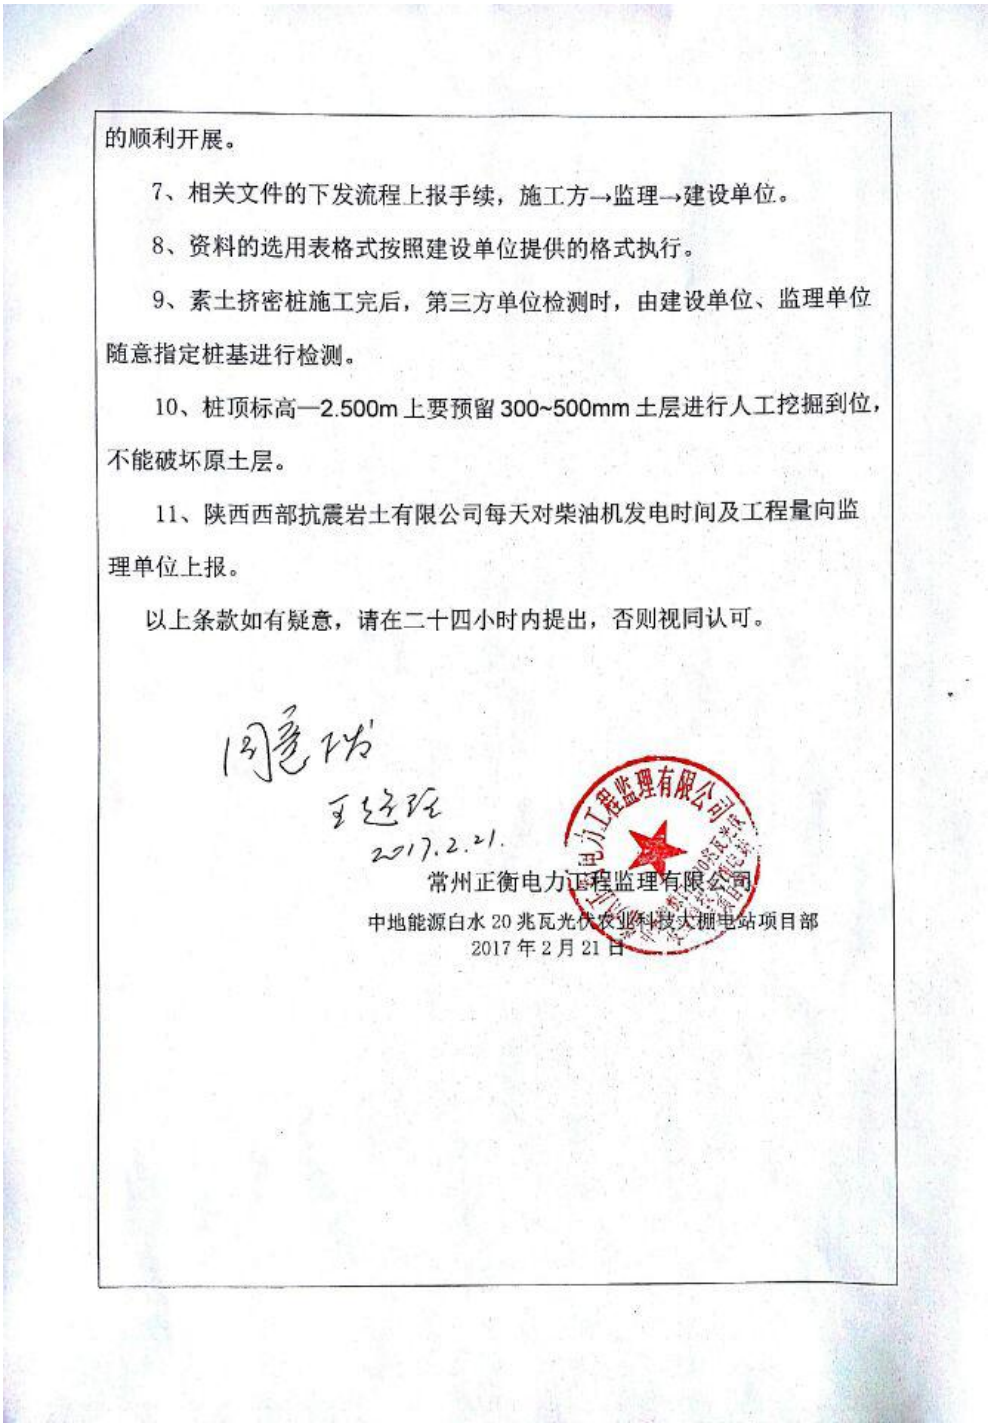

的顺利开展。

7、相关文件的下发流程上报手续，施工方→监理→建设单位。

8、资料的选用表格式按照建设单位提供的格式执行。

9、素土挤密桩施工完后，第三方单位检测时，由建设单位、监理单位随意指定桩基进行检测。

10、桩顶标高—2.500m 上要预留 300~500mm 土层进行人工挖掘到位，不能破坏原土层。

11、陕西西部抗震岩土有限公司每天对柴油机发电时间及工程量向监理单位上报。

以上条款如有疑意，请在二十四小时内提出，否则视同认可。

2017.2.21.

常州正衡电力工程监理有限公司

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目部

2017 年 2 月 21 日

注　会检纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后执行。
