上海电力新能源光伏项目工程建设周报

2016 年 2 期

项目：北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目	填报周期：2016 年 10 月 01 日--10 月 07 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、进场道路共计（0.7）公里，已完成（0）公里，完成总量（0）%。场内道路共计（5.11）公里，已完成（0）公里，完成总量（0）%。

2、基础条基/桩基共计（32244）个/根，完成（188 ）个，完成总量（0.58 ）%；

3、支架安装完成（0）MWp，完成总量（0）%；

4、组件安装完成（0）MWp，完成总量（0 ）%

5、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%；汇流箱安装（560）台，完成总量的（0）%

6、场内集电线路共计（5.5）公里，电缆沟开挖（0）公里， 完成总量（0）%；高压电缆敷设完成（5.5）公里，完成总量（0）%。

7、升压站土建

（1）综合楼：综合楼基础开挖完成，填充墙完成 0%；

（2）配电室：配电室基础完成，室内电缆沟完成 0%，填充墙砌筑完成 0%；

（3）SVG 小室：完成 0%；

8、升压站一次设备安装已完成（0）%、二次设备安装已完成（0）%；没有开始调试；

9、送出线路共计（6.4）公里，建设塔基总计（18）基，基础浇筑完成（0）基， 完成总量（0）%，杆塔组立完成（0）%，架线完成总量（0）%；

10、升压站原计划反送电时间：（2016 年 12 月 20 日），按建设进度计划时间（2016 年　月　日）

11、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	未施工
2、开关站/升压站	配电室基础开挖完成，垫层浇筑完成，基础模板完成，基础承台钢筋绑扎完成 83%。
3、综合楼/附属建筑	综合楼基础开挖。
4、场内桩基施工	打桩 188 根。
5、支架及组件安装	未开始。
6、逆变器及箱变	未开始。

7、送出工程（含对侧）	未开始。			
8、现场调试				
9、出图情况	图纸不全			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	支架	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	组件	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	逆变器	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	箱变	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	主变/开关	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	二次设备	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	电缆设备	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
	外线设备	**月**日--**年**日	**月**日--**年**日	
11、人员/机械情况	本周监理人员（3）人、场内施工土建（30）人、安装（0）人、外线施工（0）人 铲车（3）台，打桩机（1）台，搅拌机1台，钢筋调直机1台，电焊机1台，钢筋切断机1台。			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、打桩	2016年10月08日	2016年10月05日		
2、首套组件安装	2016年10月28日			
3、线路倒送电	2016年			

	12 月 15 日			
4、首个发电单元并网	2016 年 12 月 16 日			
5、全容量并网	2016 年 12 月 30 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	进场道路协调，场平协调。			
未解决的协调问题解决进展	正在协调			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	督促施工单位抓紧时间修路。			
2、综合楼工程	督促基础开挖，加强安全管理。			
3、升压站及开关站工程	督促基础开挖完成，抓紧支模和钢筋编扎，加强安全管理。			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	对外线铁塔基础抓紧协调			
7、其他				

填报人：张荣建 审核人：李维军 时间：2016 年 10 月 07 日

工程现场照片：

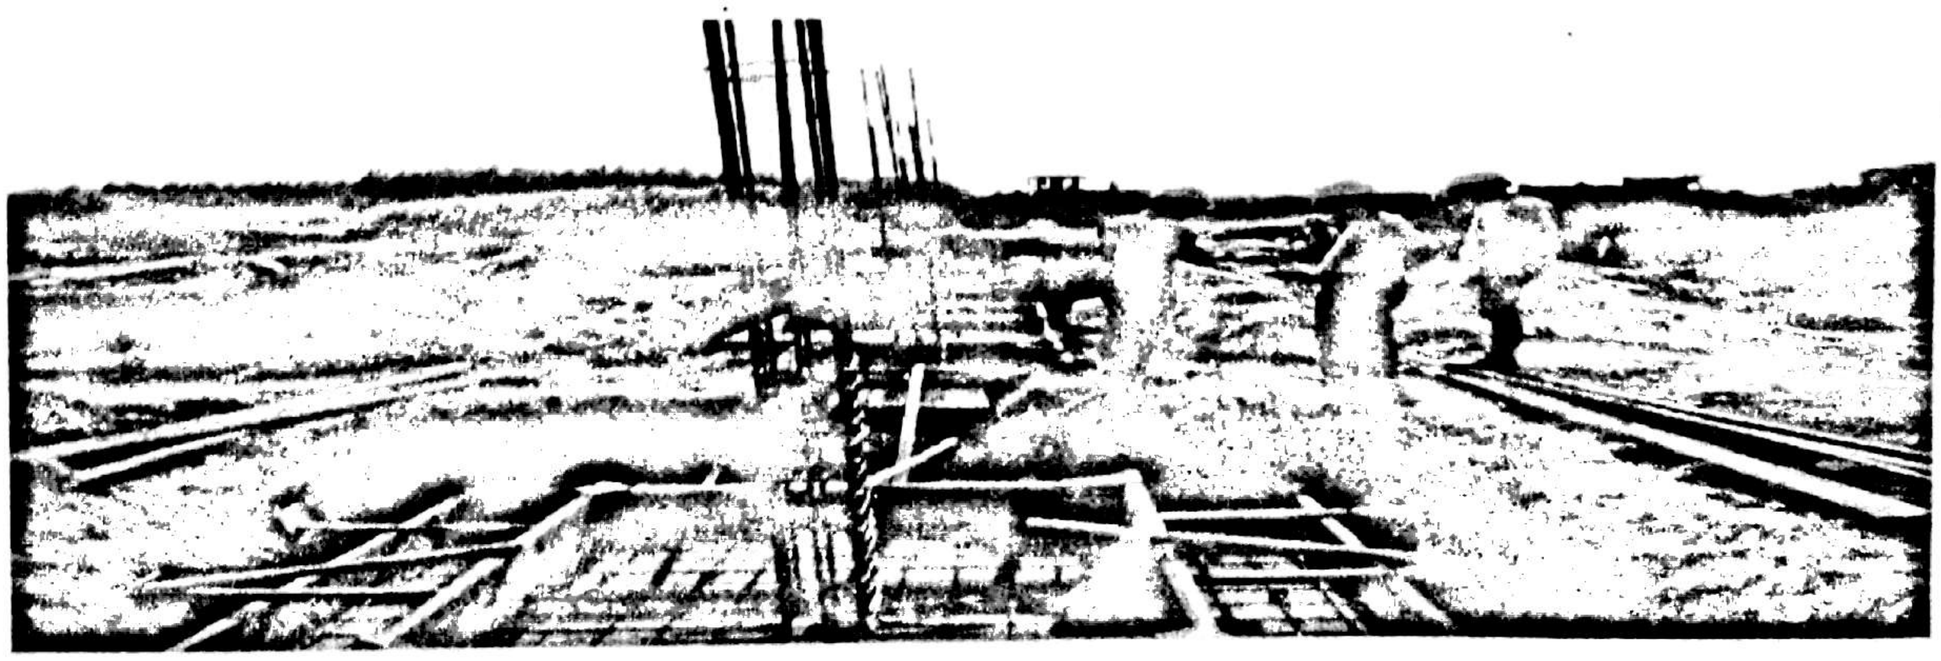

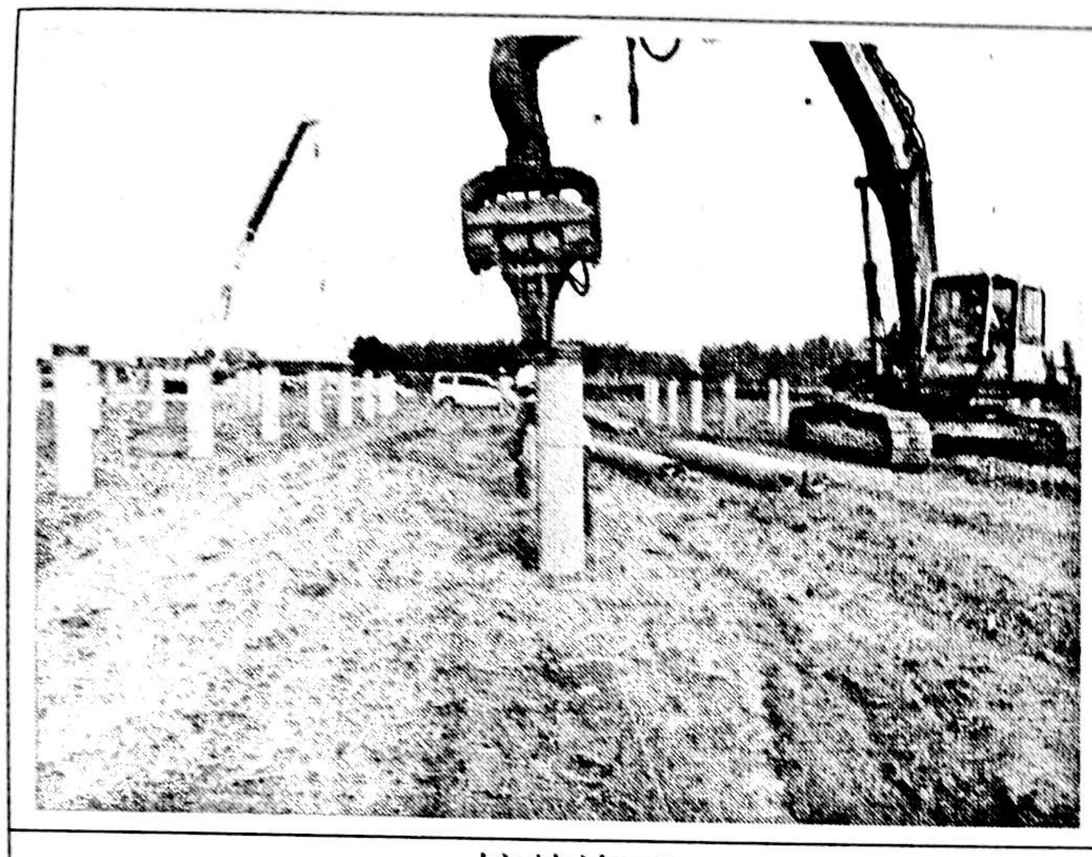

桩基施工

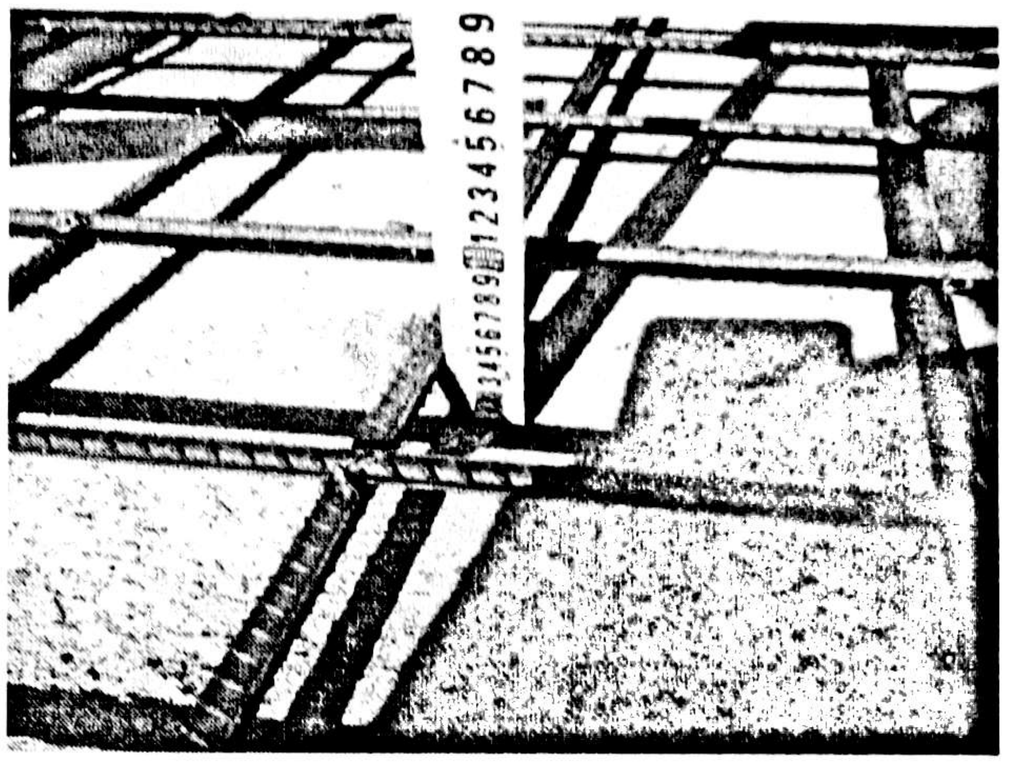

保护层测量

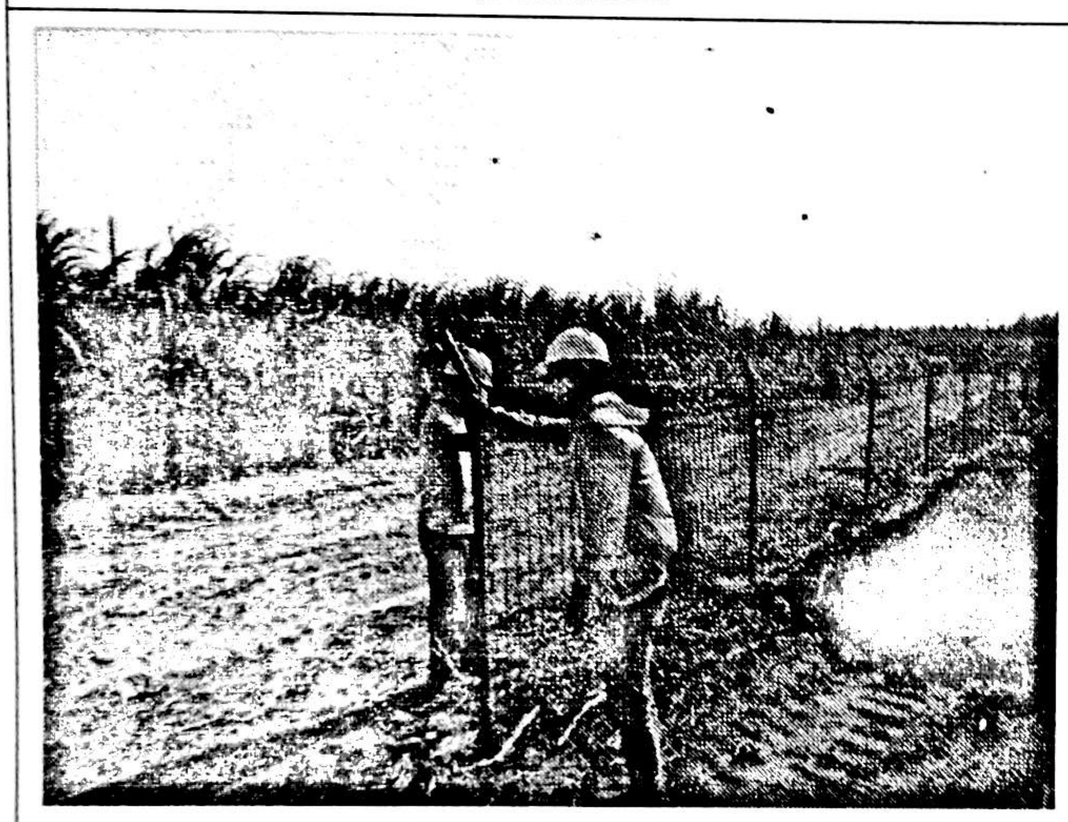

检查围栏

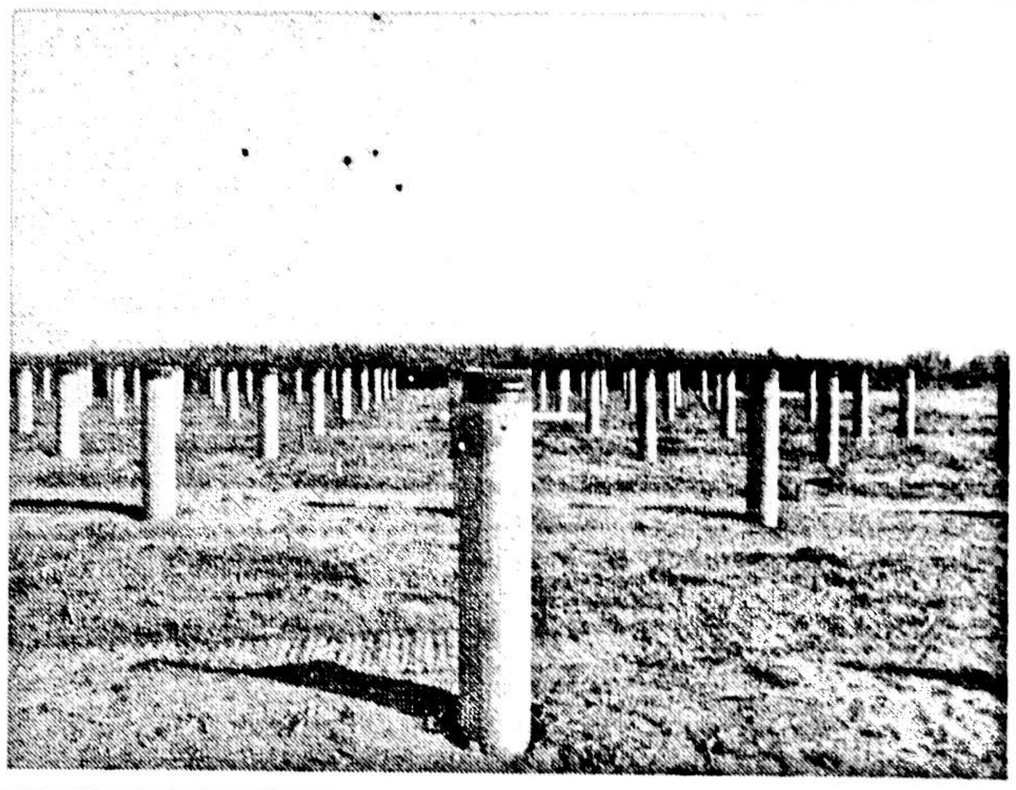

光伏区桩

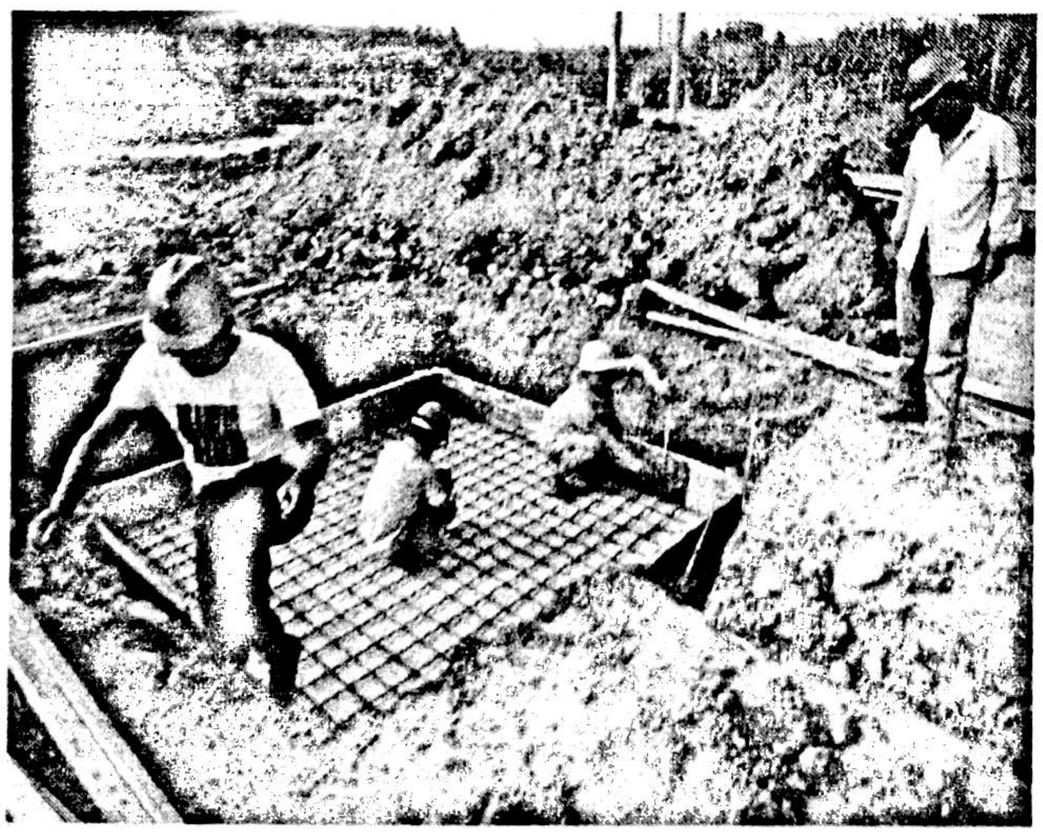

基础承台模板检查

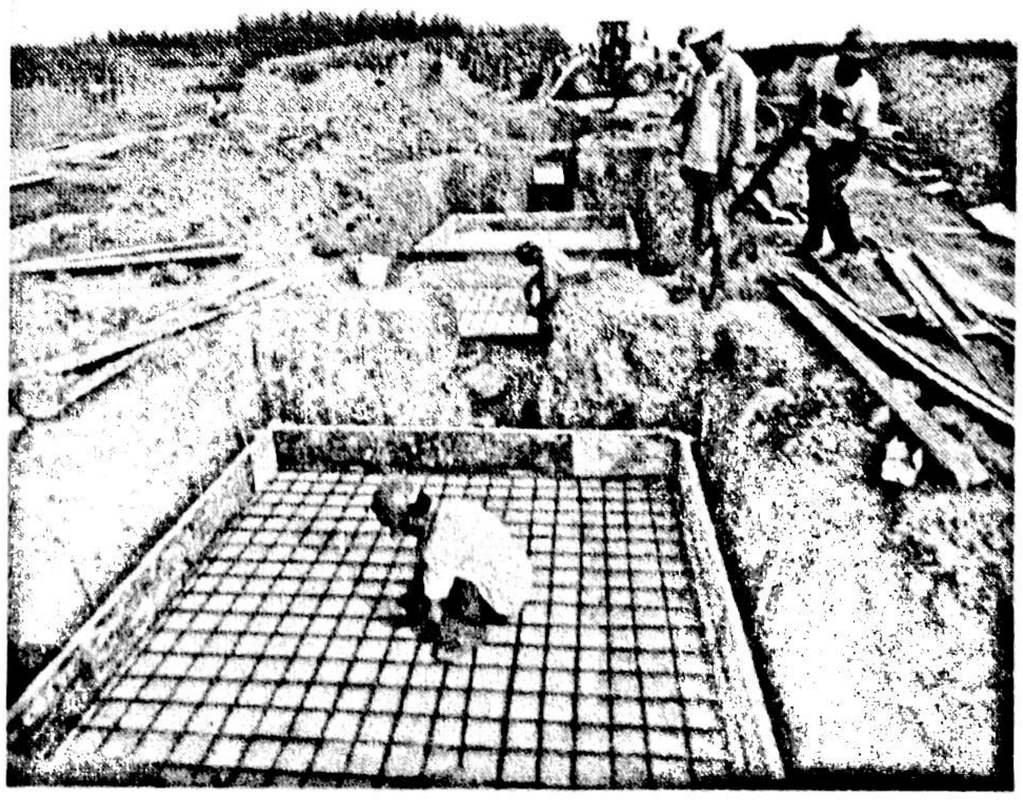

基础层台钢筋绑扎
