衡阳衡东 9.7MW 光伏扶贫项目工程建设监理周报

2018 年 01 期

<table>
<tr><td colspan="3">项目： 衡阳衡东 9.7MW 光伏项目</td><td colspan="3">填报周期：2018 年 1 月 08 日—1 月 14 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目总体建设进度汇总：
1、项目部已成立，施工项目组人员就位，施工人员到位，钻孔机进场 2 台，挖机进场 1 台
2、五牌一图已安装
3、打桩机正在试打桩基。
4、测量放线 440 点位
5、施工区域土地平整 40%
6、临电就位、进场道路基本修好，区域三块还需进行风炮锤处理。</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td>1、道路工程</td><td colspan="5">进场道路基本修好</td></tr>
<tr><td>2、开关站/升压站</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>3、综合楼/附属建筑</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>4、场内桩基施工</td><td colspan="5">测量放线 440 点</td></tr>
<tr><td>5、支架及组件安装</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>6、逆变器及箱变</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>7、送出工程（含对侧）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>8、现场调试</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9、出图情况</td><td colspan="5">GFBW-01-T0101 光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model，GFBW-01-T0201 阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）-20180112-出图(1) ，GFBW-01-J0101 光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）-20180111-Model</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td colspan="2">本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td>钢筋</td><td>1 月 14 日</td><td>1 月 14 日</td><td colspan="2">钢筋预埋件累计到货 440 套</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

11、人员/机械情况	施工人员 18 位，管理人员 5 位，挖机 1 台，钻孔机 2 台，焊接机 2 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	请协调进场道路需继续平整			
未解决的协调问题解决进展	并网接入系统方案的确定			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	进行桩基钻孔。			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				

7、其他	

填报人：严卫忠　　审核人：　　时间：2018　年　1 月 14　日

工程现场照片（含文字描述）：

测量放线

场地平整

桩基试打

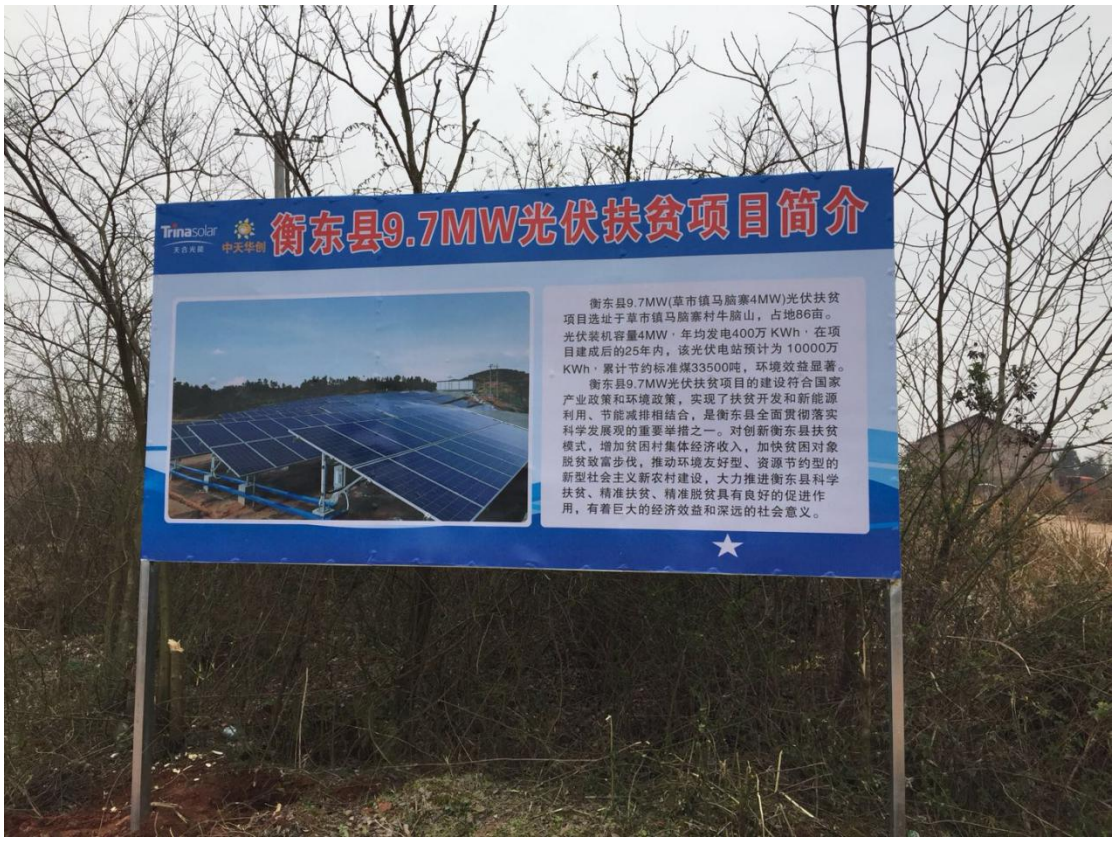
Trinasolar
天合光能
中天华创
衡东县9.7MW光伏扶贫项目简介
衡东县9.7MW(草市镇马脑寨4MW)光伏扶贫项目选址于草市镇马脑寨村牛脑山，占地86亩。光伏装机容量4MW，年均发电400万 KWh，在项目建成后的25年内，该光伏电站预计为 10000万 KWh，累计节约标准煤33500吨，环境效益显著。
衡东县9.7MW光伏扶贫项目的建设符合国家产业政策和环境政策，实现了扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合，是衡东县全面贯彻落实科学发展观的重要举措之一。对创新衡东县扶贫模式，增加贫困村集体经济收入，加快贫困对象脱贫致富步伐，推动环境友好型、资源节约型的新型社会主义新农村建设，大力推进衡东县科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫具有良好的促进作用，有着巨大的经济效益和深远的社会意义。

五牌一图
