正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年　07 期

<table>
<tr><td colspan="3">项目：南京长安发动机厂光伏发电项目</td><td colspan="2">填报周期：　2018.8.30-2018.9.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">一、项目总体建设进度汇总：
项目预验收并下发南京长安发动机厂光伏发电项目缺陷清单</td></tr>
<tr><td colspan="5">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td>1、道路工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>2、开关站/升压站</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>3、综合楼/附属建筑</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>4、场内桩基施工</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>5、支架及组件安装</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>6、逆变器及箱变</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>7、送出工程（含对侧）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>8、现场调试</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>9、出图情况</td><td colspan="4">蓝图</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td>本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11、人员/机械情况</td><td colspan="4">平均每天 3 人</td></tr>
</table>

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				本工程不涉及基础
2、首套组件安装	2018.6.28		2018.7.5	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2018.8.22		2018.8.22	
5、全容量并网	2018.8.22		2018.8.22	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他	消缺整改			

填报人：张良玉 审核人：徐耀生 时间：2018 年 9月 6日

工程现场照片（含文字描述）：

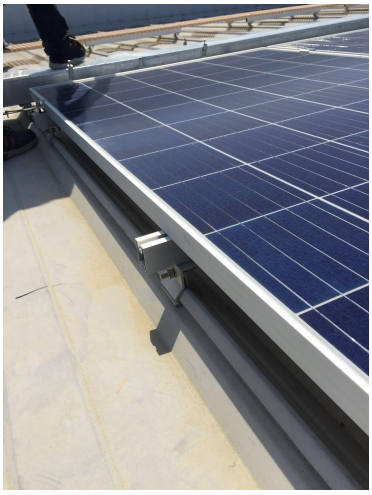

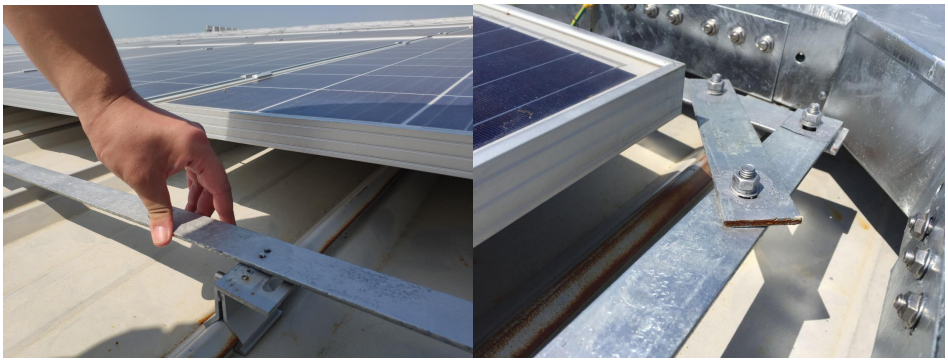

部分消缺整改项
