正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年　第 17 期

<table>
<tr><td colspan="3">项目：颀中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目</td><td colspan="3">填报周期：2019 年 7 月 6 日—7 月 12 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目总体建设进度汇总：
1、本周施工人员撤场。
2　本周全额并网发电。</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、人员进场</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、支架混凝土配重块浇筑</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、夹具、支架进场</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">4、支架安装</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、桥架安装</td><td colspan="4">1 号楼完成 100%　2 号楼 100%　3 号楼 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、逆变器安装</td><td colspan="4">安装 26 台　　共 26 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">7、焊接扁铁</td><td colspan="4">0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">8、直流电缆</td><td colspan="4">1 号楼 100%　2 号楼 100%　3 号楼 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">9、交流电缆</td><td colspan="4">1 号楼 90%　2 号楼 100%　3 号楼 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">10、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td>本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td>支架</td><td>2019.4.12</td><td>2019.4.12</td><td>到齐　100%</td></tr>
<tr><td>组件</td><td>2019.5.10</td><td>2019.6.14</td><td>到 5049 块。全部到货</td></tr>
<tr><td>逆变</td><td>2019.4.12</td><td>2019.4.12</td><td>26 台　100%</td></tr>
<tr><td>电缆</td><td>2019.4.10
2019.4.18</td><td>2019.4.10
2019.4.18</td><td>直流电缆 30600 米　100%
交流电缆 3760 米　100%</td></tr>
<tr><td>电气设备</td><td></td><td></td><td>未到货</td></tr>
</table>

11、人员/机械情况	17 人　吊车 1 台　叉车 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重块浇筑	2019.4.12		2019.4.12	
2、夹具、支架进场	2019.4.12		2019.4.12	
3、支架安装	2019.4.13		2019.4.30	
4、桥架安装	2019.5.1		2019.5.17	
5、出图情况	2019.3.23			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、并网发电	全额并网发电。			

填报人：李连明 审核人：　徐耀生　　时间：2019 年 7 月 12 日

桥架盖板扣接不严

个别接地线有松动

施工人员紧固接地线

施工人员清理垃圾

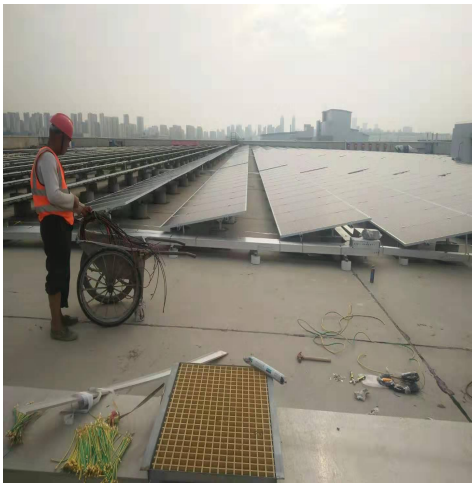

并网发电成功

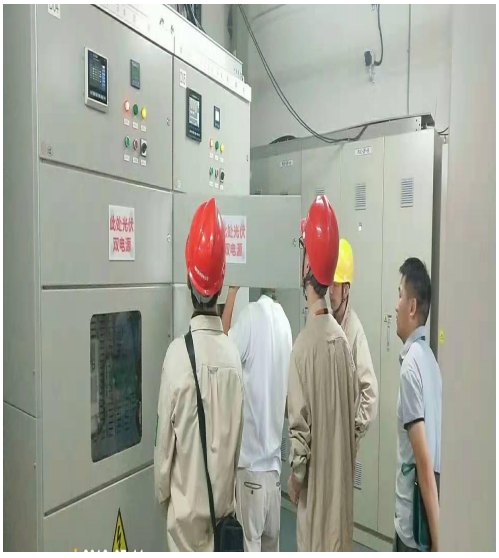

成功发电
