工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 02 月 18 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	100 天 支架基本安装完成。		
当年完成比例 当前比例	20% 5%		
本周下雨天数	2	实际可施工天数	5 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、11#、26#和 34#楼支墩和支架吊运,； 2、1#、2#、8#、11#、26#和 34#支墩就位和支架安装，13#、和 14#楼完成组件安装； 3、组件完成到货检测和部分安装检测，检测报告待提交。 4、光伏直流线缆到货 12 万米，桥架到货 3100 米及附件。		
投资情况	本周完成设备材料（直流线缆和桥架）产值约 52.44 万元，施工劳务约 8 万元。累计完成约 1260.68 万元，约占总合同价的 57.91%(按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	下周计划（2 月 19 日-2 月 25 日）： 1、预制水泥支墩继续进场； 2、屋面减震方案已在吊运支墩时继续落实； 3、继续在已有材料的屋顶进行支墩就位和支架安装； 4、开始对光伏线缆进行敷设和接地进行制作； 5、箱变和电缆井基础继续开挖； 6、施工人员进场确认并做好防疫情况登记。		

周工作小结	现场新冠疫情防控常态化管理；继续对施工人员进行安全和技术强调交底要求，支墩的预制、养护和进场；支墩就位和支架组件安装以及线缆敷设接地制作有序进行；组件到货后的检测及部分安装检测已进行。
需要协调问题	继续协调园区内其他可以施工的屋顶并落实到节后的施工计划中。

5、目前进度：

1、已有的 1#、2#、6#、7#、8#、11#、13#、14#、18#、19#、26#和 32#楼顶进行支墩就位和支架组件安装，10#、22#、33#和 34#也具备材料吊运上屋顶的条件。

2、支墩预制和养护中，要求节后第一批加紧进度进场，已进场数量 2173 套，占比 43.46%；组件已到货 12 车 11122 块，占比 100%；支架到货齐全，占比 100%；卷材到货齐全，占比 100%；配电房并网设备和材料到货两套，占比 100%；光伏直流线缆到货 120000 米，占比 100%；桥架（含附件和接地编带）到货 3100 米，占比 100%。

3、材料、设备供应商资质报审，材料第一批次取样与送检完成；光伏线缆已进场，适时进行送检。

投资情况：本周完成产值光伏线缆和桥架约 52.44 万元；施工劳务约 8 万元。累计完成约 1260.68 万元，约占总合同价的 57.91%(按合同价 2177.1487 万元计算)

下步计划：后续的施工进度计划优化，材料和设备供应商资质报审，现场强化施工技术交底及问题汇总，稳定住进场的施工人员，材料进场第二批次取样送检，组织安全文明施工。

附现场照片：

文字描述	支架分散	支架安装
图片	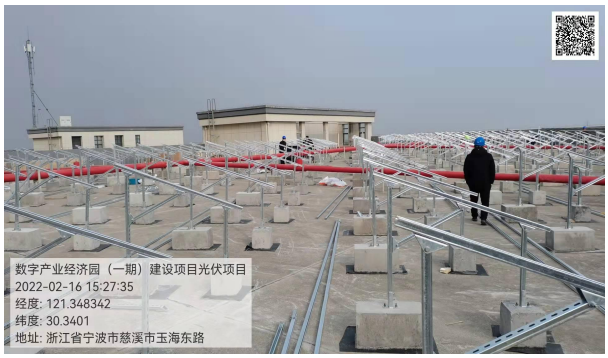	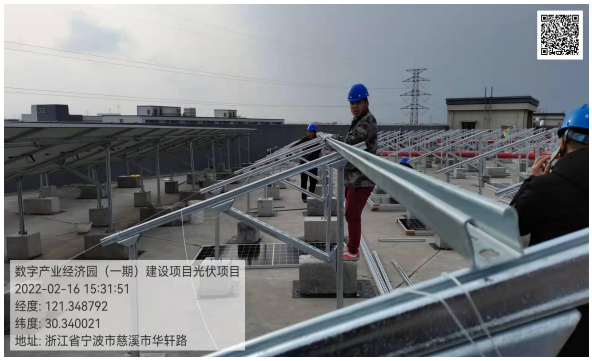
文字描述	组件安装	组件吊运至屋顶
图片		
文字描述	基础开挖	组件安装质量检查
