

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL-009

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司





主题：关于时代上汽项目停、复工相关事宜

1. 2019 年 3 月 18 日你单位进场施工，时代上汽项目监理部进入现场多次以口头督促、监理联系单及监理通知单告知你单位将开工需要报审的相关资料及时报审如（工程一切险、人身意外险、责任险、施工组织设计、各相关施工方案、前期资料、单位及相关人员资质报审），但你单位从未重视，同时对监理项目部所发出的监理通知单也为按照相关规范回复及整改，直至 2019 年 4 月 19 日时代上汽项目监理部建议业主关于此项目相关事宜执行停工整改。
2. 停工及复工都是按照相关规范及合同条款执行，复工也应按照正常程序、流程申请复工。监理项目部所下发的停工令所指出的两点整改问题，只是在此项目较为突出的。其它问题监理项目部也已联系单、通知单形式告知你方，所以你单位应该将所有监理项目部所提出的项目整改问题同时整改回复，整改完成后提交复工令申请业主及监理复工检查。
3. 关于合同工期、进度、材料到场相关事宜，你方应该严格执行 EPC 总承包合同相关条款及进度计划倒排表。但是在项目施工过程中由于你单位未及时落实业主及监理提出的相关工作、建议、整改问题导致项目进度缓慢、延期、未按业主节点要求并网发电及停工所造




成的所有费用由你单位自行承担。

4. 你方图纸至今没有到位，施工材料无法检验导致施工现场夹具和现场彩钢瓦节点不符。希望你单位重视此次停工，将所有监理项目部发出监理通知单仔细审核，全部审核整改后再报监理项目部报审开工复工令。

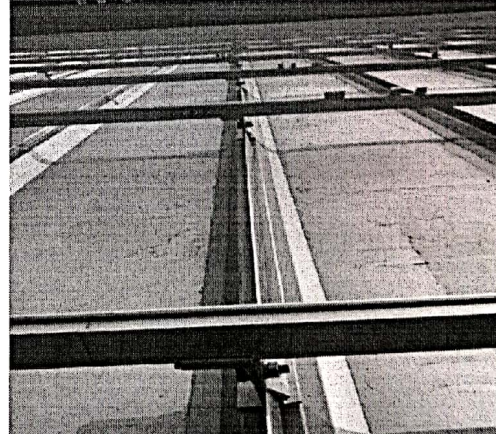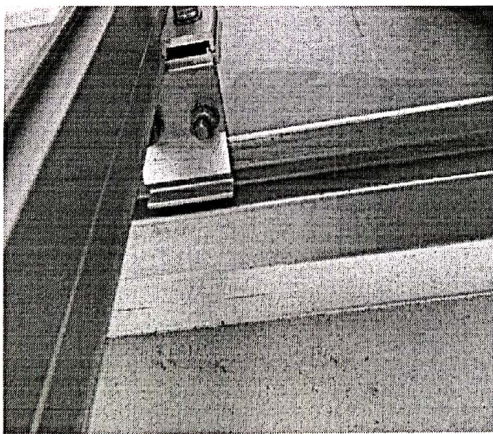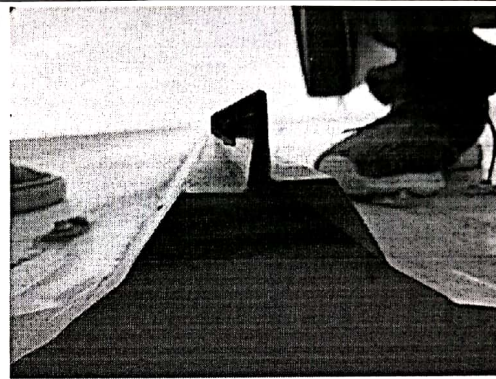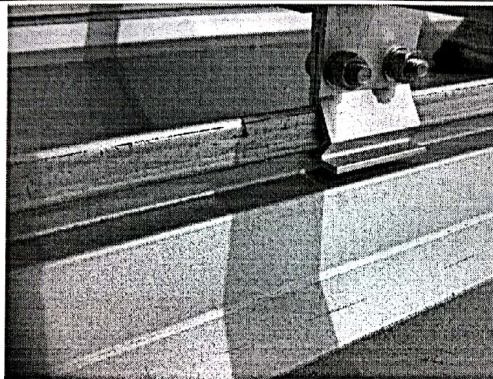

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2019 年 4 月 11 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建
