




编号: ZHJL-OST-01

监 理 月 报

工程名称: 陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目


2017 年 10 月第 1 期




项目监理部 (章):




总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2017 年 10 月 31 日

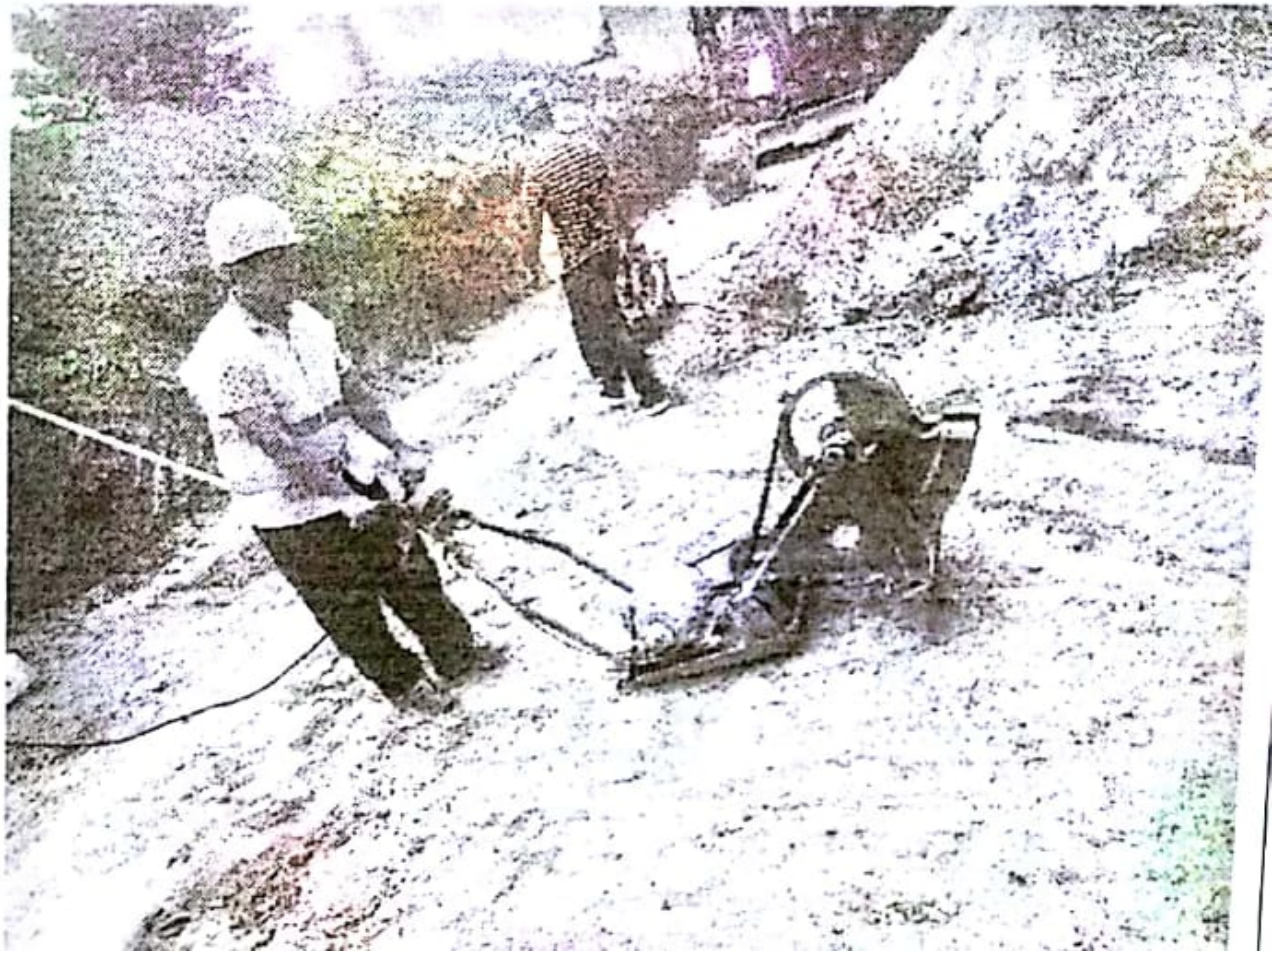

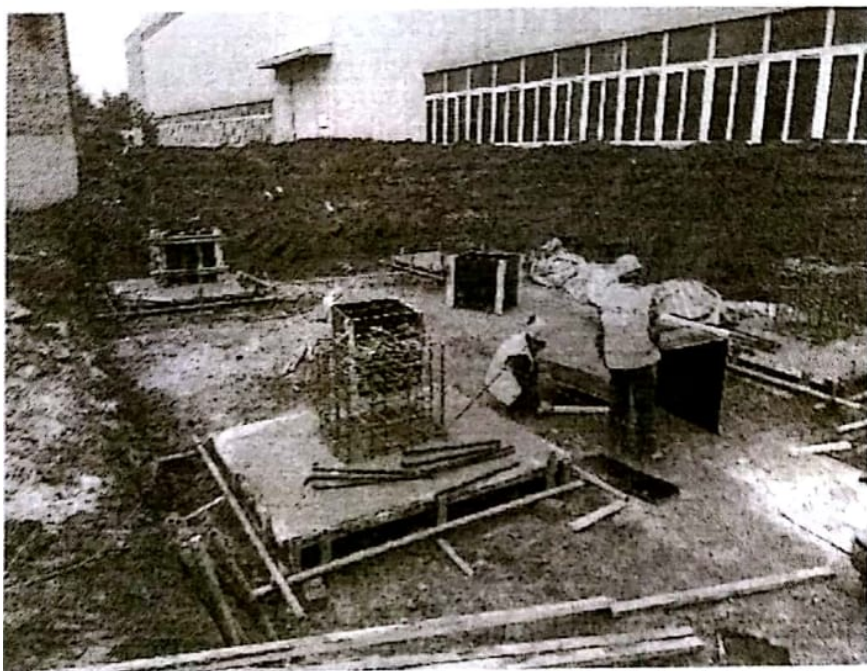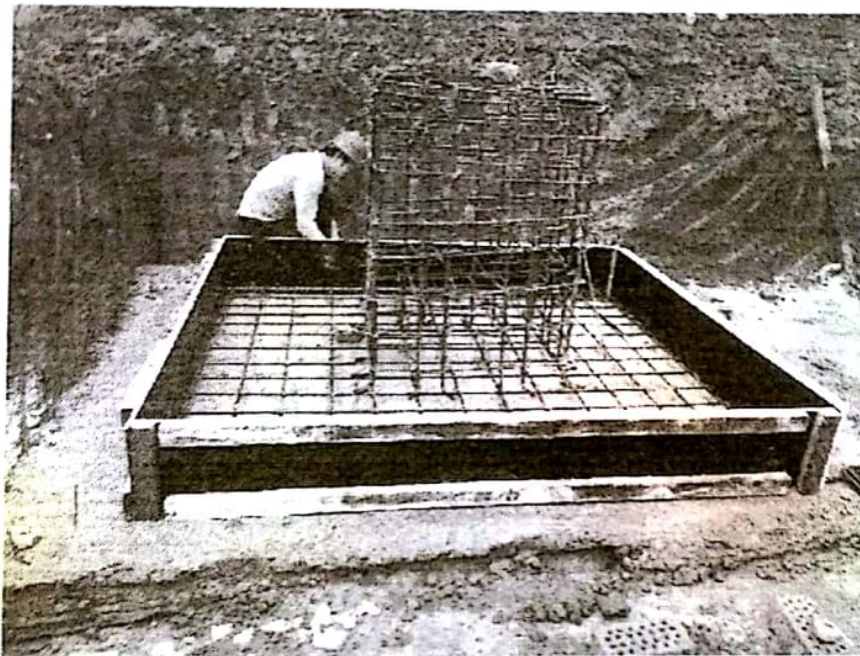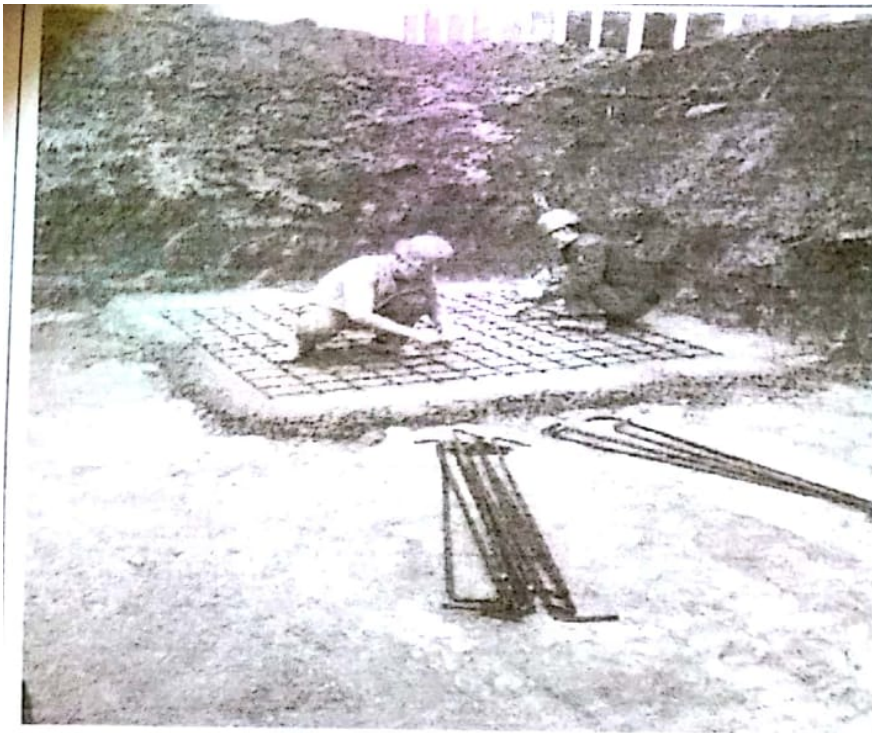



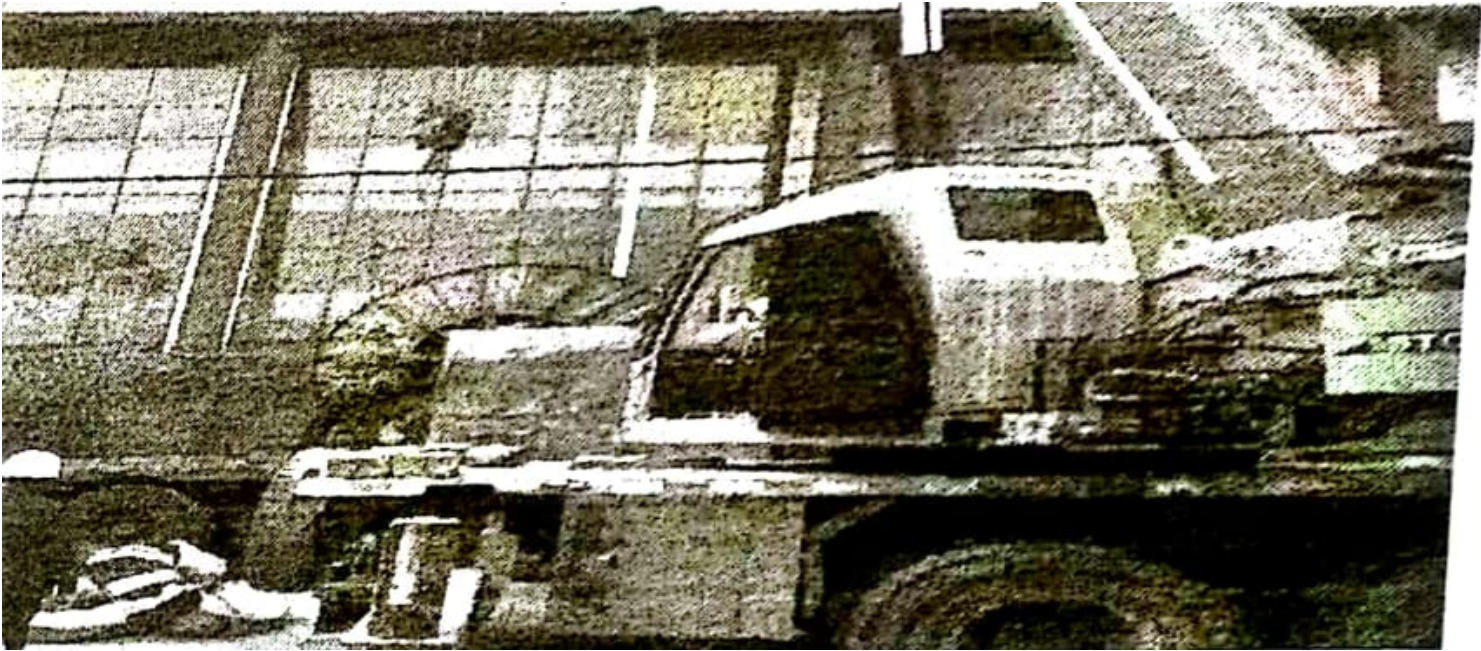

设备交付进度	高压电缆、接地扁铁入场	支架、组件、逆变器、汇流箱、供货
设计交付进度	图纸完成	图纸完成
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	完成	
设计交底	完成	
方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
技术交底	完成	
设计变更	无	
安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度

	设备质量		进行进场报验。 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	按进度申请 进度款	/
	预算外签证	无	/

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线		/	/		/	/	
2	支架安装		/	/		/	/	
3	组件安装		/	/		/	/	
4	电缆桥架		/	/		/	/	
5	直流电缆 4mm2		/	/		/	/	
6	低压电缆 3*120mm /3*150		/	/		/	/	
7	逆变器安装		/	/		/	/	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		30 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
